



# 2018 YILI FAALİYET RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

KASTAMONU  
İL ÖZEL İDARESİ  
GENEL SEKRETERLİĞİ  
2018 YILI FAALİYET RAPORU

İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi  
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 KASTAMONU

Telefon: 0 366 215 23 57-58-59

Faks: 0 366 215 23 62

Web: [www.kastamonuozelidare.gov.tr](http://www.kastamonuozelidare.gov.tr)

KASTAMONU 2018



*“Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır.”*

*(1 Kasım 1937, Meclis açılış konuşmasından)*

“Efendiler gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi, halkının çok aydın ve çok geniş ve yüksek bir zihniyet sahibi olmalarıdır.”

30 Ağustos 1925

*K. Atatürk*









# İÇİNDEKİLER

## 2018 YILI KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU

<b>İÇİNDEKİLER</b>	<b>5</b>
<b>ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU</b>	<b>7</b>
<b>İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ SUNUŞU</b>	<b>9</b>
<b>I- GENEL BİLGİLER</b>	
<b>A- Misyon ve Vizyon</b>	<b>11</b>
<b>B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar</b>	<b>11</b>
<b>C- İdareye İlişkin Bilgiler</b>	
1- Fiziksel Yapı	14
2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	17
3- Teşkilat Yapısı	18
4- İnsan Kaynakları	19
5- Sunulan Hizmetler	24
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	24
<b>D- Diğer Hususlar</b>	<b>25</b>
<b>II- AMAÇ ve HEDEFLER</b>	
<b>A- İdarenin Amaç ve Hedefleri</b>	<b>26</b>
<b>B- Temel Politikalar ve Öncelikler</b>	<b>28</b>
<b>III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b>	
<b>A- Mali Bilgiler</b>	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	29
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	33
3- Mali Denetim Sonuçları	33
<b>B- Performans Bilgileri</b>	
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	34
2- Performans Sonuçları Tablosu	92
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Proje Bazında	120
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi - Mali Bazda	122
5- Diğer Hususlar	124
<b>IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b>	
A- Üstünlükler	145
B- Zayıflıklar	
C- Değerlendirme	
<b>V- İlgaz Yurduntepe</b>	<b>146</b>
<b>VI - KÖYDES</b>	<b>148</b>
<b>EKLER - İç Kontrol Güvence Beyanları</b>	<b>150</b>







# ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Ülkemizde Avrupa Birliği uyum süreci ile birlikte kamuda yeniden yapılanma çalışmaları hız kazanmış, bu kapsamda gerek Mahalli İdareler Mevzuatında gerekse Kamu Mali Yönetimi Mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler ile stratejik plan, performans planı ve faaliyet raporu gibi unsurlar ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda yürürlüğe konulmuş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çağdaş kamu yönetim anlayışının bir gereği olarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetimin oluşturulmasını sağlamayı öngörmüştür. Böylece performans göstergeleri ve değerlendirilmesi ile ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden, raporlayan bir bütçeleme sistemi hedeflenmiştir.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurlarından biridir. Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi; 'İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.' hükmünü taşımaktadır.

Bu itibarla Kastamonu İl Özel İdaresinin 2018 yılı faaliyet raporu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ve Kamu İdarelerinde hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre, İdaremiz birimlerinin faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Şeffaflık ilkesi ve hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışıyla hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen personele teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim.

Yaşar KARADENİZ  
Vali







# İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ SUNUŞU



Günümüzde gelişmenin hızlı ve etkin olabilmesi için kamu yönetiminin daha demokratik, katılımcı, şeffaf, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkelerini esas alması önemlidir. İşte bu anlayışın sonucu olarak gerek 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda ve gerekse kamu mali yönetimi mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler ile stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu vb. unsurlar ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi; “idare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” hükmünü taşımaktadır.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verebilme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu nedenle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddeleri gereğince Kastamonu İl Özel İdaresi 2018 Yılı Faaliyet Raporu “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre bütçe sisteminde harcama yetkilisi konumunda olan birim müdürlüklerinin faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Kastamonu İl Özel İdaresi; “Adaletli, ilkeli, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren ‘Dünya Kenti Kastamonu’ olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet vermek” vizyonuna bağlı kalarak, ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için; İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için tüm İl Özel İdare personeli büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Şeffaflık ilkesi ile hesap verebilme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun başta İl Genel Meclisi üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız

Bu raporun hazırlamasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder bu çalışmanın gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederim.







# I. GENEL BİLGİLER

## A- Misyon ve Vizyon

### Misyonumuz

İlimizin İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, turizm, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

### Vizyonumuz

Adaletli, ilkeli, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayışla çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren "Dünya Kenti Kastamonu" olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet vermektir



## B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

### İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

Kanun Numarası : 5302  
Kabul Tarihi : 22/2/2005  
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745  
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

#### İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları

Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, <sup>(1)(2)(3)</sup>

<sup>(1)</sup>Bu bentte yer alan "Sağlık" ibaresinden önce gelmek üzere, 28/4/2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle "Gençlik ve spor" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

<sup>(2)</sup> 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle "erozyonun önlenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, turizm," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

<sup>(3)</sup> 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu bentte yer alan "İlin çevre düzeni planı" ibaresinden önce gelmek üzere "Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.





b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...) <sup>(1)</sup>; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşükün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. <sup>(2)</sup>

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

<sup>(1)</sup> 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanununun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan "kültür, turizm, gençlik ve spor" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.



(<sup>2</sup>) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanununun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. (Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vılayetler Hizmet Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

İl özel idaresine tanınan muafiyetler

Madde 8- İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muafır.<sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanununun 13 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan “inşa ve kullanımları” ibaresinden sonra gelmek üzere “katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.



## C- İdareye İlişkin Bilgiler

### 1- Fiziksel Yapı

#### Araç ve İş Makinası Parkı

Kod no	Makinanın Cinsi	Valilik makamı ve İlçe Özel İdareleri Hizmet Araçları	Özel İdare	Kod No	Makinanın Cinsi	Özel İdare
00	Binek tipi oto	11	13	34	Forklift	2
00	Stw tipi oto	5	1	40	Lastik Tekerli Ekskavatör	2
01	Arazi binek (jeep)	1	3	40	Paletli Ekskavatör	10
07	Pıck-up 4x4 çift şöfor.mahalli		19	42	Kanal kazıcı ön yükleyici	13
08	Otobüs		3			
08	Minibüs	2	4	50	Seyyar kompresör	3
10	Damper kamyon		60	59	Rotary sondaj kamyonu ve makinası	5
12	Sabit kasa kamyon		2	61	Kamyona monteli yapım distribütörü	6
13	Vidanjör		1	63	Kamyona monteli roley tank	3
15	Treyler çekici		6	64	Kamyona monteli asfalt robotu	3
17	Akaryakıt tankeri		3	70	Kar püskürtme rotatifi	4
19	Su tankeri		4	80	Treyler selesi	8
21	Yapım greyderi		37			
25	Dozer		15	88	Vibrasyonlu silindir	17
28	Lastik tekerli traktör		1	92	Seyyar tamir araçları	1
30	Paletli yükleyici		0	93	Seyyar kaynak makinası	2
31	Lastik tekerli yükleyici		23	94	Jeneratör	6
08	Kamyonet		14	35	Konkasör	2
10	Kar bıçaklı kamyon		17	35	Konkasör eleği	1
11	Çöp kamyonu		7			
<b>İL ÖZEL İDARESİ TOPLAM</b>						<b>321</b>
<b>VALİLİK MAKAMI ve İLÇE ÖZEL İDARELERİ HİZMET ARAÇLARI TOPLAM</b>						<b>19</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>						<b>340</b>

#### Atölye ve seyyar tamir iş emirleri

Ağır Şasi Atölyesi	190
Hafif Şasi Atölyesi	810
Seyyar tamir	550
<b>TOPLAM</b>	<b>1550</b>

#### Kiraya Verilen Makineler

Cinsi	Saat / km	Tutar (TL)
Treyler Çekici	60 km	632,40
Dozer	10 saat	1.659,70
Greyder	8 saat	1.332,00
Vidanjör(3adet)	3 saat	339,87
Excavatör(2 adet)	15 saat	2.608,05
<b>TOPLAM</b>	<b>60 km 36 saat</b>	<b>6.572,02</b>



## Alımı Yapılan Hareketli Araçlar

Cinsi	Adet Fiyatı	Miktarı	TUTAR
Asfalt Roley Tankı(İller bankası kredisi)	306.652,50	1	306.652,50
Silindir(İller bankası kredisi)	324.587,00	1	324.587,00
Ford Cargo Çekici 1842T 4x2	407.400,95	1	407.400,95
Hidrolik Kırıcı ve Aksesuarları	63.130,00	2	123.734,80
Çöp Kamyonu Hibe Programı	436,254,00	2	872.508,00
Akaryakıt Tankeri	345.710,80	1	345.710,80
Çöp Kamyonu	347.589,67	2	695.179,34
TOPLAM			2.988.183,72

## Akaryakıt ve Madeni Yağ İcmalleri

Cinsi	2017'dan devir	Alınan	Harcanan	Devir
Motorin (lt.)	119.859,77	1.596.744	1.613.756,60	103.528,00
Benzin (lt.)	13.066,02	19.692	31.660,36	1.097,66
Madeni yağ (kg.)	21.248,12	55.311,60	56.254,94	20.304,78
Gazyağı (lt.)	255,57	0	255,57	0

## Doğrudan Temin ile Alımlar

Yedek parça	Madeni Yağ	Lastik	İşçilik ve Servis Ücreti	Toplam (TL)
3.520.172,89	133.720,31	202.191,20	627.499,10	4.483.583,50



## Taşınmazlar Mevcudu

Sıra No	Taşınmaz Adı	Mülkiyeti			Taşınmazın
		İÖİ	Tahsisli	Kiralık	Değeri (TL)
1	Tarla	8	0	0	780,773,93
2	Ham Toprak Arazi	6	0	0	4.250.073,58
3	Arsa ve Okul Bahçesi	208	9	0	23.557.795,18
4	Orman	1	0	0	32.200.897,14
5	Gölet	0	5	0	1.214.476,60
6	Şadırvan –Tuvalet-Yangın Havuzu- Su Kuyusu	3	1	0	760.869,35
7	Yol	5	0	0	270.547,41
8	Sulama Kanalı	0	4	0	828.991,20
9	Mezarlık	0	6	0	207.710,81
10	Park	0	1	0	15.000,00
11	Hizmet Binası - Hizmet Bürosu	7	16	0	9.952.667,52
12	Anaokulu-Uygulama Okulu	4	0	0	7.972.248,70
13	İlköğretim Okulu	114	1	0	111.186.108,85
14	Ortaöğretim Okulu	19	0	0	34.536.401,33
15	Yüksek Okul	2	0	0	3.835.971,00
16	Verem Savaş Dispanserliği	1	0	0	316.519,58
17	Hastane Binası	1	0	0	177.884,90
18	Yurt ve Pansiyon	2	0	0	5.167.110,55
19	Han (Ecevit Hanı)	0	1	0	311.474,05
20	Kitaplık (Kütüphane)	1	0	0	672.007,29
21	Özel Müze (Özel 75.Yıl Cumhuriyet Müzesi)	1	1	0	503.912,88
22	Kent Müzesi	0	1	0	250.000,00
23	Cami ve Müştemilatı	0	1	0	2.258.913,97
24	Tavuk Çiftliği	1	0	0	1.390.340,00
25	Spor Salonu	2	0	0	1.963.227,28
26	Tenis Kortu	3	0	0	391.421,68
27	Spor Tesisi	1	0	0	1.132.915,00
28	Doğa Kültür Köyü	1	0	0	11.573.998,72
29	Otel	3	0	0	5.747.238,46
30	Yazlık Ev	5	0	0	497.916,20
31	Kamu Konutu (Lojman Binası ve Kaymakam Evi)	16	13	2	12.090.642,33
32	Diğer Konutlar (Bahçeli Ahşap Ev)	3	1	0	213.653,65
33	Sosyal Tesis (Restaurant-Yemekhane)	1	2	0	4.432.149,61
34	İş hanı	1	0	0	195.178,75
35	Depo -Ambar-Sundurma	0	12	0	22.202.573,50
36	Konak-Villa	9	0	0	4.633.234,21
37	Atölye -Şantiye -Çeşitli Vasıflardaki Binalar	3	48	0	55.780.671,55
38	Süt Toplama ve Değirmen Binası	3	2	0	100.844,23
39	İlgaz -2-Yurduntepe Kayak Tesisleri	0	5	0	14.394.704,38
	<b>TOPLAM</b>	<b>435</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>377.189.073,143</b>

## Satışı Yapılan Gayrimenkuller

Sıra No	Taşınmaz Adı	Mülkiyeti			Taşınmazın
		İÖİ	Tahsisli	Kiralık	Değeri (TL)
1	Tosya Ortalık Köyü (Arsa)	9	0	0	55.349,14
2	Ağlı (İş hanı)	1	0	0	750.000,00
3	Abana (Hacıveli Konağı)	1	0	0	600.000,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.405.349,14</b>



## Ortak Olunan Kuruluşlar

Sıra No	Kuruluş Adı	Özel İdare Pay Oranı (%)	Faaliyet Alanı	Durumu
1	KÖYAŞ A.Ş. - Turizm Gıda Pazarlama İnşaat Taahhüt ve Personel Anonim Şirketi	97,30	Turizm, Gıda, Pazarlama, İnşaat, Tahhüt, Personel Çalıştırma İşleri	Faal
2	KKV - Yakacak Pazarlama Limited Şirketi	20	İlin Kalkınması ile ilgili proje geliştirmek	Faal




## Ortak Olunan Organize Sanayi Bölgeleri

Sıra No	Kuruluş Adı	Özel İdare Pay Oranı (%)	Durumu
1	Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi	55	Faal
2	Tosya Organize Sanayi Bölgesi	60	Faal
3	Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi	45	Faal
4	Seydiler Organize Sanayi Bölgesi	40	Faal

## 2- Bilgisayar ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğü	Bilgisayar	Diz üstü	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter
Genel Sekreterlik	1	2	1		
Genel Sekreter Yardımcıları	2	2	2		
Destek Hizmetleri	46	9	37	1	
Encümen	7	2	5	1	
Yatırım İnşaat	16	4	11	2	
Strateji Geliştirme	17	4	21		
KÖYDES	4		4		
Ruhsat ve Denetim	5	1	5	2	
İmar ve Kentsel İy.	10		7	2	
İns.Kayn. ve Eğitim	16	3	17	5	
Yol ve Ulaşım Hiz.	22		15	1	
Kültür ve Sosyal İşl.	8		7		
Su ve Kanal Hiz.	40	1	6	1	2
Plan Proje	5	1	5		
<b>TOPLAM</b>	<b>199</b>	<b>29</b>	<b>143</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

### 3-Teşkilat Yapısı

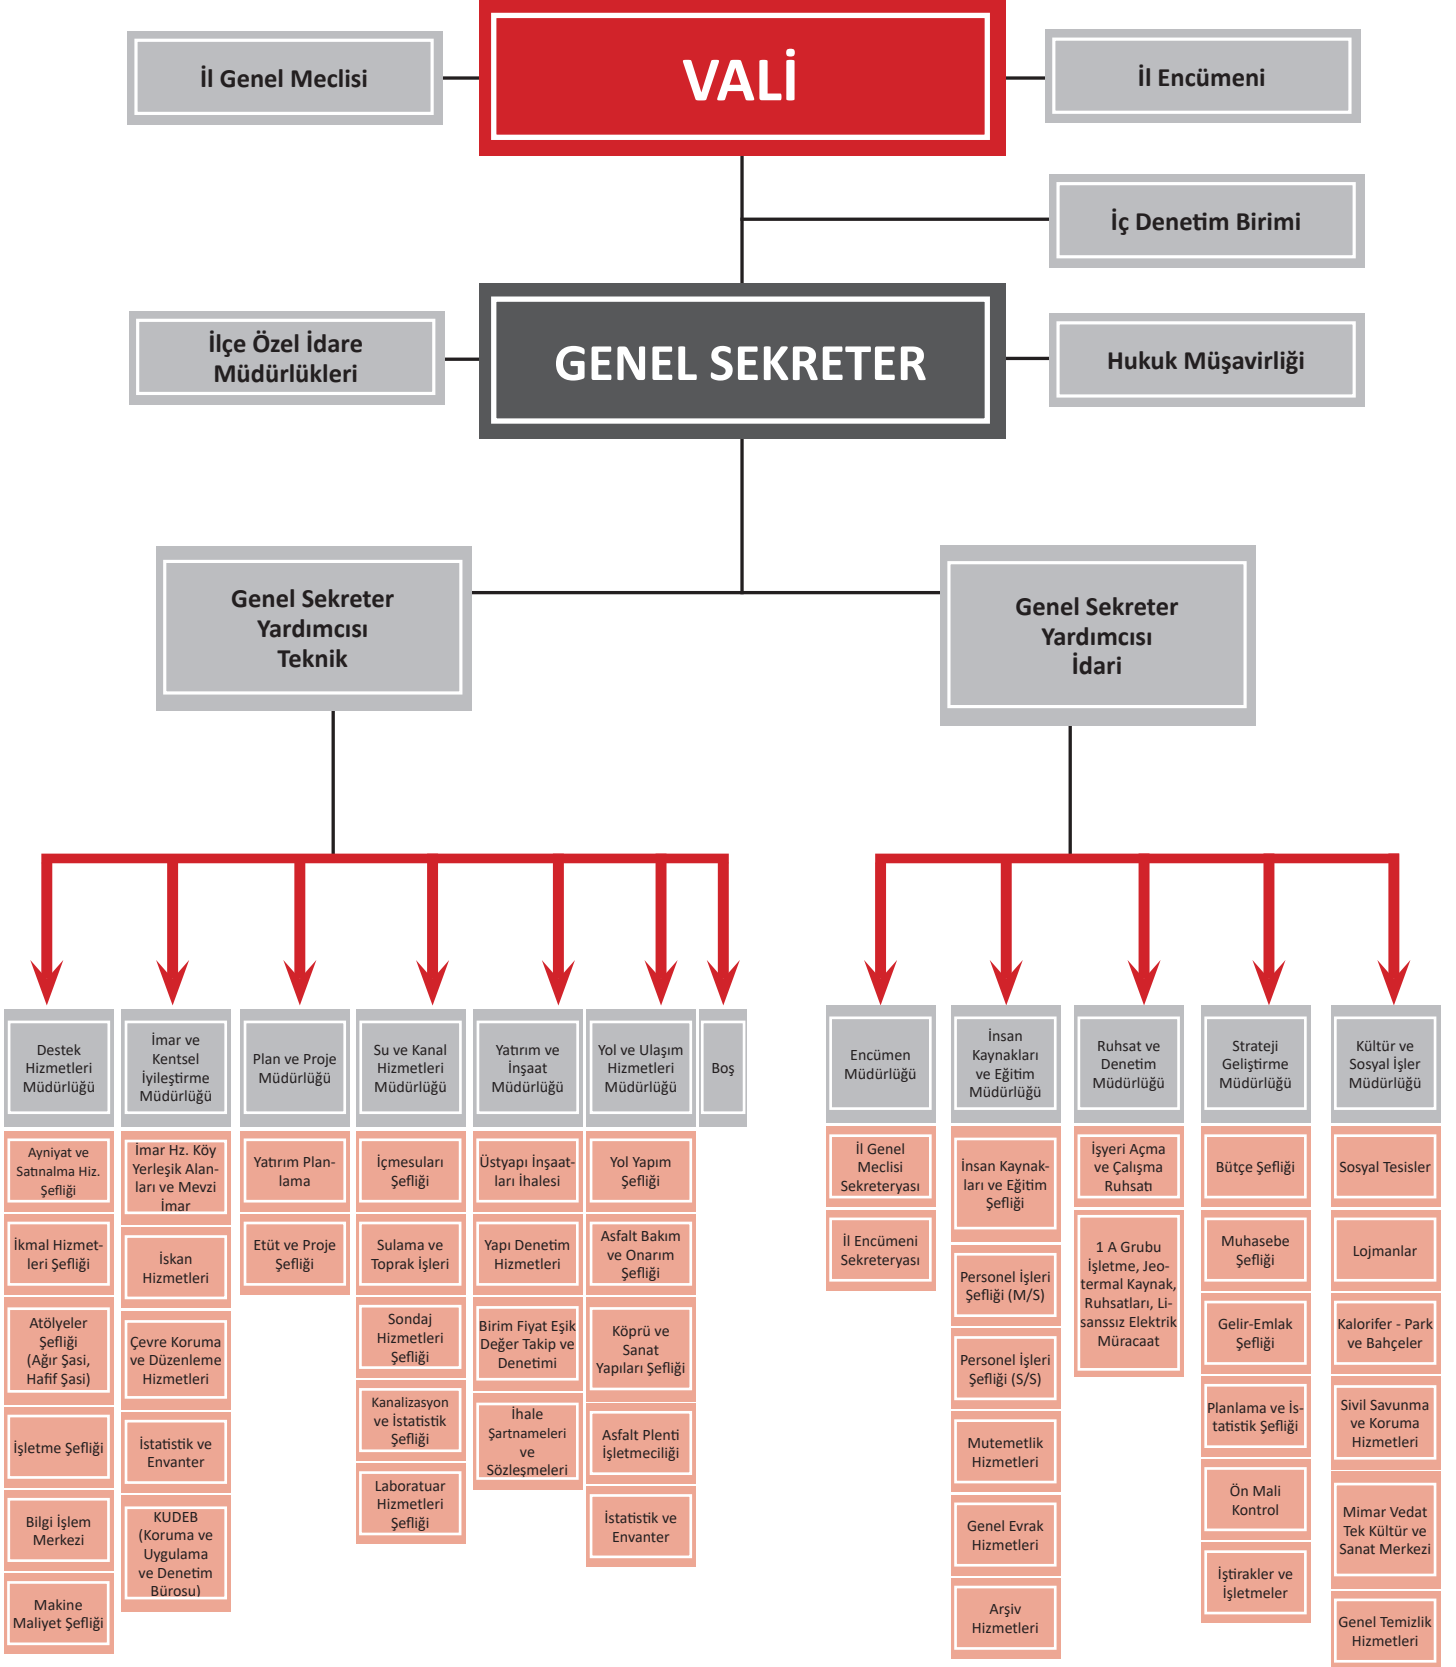



## 4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

### a) Personelin Statü ve Hizmetlere Göre Dağılımı

31.12.2018 itibari ile;

Sınıfı	Kadro Unvanı	Norm Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
GİH	Genel Sekreter	1	1	0
GİH	Genel Sekreter Yardımcısı	2	2	0
GİH	Hukuk Müşaviri	1	0	1
AH	Avukat	3	1	2
GİH	İç Denetçi	3	1	2
GİH	Birim Müdürü	12	5	7
GİH	İlçe Özel İdare Müdürü	19	11	8
GİH	Uzman	8	0	8
GİH	Şef	30	21	9
GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
GİH	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	0	1
THS	Teknik Hizmetleri Personeli	85	81	4
SHS	Sağlık Hizmetleri Personeli	4	2	2
GİH	Ayniyat Saymanı	1	0	1
GİH	Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1
GİH	Muhasebeci	4	1	3
GİH	Bilgisayar İşletmeni	3	3	0
GİH	Programcı	2	1	1
GİH	Kontrol Memuru	1	0	1
GİH	Ayniyat Memuru	2	2	0
GİH	Ambar Memuru	3	2	1
GİH	Veznedar	1	1	0
GİH	Mutemet	2	0	2
GİH	Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	27	19	8
GİH	Memur	4	2	2
GİH	Şoför	8	5	3
YHS	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	18	11	7
GİH	Norm Kadro Dışı Kalan Personel		2	
<b>Oluşturulmayan Kadro</b>				
<b>Toplam :</b>		<b>248</b>	<b>174</b>	<b>76</b>
<b>Daimi İşçi</b>		<b>116</b>	<b>271</b>	<b>0</b>
<b>Hizmet Alımı Personelleri (KÖYAŞ):</b>			<b>182</b>	
<b>Genel Toplam :</b>		<b>364</b>	<b>627</b>	<b>76</b>

## b) Personelin İstihdam Durumu

Mevcut Personel Durumu	
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi (Erkek) Personel Sayısı	133
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi (Kadın) Personel Sayısı	41
<b>Memur Toplam :</b>	<b>174</b>
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Daimi (Erkek) İşçi Personel Sayısı	255
4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Daimi (Kadın) İşçi Personel Sayısı	16
<b>Daimi İşçi Toplam :</b>	<b>271</b>
Hizmet Alımı Personeli (KÖYAŞ)(Erkek)	166
Hizmet Alımı Personeli (KÖYAŞ)(Kadın)	16
<b>Hizmet Alımı Personeli (KÖY-AŞ) Toplamı :</b>	<b>182</b>
<b>Genel Toplam :</b>	<b>627</b>

Gruplara Göre Dağılımı	
Genel İdari Hizmetler Grubu	76
Teknik Hizmetler Grubu	81
Sağlık Hizmetleri Grubu	2
Avukatlık Hizmetleri Grubu	1
Yardımcı Hizmetler Grubu	12
Norm Kadro Dışı	2
<b>Memur Personel Toplamı</b>	<b>174</b>
<b>Daimi İşçi</b>	<b>271</b>
Hizmet Alımı Personelleri (Köy – A.Ş.)	182
<b>Genel Toplam :</b>	<b>627</b>

## c) Personel İstihdam Durumu

Erkek – Kadın Olarak Dağılımı		Engelli – Hükümlü – Terör Mağduru	
Erkek Çalışan Sayısı	554	Engelli Personel Sayısı	16
Kadın Çalışan Sayısı	73	Hükümlü Personel Sayısı	7
<b>Toplam :</b>	<b>627</b>	Terör Mağduru Personel	3
		<b>Toplam :</b>	<b>26</b>

## ç) Personel Eğitim Durumları

Sınıfı	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.Lisans	Diğer	Toplam
Memur Personelleri	2	4	28	56	78	6	0	174
S/S İşçi Personelleri	127	50	80	12	1	0	1	271
Hizmet Alımı Personel (KÖYAŞ)	0	161	20	1				182
<b>TOPLAM :</b>								<b>627</b>



## d) Personel İstihdam Durumu

Personelin İstihdam Durumu	Toplam Memur	Kadro Unvanı	Toplam Memur
Genel Sekreter	1	NAKLİ YEKÜN	116
Genel Sekreter Yardımcısı	2	Endüstri Mühendisi	1
Birim Müdürü	5	Şehir Plancısı	2
Avukat	1	Sanat Tarihçisi	1
İlçe Özel İdare Müdürü	11	Kimyager	1
İç Denetçi	1	Arkeolog	1
Şef	21	Elektrik Teknikeri	5
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	19	Elektronik Teknikeri	2
Muhasebeci	1	Hazır Beton Teknikeri	2
Memur	2	İnşaat Teknikeri	9
Ambar Memuru	2	Makine Teknikeri	4
Ayniyat Memuru	2	Restorasyon Teknikeri	1
Bilgisayar İşletmeni	3	Motor Teknisyeni	3
Bilgisayar Programcısı	1	Elektrik Teknisyeni	3
Mimar	4	Elektronik Teknisyeni	1
İnşaat Mühendisi (yüksek)	2	Ağaç İşleri Teknisyeni	1
İnşaat Mühendisi	15	Biyolog	1
Makine Mühendisi (Yüksek)	1	Hemşire	1
Makine Mühendisi	6	Kaloriferci	1
Bilgisayar Mühendisi	1	Şoför	5
Çevre Mühendisi	1	Teknisyen Yardımcısı	1
Elektrik Elektronik Mühendisi	1	Bekçi	3
Harita Mühendisi	3	Hizmetli	7
Jeoloji Mühendisi	3	İl Müdür Yardımcısı (Norm Kadro Dışı)	1
Maden Mühendisi	1	Bölge Müdür Yardımcısı (Norm Kadro Dışı)	1
Peyzaj Mühendisi	1	<b>Toplam Memur :</b>	<b>174</b>
Orman Mühendisi	1	<b>Daimi İşçi :</b>	<b>271</b>
Ziraat Mühendisi	4	<b>Hizmet Alımı Personeli :</b>	<b>182</b>
<b>Toplam</b>	<b>116</b>	<b>Genel Toplam</b>	<b>627</b>

e) 2018 Yılı içinde emekli olan 21 S/S personeline 3.142.289,65 TL. İhbar ve Kıdem tazminatı ve 29.283,86 TL. Yurt İçi Sürekli görev yolluğu ödenmiştir.

f) 2018 Yılı içinde İdaremiz hizmet binaları ve kampus alanları temizlik işleri için (TYP) İş – Kur kapsamında 80 personel çalıştırılmıştır.

g) 2018 yılı içinde 3308 Sayılı Çıraklık Eğitimi Kanun uyarınca Mesleki Eğitim kapsamında 2018 yılı içinde 21 Stajyer öğrenci istihdam edilmiş olup, söz konusu öğrencilere 2018 yılı içinde Toplam 70.000,00 TL. stajyer öğrenci ücreti ödenmiştir.

### 3- Ulusal Adres Kayıt Sistemi Kapı Numarataj Çalışması

a) 2018 yılı içinde Ulusal Adres Kayıt Sistemine göre İlimiz Merkez Köylerinde 420 Adet binaya yeni kapı numarası verilmiş olup, 35 bina üzerinde de numarataj güncelleme çalışması yapılmıştır.

### 4 – Eğitim Çalışmaları

S.No	Eğitim Konusu	Eğitimi Veren	Süresi (Gün)	Katılımcı	Tarih
1	KÖYDES ve KIRDES Projesi	VİBEM	4	1	15-18 /01/2018
2	EBYS Eğitimi	İçişleri Bakanlığı	5	1	19-23/02/2018
3	Kamu İhale EKAP Eğitim Semineri	VİBEM	4	2	19-22/03/2018
4	Sertifikalı Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları	TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv. Sürekli Eğitim Merkezi (Etü Sem)	5	3	09-13/04/2018
5	LED Matris Ekran Yazılım ve Donanım Eğitimi		2	2	6-7/03/2018
6	İmar Mevzuatı Eğitim Semineri	VİBEM	4	1	24-27/04/2018
7	Vilayetler Birliği Temsilcileri Eğitim Semineri	VİBEM	4	1	24-27/04/2018
8	696 Sayılı KHK Kapsamında Kurulan Şirketler Eğitim Semineri	VİBEM	4	3	9-12/05/2018
9	Silindirle Sıkılaştırılmış Beton Yollar Brifingi ve Saha Uygulaması Teknik Gezisi	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği	1	2	18/05/2018
10	46. Olağan Genel Meclis Toplantısı	Vilayetler Birliği	1	1	29/05/2018
11	İl Genel Meclis Başkanları ve Vilayetler Birliği Eğitim Semineri	Vilayetler Birliği	4	1	23-26/10/2018
12	Beton Yollar ve Köydes Eğitim Semineri	VİBEM	4	2	19-22/11/2018
13	Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitimi	İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	5	2	24-28/11/2018

5- 2018 Yılı içinde yapılan Görevde Yükselme sınavında başarılı olan personellerimizden 1 kişi 23.09.2018 tarihinde yapılan yazılı sınav ve İdaremiz Sınav Komisyonu tarafından 11.12.2018 tarihinde yapılan sözlü sınavı kazanan bir kişi Şef kadrosuna atanması yapılmıştır.

### 6- Evrak Kayıt İşleri

a) 2018 yılı içinde İdaremiz Genel Evrak Servisine 26.381 Adet gelen evrak 20.496 Adet Giden evrak kaydı yapılmıştır.

### 7- Muhtar Bilgi Sistemi

a) Muhtar Bilgi Sistemine 2018 yılı içinde 28 adet talep gelmiş olup ilgili dilekçeler cevaplandırılmıştır.



## 8- Kastamonu İl Özel İdaresi - Birim Genel Raporu

Başvuru Yoluna Göre Gelen Başvuru	
Başvuru Yolu	Başvuru Sayısı
İnternet	431
Telefon	130
Mektup	8
Şahsen	4
<b>TOPLAM</b>	<b>573</b>

Başvuru Tipine Göre Gelen Başvuru	
Başvuru Tipi	Başvuru Sayısı
Şikayet	262
Görüş Öneri	8
İstek	250
İhbar	25
Bilgi Edinme	28
<b>TOPLAM</b>	<b>573</b>

Kurum Gelen Kutusunda Zimmetlenmeyen Başvuru Sayısı	
Başvuru Tipi	Başvuru Sayısı
Şikayet	0
Görüş Öneri	0
İstek	0
İhbar	0
Bilgi Edinme	0
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>

Yapılan Sevk Sayıları	
Başvuru Tipi	Başvuru Sayısı
Şikayet	3
Görüş Öneri	0
İstek	2
İhbar	3
Bilgi Edinme	0
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>

Onayda Bekleyen Başvurular	
Başvuru Tipi	Başvuru Sayısı
Şikayet	0
Görüş Öneri	0
İstek	0
İhbar	0
Bilgi Edinme	0
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>

Verilen Cevap (Onaylanan) Başvurular	
Başvuru Tipi	Başvuru Sayısı
Şikayet	253
Görüş Öneri	8
İstek	256
İhbar	26
Bilgi Edinme	31
<b>TOPLAM</b>	<b>574</b>

Beklemeye Alınan Evraklar	
Başvuru Tipi	Başvuru Sayısı
Şikayet	0
Görüş Öneri	0
İstek	0
İhbar	0
Bilgi Edinme	0
<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>

Yasal Süresi Geçmiş Başvurular	
Başvuru Tipi	Başvuru Sayısı
Bilgi Edinme	0
Dilekçe Hakkı	6
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>

Yasal Süresi Yaklaşan Başvurular	
Başvuru Tipi	Başvuru Sayısı
Bilgi Edinme	0
Dilekçe Hakkı	9
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>

Gelen Başvuruların Konulara Göre Dağılımı ( İlk 5 Konu)		
Üst Konu	Konu	Gelen Sevk Toplam
MAHALLİ HİZMETLER	Yol ve Yol Bakım	234
MAHALLİ HİZMETLER	Altyapı Hizmetleri (Su, Kanalizasyon vb.)	65
MAHALLİ HİZMETLER	Asfaltlama	42
ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ	Su Hizmeti Getirilmesi Talebi	33
CİMER BAŞVURU İŞLEMLERİ	Başvuru Akibet	23

Alt Birimlerde Yasal Süresi Geçmiş Başvurular	
Başvuru Tipi	Evrak Sayısı
Bilgi Edinme	1
Dilekçe Hakkı	19
<b>TOPLAM</b>	<b>20</b>

Alt Birimlerde Yasal Süresi Yaklaşmış Başvurular	
Başvuru Tipi	Evrak Sayısı
Bilgi Edinme	0
Dilekçe Hakkı	2
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>

## 5- Sunulan Hizmetler

**İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri kapsamında;** kurum faaliyetlerinin kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürülebilmesinin ve geliştirilebilmesinin sağlanması, personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması, hizmet içi eğitim seminerleri verilmesi, gelen-giden evrakların zamanında kaydının yapılarak ilgili yerlere gönderilmesi, mutemetlik hizmetlerinin (kurum personeli, il genel meclisi ve muhtarlar) sunulması ve ulusal adres kayıt işlemlerinin süratle yapılması. Muhtar bilgi sisteminin takibi ve e-içişleri projelerinin yürütülmesi.

**Strateji Geliştirme Hizmetleri kapsamında;** mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin etkinleştirilmesi, taşınmazların ekonomik ihtiyaçlara ve koşullara uygun biçimde yönetilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması.

**Destek Hizmetleri kapsamında;** kurumumuz makine parkının ve cihazlarının yenilenmesini sağlamak, makinelerin bakım - onarımlarının yapılmasını, gerekli akaryakıt ikmallerinin gerçekleştirilmesi ve hizmet alımlarının gerçekleştirmek.

**Su ve Kanal Hizmetleri kapsamında;** tüm köy ve ünitelerde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu sunmak için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, tüm köy ve ünitelerde atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması, tüm köy ve ünitelerde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan tarımsal altyapının geliştirilmesi, sondaj çalışmaları yapılarak yer altından su temin edilmesi ve laboratuvar hizmetlerinin sunulması.

**İmar ve Kentsel İyileştirme Hizmetleri kapsamında;** mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması, düzensiz yapılaşmaların önüne geçmek adına caydırıcı önlemlerin alınması ve kültür varlıklarının koruma kullanma dengesini gözeterek gelecek nesillere aktarılması-

nın sağlanması.

**Yol ve Ulaşım Hizmetleri kapsamında;** hizmet alanında yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.

**Yatırım ve İnşaat Hizmetleri kapsamında;** turizmin gelişmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması, kurum hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi ile paydaş kuruluşlara ait yapılacak yatırımların kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi.

**Plan Proje Hizmetleri kapsamında;** turizmin gelişmesi için modern ve örnek projelerin hayata geçirilmesi, kuruma ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak bina ve tesis projeleri çalışmalarının yapılması ve paydaş kuruluşlarını yapacağı yatırımların özgün ve modern yapılar olarak projelendirilmesi.

**Ruhsat ve Denetim Hizmetleri kapsamında;** maden ocaklarının ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması, mücavir alan dışında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatları düzenlenmesi ve denetimleri, lisanssız elektrik üretiminde hidrolik kaynaklara dayalı su kullanım hakkı izin belgeleri düzenlenmesi, kurum adına ÇED görüşlerinin verilmesi, 1. sınıf gayrisihhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile mücavir alan dışında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri içkili yer bölgesi tespiti ve diğer iş ve işlemlerinin yapılması.

**Kültür ve Sosyal İşler Hizmetleri kapsamında;** koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, lojmanların ekonomik kullanımı ve tahsis işlemlerinin yapılması, sosyal tesislerin uygun şartlarda işleyişinin sağlanması ve hizmet alanlarının genel çevre düzenlemesinin yapılması.

## 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim fonksiyonu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yerine getirilmektedir.

5018 sayılı Kanunun 58'inci maddesine istinaden Kurumumuzda; gelir-gider işlemleri, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemler, birim bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finans programları ile ilgili işlemler İl Genel Meclisince kabul edilen bütçe kararnamesi ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden süreç kontrolüne tabi tutulmakta olup yönetmelikte belirtilen limitler dahilinde sözleşme dosyaları "ön mali kontrol" maksadıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

"İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ" çerçevesinde **2018 yılında 107'si aktif olmak üzere 120 denetim alanı belirlenmiştir. Bu alanlardan 9 tanesi 2018 yılında denetlenmiş olup kontrol eksiklikleri belirlenerek kontroller revize edilmiştir.**



## D- Diğer Hususlar

### Kastamonu İli Genel Bilgiler

#### Coğrafi Durum

Kastamonu; 41° 21' kuzey enlemi ile 33° 46' doğu boylamları arasında 13.108,1 km<sup>2</sup>, ülke topraklarının %1,7 tekabül eden yüzölçümü alanı ile Batı Karadeniz Bölgesi'nde doğusu Sinop, batısı Bartın, kuzeyi Karadeniz, güneyi Çankırı, güneydoğusu Çorum ve güneybatısı Karabük ile sınır komşu ve deniz seviyesinden yüksekliği 775 m olup, Karadeniz'e 170 km sahili olan bir ildir.

Arazi yapısı dağlık bir görünüm arz etmekte olup, geniş ovaları olmayıp, ancak vadiler etrafında ovacıklar ve zengin bitki örtüsü göze çarpmaktadır. %74,6 ormanlık, %21,6 plato, %3,8 ovalardan oluşmaktadır. En önemli vadileri Merkez, Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak, Tosya ilçesini içine alan Devrez vadisidir. Bunları daha küçük olan Araç ve Devrekani çay yatakları izler.

Bölgedeki önemli yükseklikler kuzeyde İsfendiyar (Küre) Dağları ile güneyde Ilgaz Dağı, İsfendiyar silsilesinde en yüksek nokta 1.985 metre ile Yaralığöz, Ilgaz da ise 2.565 metre ile Büyük Hacet Tepesidir. Kıyıyı iç kesimlere bağlayan geçit 1.275 metre ile Ecevit Geçididir. Kastamonu - Ankara karayolunun geçtiği Ilgaz geçidi ise 1.875 metredir.

İldeki akarsular Gökırmak, Devrez, Devrekani ve Araç çaylarıdır.

İstanbul'a 506, Ankara'ya 240,6, Çorum'a 225, Sinop'a 192, Çankırı'ya 111, Karabük'e 110 km mesafededir.

İç kesimlerinde karasal iklim, sahil kesiminde ise mutedil ve yağışlı Karadeniz iklimi hüküm sürmekte, yıllık yağış ortalaması iç kesimlerde 400 – 500, sahil kesimlerde ise 1.000 - 1.250 kg/m<sup>2</sup> civarındadır.

#### İdari Durum

Osmanlı döneminde Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan Kastamonu Vilayeti, daha sonra 1907'de Bolu'nun, 1918'de Çankırı ve Sinop'un ayrılmaları ile bugünkü durumuna gelmiştir.

İlçe sayısı Merkez ilçe ile beraber 20'dir. İlimiz Türkiye genelinde toplam 1.055 adet köyü ile 3. sırada, toplam 3.646 adet kırsal yerleşim yeri (ünite) ile 2. sırada ve yine toplam 9.358 km köy yolu ağı ile 3. sırada yer almaktadır.

#### Nüfus Durumu

Düzenli ve sistemli nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında Kastamonu nüfusu 335.601'dir.

TÜİK tarafından 2018 yılı sonu itibariyle tespit edilen nüfus sonuçları;

	<b>Toplam</b>	<b>Kadın</b>	<b>Erkek</b>
Kastamonu İl Nüfusu	383.373	191.942	191.431
Kastamonu İl/İlçe Merkezleri Nüfusu	232.670	117.409	115.261
Kastamonu Belde ve Köy Nüfusu	150.703	74.533	76.170
Türkiye Toplam Nüfus	82.003.882	40.863.902	41.139.980

# II. AMAÇ ve HEDEFLER

## A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

**STRATEJİK AMAÇ 1:** Kurumsallaşma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurum kültürünün çalışanlar arasında yerleştirilmesi sürecinin tamamlanması, personel açığının giderilmesi, personellere ihtiyaç duydukları eğitimler verilerek bilgi ve tecrübelerine uygun yerlerde istihdam edilmelerinin sağlanması, Sosyal Denge Sözleşmesi yoluyla personelin özlük haklarının iyileştirilmesi ile sosyal kültürel ve ekonomik hakları korunarak kurumsal iç huzurun sağlanması, alanları ile ilgili beceri ve görgülerinin artırılması için seminer, fuar, panel ve benzeri etkinliklere personelin katılımının sağlanması. Uluslararası Kalite Standartları hedef alınarak, tüm çalışmaların bu yönde yapılması için personelin motive edilmesi.

- HEDEF 1.1 : Personele idare içinde veya dışında her yıl en az bir eğitim verilmesi  
 HEDEF 1.2 : Eksik personel ihtiyacını hizmet alımı (istihdam) yoluyla karşılamak.  
 HEDEF 1.3 : Kurumumuz personelinin performansını artırmak için etkinliklerin düzenlenmesi  
 HEDEF 1.4 : Personelin performansını ve motivasyonunu artırmak için ekonomik katkı sağlamak

**STRATEJİK AMAÇ 2 :** Sürdürülebilir mali politikalarımızın bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesine öncülük ve rehberlik etmek, bütçelerin reel olarak hazırlanması ve kaynakların hesap verilebilir ve saydamlık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi, üst politika belgeleri olan stratejik plan, performans planı ve bütçe arasındaki uyumun güçlendirilmesi, gelirlerde sürekli artışın sağlanması amacıyla idareimiz tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımlarından faydalanılması.

- HEDEF 2.1 : Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin etkinleştirilmesi.  
 HEDEF 2.2 : İdareimiz taşınmazlarını ekonomik ihtiyaçlara ve koşullara uygun biçimde proaktif olarak yönetilmesi.  
 HEDEF 2.3 : İdareimiz gelirlerini artırmak için alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması.

**STRATEJİK AMAÇ 3 :** Önümüzdeki 5 yıllık süreçte idareimizin araç ve makine parkının yenileştirilmesi, teknolojik açıdan yenilenmesi ile her birimde en üst düzey teknolojinin kullanılması, güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik ağının oluşturulması, asfalt plenti, araç ve iş makinelerinin bakım onarımı ile akaryakıt ikmallerinin yapılması, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan personelin pozisyonuna uygun işlerde çalıştırılmasının sağlanması, ihtiyaç duyulan pozisyonlarda hizmet alımının yapılması, kurumun ihtiyacı olan araç ve personel servislerinin kiralanması, kurumun işleyişinin desteklenmesi amacıyla kurumumuzda kullanılan sarf malzemeleri ihalelerinin zamanında ve en ekonomik şekilde yapılmasının sağlanması, ilimizin kültürel ve turizm alanında tanıtımının desteklenmesi.

- HEDEF 3.1 : İş Makinesi Ve Hizmet Aracı Alımlarının Yapılması  
 HEDEF 3.2 : Araç ve İş Makinesi Bakım, Onarım Yapılması  
 HEDEF 3.3 : Ekonomik ömrünü tamamlayan araç ve iş makinelerinin devre dışı bırakılması  
 HEDEF 3.4 : Yetersiz Olan Kalifiye Personelin Tamamlanarak Hizmetlerin Verimli Bir Şekilde Devamını Sağlamak  
 HEDEF 3.5 : Makine Parkımıza kayıtlı araç ve iş makinelerinin Akaryakıt, Lastik ve Madeni Yağ alımlarının ihtiyaca göre ekonomik olarak temin edilmesi.

**STRATEJİK AMAÇ 4 :** Kastamonu ili kırsal alanında ulusal politikalara paralel olarak dengeli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir bir kırsal kalkınma amacıyla alt yapı yatırımlarının katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesi, küresel ısınma ve bunun neden olduğu iklim değişikliğinin ülkemiz ve ilimizdeki etkisini de göz önüne alarak azalan toprak ve su kaynaklarının en ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasının sağlanması, köy ve buna bağlı ünitelerimizin sıhhi, yeterli, şebekeli içme suyuna kavuşturulması amacıyla yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tesislerin yapılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması için köy ve ünitelerimizde evsel atıkların uzaklaştırılması, bu atıklardan kaynaklı suların doğal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri inşa etmek suretiyle sulama amaçlı kullanılması sağlanması, tarımsal altyapıyı geliştirerek verimi ve üretimi artırmayı sağlayacak tarımsal tesislerimizin yapılması, var olanların bakım – onarım çalışmaları yapılarak tesislerin güçlendirilmesi.

- HEDEF 4.1 : İlimizin tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması. (2018 Yılında 10 Ad. 2019 yılında 5 Ad. İçmesuyu tesisi yapılması düşünülmektedir. )  
 HEDEF 4.2 : Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırılmasının sağlanması. (2018 Yılında 20 Ad. 2019 yılında 15 Ad. Kanalizasyon ve Atıksu yapılması düşünülmektedir. )  
 HEDEF 4.3 : Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının geliştirilmesi. (2018 Yılında 3 Ad. 2019 yılında 2 Ad. Sulama suyu tesisi yapılması düşünülmektedir. )  
 HEDEF 4.4 : Sondaj çalışması yapılarak yer altından su temin edilmesi. (2018 Yılında 8 Ad. 2019 yılında 4 Ad. Sondaj yapılması düşünülmektedir. )  
 HEDEF 4.5 : Laboratuvar hizmetlerinin sunulması.



**STRATEJİK AMAÇ 5: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.**

HEDEF 5.1 : Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.

HEDEF 5.2 : Kırsal yerleşim alanlarında düzenli yapılaşmalar oluşturulabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili meri mevzuat kapsamında idaremizce farklı tiplerde 2018 ve 2019 yılları içerisinde toplamda 15 tip proje hazırlanması hedeflenmektedir.

**STRATEJİK AMAÇ 6: Hizmet alanımız içerisinde yer alan yolağı standardının yükseltilmesi, köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.**

HEDEF 6.1 : Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.

HEDEF 6.2. : Grup köy yollarında BSK uygulamasına geçilmesi

HEDEF 6.3. : Stabilize yollarda Seyyar Konkasör makinesi ile malzeme üretmek suretiyle yol standardının yükseltilmesi.

**STRATEJİK AMAÇ 7: İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken alt yapı yatırımlarının yapılması. İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi.**

HEDEF 7.1 : İlimizin birinci önceliği olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması.

HEDEF 7.2 : İl Özel İdaresinin hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapılması, personelin daha gelişmiş ve modern alanlarda hizmet vermesinin sağlanması.

HEDEF 7.3 : Mülkiyeti kurumumuza ait Doğa Kültür ve Spor Kompleksine 1 adet futbol sahası ve 1 adet spor salonu yapılması.

**STRATEJİK AMAÇ 8 : İdaremizce yapımı gerçekleştirilecek olan tüm yatırımların gerekli plan ve projelerinin hazırlanmasının sağlanması.**

HEDEF 8.1 : İlimizde turizmin gelişmesi için modern, örnek projelerin hayata geçirilmesi.

HEDEF 8.2 : Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı Projesinin yapılması.

HEDEF 8.3 : İdaremiz hizmet binalarının geliştirilmesi ve modernize edilmesi, mülkiyeti idaremize ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak bina ve tesis projeleri çalışmalarının yapılması.

HEDEF 8.4 : Ödeneğini idaremize aktararak hizmet alan kuruluşların yapılacak bina ve tesislerinin özgün ve modern yapılar olarak projelendirilmesi.

**STRATEJİK AMAÇ 9 : 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında 1 (a) grubu Maden ocaklarının etüt edilmesi, ruhsat düzenlenmesi ve denetlenmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde belediye mücavir alan sınırı dışında kalan sıhhi, gayrisıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat düzenlemesi ve denetlenmesi.**

HEDEF 9.1 : Maden ocaklarının ruhsatlandırılması ve rutin denetimlerinin yapılması.

**STRATEJİK AMAÇ 10 : Hizmet binalarımızın ve eklentilerinin güvenliklerinin sağlanması için koruyucu güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması, lojmanların mevzuat çerçevesinde ve ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, sosyal tesislerden konaklama ya da yemek hizmeti için faydalanan personel veya misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması için gerekli tedbirlerin alınması, hizmet binalarının çevre bakımları ile küçük çaplı bakım ve onarımlarının yapılması, genel temizlik ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması, yurt içi fuar ve etkinliklere katılım sağlanarak ilimizin tanıtımına katkı sağlanması.**

HEDEF 10.1 : Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi.

HEDEF 10.2 : Sosyal tesislerden konaklama ya da yemek hizmeti için yararlanan personel veya misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması için gerekli tedbirlerin alınması, kalitenin artırılıp ekonomikliğin ön planda tutulması.

HEDEF 10.3 : Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması.

## B- Temel Politikalar ve Öncelikler

### Temel Politikalar

- Sorunlu, yarım kalmış projelerin ivedilikle bitirilmesi
- Şeffaflıktan ödün verilmemesi
- Projelerin tamamlanmasında en önemli faktör olan 3E kuralının uygulanması (ekonomik, emniyet, estetik)



### Öncelikler

- 1- İlimizin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere yapımına başlanan Ilgaz Yurduntepe Telesiyej Mekanik Tesislerinin tamamlanarak, 2019 yılı içerisinde hizmete açılmasını sağlamak.
- 2- Kırsal kesim köy yolu ağı miktarı bakımından 9358 km. ile Türkiye genelinde 3. sırada yer almaktadır. İlimizin kırsal alandaki yol standardının yükseltilmesi amacıyla 2018 yılında 121,15 km. BSK - Beton yol, 62,25 km. 1. kat asfalt, 145,50 km. 2. kat asfalt ve 86,50 km. Stabilize filler ve 1025 km. malzemeli bakım ile 848 km. asfalt yama yapılmıştır. 2019 yılında da yol standardının yükseltilmesi amacıyla BSK yol yapım çalışmalarına devam edilecek, ayrıca 2 adet seyyar konkasör ile üretilen malzeme kullanılmak suretiyle köy yollarının standartları artırılacaktır.
- 3- İlimiz köy sayısı ve bağlısı yönünden Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğundan kırsaldaki kanalizasyon hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için kriterlere uygun (en az 100 nüfus, turizm potansiyeli içermesi, çevreye olumsuz etkisi olması şartı ile) köylerde proje ve yapım işlerine öncelik verilmesi.
- 4- Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkının proje çalışmalarına başlanması.
- 5- Makine parkı yenileştirme projesi kapsamında, makine yenileme ve iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi.
- 6- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Doğa ve Spor Kompleksinde Futbol Sahasının yapımının tamamlanması ve spor salonunun ihalesinin yapılması.
- 7- Sayısal harita çalışmalarına hız verilmesi.
- 8- Restorasyonu tamamlanan Hükümet Konağının içinde bulunan Kent Müzesinin yapımına başlanması.
- 9- Paydaş kuruluşlar olan Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür Turizm, Sağlık, Tarım, Emniyet ve Sosyal Hizmetler çalışmalarının titizlikle takip edilerek en ekonomik, en verimli ve en estetik şekilde zamanında tamamlanmasının sağlanması.



# III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

## A- Mali Bilgiler

### 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

#### 2018 Yılı Mali Bilgiler

#### Gider Kesin Hesap

Tahmini Gider Bütçesi + Finansman Bütçesi	2017'dan Devir	Ek Ödenek	Ödenek Toplamı
119.371.000,00 + 7.500.000,00	107.521.676,25	173.062.854,82	399.955.531,07
126.871.000,00			

Harcama	Devir	İptal
315.411.179,72	75.611.579,02	8.932.772,33

#### Bütçe Giderleri Hesap Cetveli

Harcama Birimi	Bütçe Ödeneği Toplamı	Harcama	İptal Edilen Ödenek	Devreden Ödenek
Özel Kalem	1.005.000,00	998.258,18	6.741,82	0,00
Genel Sekreterlik	172.331.965,71	99.159.357,25	5.257.094,93	67.915.513,53
İnsan Kayn. ve Eğt.Müd.	74.287.768,93	71.792.159,75	1.115.839,81	1.379.769,37
Destek Hizm.Müd.	27.160.753,64	27.111.893,80	35.465,53	13.394,31
İmar ve Kent.İyileş.Müd.	712.048,20	361.536,08	236.047,28	114.464,84
Sosyal İşler Müd.	339.577,22	333.487,07	6.090,15	0,00
Ruhsat ve Denetim Müd.	130.000,00	117.320,19	12.679,81	0,00
Plan Proje Müd.	755.305,43	119.416,03	167.412,18	468.477,22
Strateji Geliştirme Müd.	9.269.880,84	8.738.462,14	465.360,05	66.058,65
Su ve Kanal Hizm.Müd.	8.058.947,63	8.037.915,41	21.032,22	0,00
Yatırım ve İnşaat Müd.	15.828.749,13	12.166.981,55	445.391,03	3.216.376,55
Yol ve Ulaşım Hizm.Müd.	58.498.133,97	58.245.617,20	183.426,99	69.089,78
Encümen Müd.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
İlçe Özel İdareleri	31.572.400,37	28.228.775,07	975.190,53	2.368.434,77
<b>Toplam</b>	<b>399.955.531,07</b>	<b>315.411.179,72</b>	<b>8.932.772,33</b>	<b>75.611.579,02</b>

## Gelir Kesin Hesap

Öz Gelir	Tahsisli Gelir	Toplam Gelir
94.570.745,11	173.062.854,82	267.633.599,93

## Bütçe Gelirleri Hesap Cetveli

Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen ve Ek Ödenek	Öz Gelir	Tahsisli Gelir	Toplam Gelir
İşyeri Açma İzni Harcı	40.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Diğer Harçlar	60.000,00	106.943,85	0,00	106.943,85
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	20.000,00	23.375,00	0,00	23.375,00
Diğer Mal Satış Gelirleri	21.651.000,00	2.339.690,48	0,00	2.339.690,48
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	0,00	1.720,34	0,00	1.720,34
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	5.000,00	1.050,76	0,00	1.050,76
Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	30.000,00	22.606,00	0,00	22.606,00
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	10.000,00	4.838,00	0,00	4.838,00
Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer hizmet gelirleri	100.000,00	87.163,54	0,00	87.163,54
Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Lojman Kira Gelirleri	700.000,00	468.708,37	0,00	468.708,37
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	600.000,00	389.038,62	0,00	389.038,62
Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	0,00	0,00	28.424.085,29	28.424.085,29
Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	0,00	0,00	44.084.817,05	44.084.817,05
Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan	0,00	0,00	41.246.108,55	41.246.108,55
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	21.883.513,42	21.883.513,42
Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	32.907.906,12	32.907.906,12
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	4.266.424,39	4.266.424,39
Mevduat Faizleri	10.921.000,00	4.857.341,53	0,00	4.857.341,53
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	85.858.000,00	83.020.480,26	0,00	83.020.480,26
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	4.286.000,00	1.319.251,95	0,00	1.319.251,95
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	10.000,00	3,19	0,00	3,19
Diğer Paylar	900.000,00	550.987,57	0,00	550.987,57
Diğer İdari Para Cezaları	125.000,00	510.960,22	0,00	510.960,22
"Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları"	650.000,00	158.171,76	0,00	158.171,76
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	75.000,00	132.659,08	0,00	132.659,08
"İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları"	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Kişilerden Alacaklar	100.000,00	227.851,39	0,00	227.851,39
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	500.000,00	340.303,20	0,00	340.303,20
<b>TOPLAM</b>	<b>126.871.000,00</b>	<b>94.570.745,11</b>	<b>173.062.854,82</b>	<b>267.633.599,93</b>



## Ödenen Kanuni Paylar

Kanuni Payların Ödendiği Birimler	Ödenen Limit (TL)
İlköğretim Hizmetleri İçin Ayrılan Ödenek	13.999.930,00
Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım	69.999,65
İlgaz Altyapı Turizm Birliği	280.000,00
Kalkınma Ajansları Payı	699.996,45
İller Bankası Payı	1.489.477,71
İdarenin Ortak Olduğu Şirketler, OSB'ler	1.263.184,14
Vilayetler Hizmet Birliği	699.997,00
<b>TOPLAM</b>	<b>18.502.584,95</b>

## Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Yardımlar

İlçeler	5	İlçeler	5
Merkez	107.090,00	Doğanyurt	136.703,40
Abana	86.367,80	Hanönü	111.135,60
Ağlı	73.067,80	İhsangazi	65.067,80
Araç	308.406,80	İnebolu	310.279,72
Azdavay	157.203,40	Küre	121.635,60
Bozkurt	95.135,60	Pınarbaşı	93.135,60
Cide	215.339,00	Seydiler	722.803,81
Çatalzeytin	245.135,60	Şenpazar	119.385,60
Daday	139.203,40	Taşköprü	252.406,80
Devrekani	219.532,60	Tosya	300.203,40
		<b>Toplam</b>	<b>3.879.239,33</b>

## Performans Göstergeleri

Ödenek Tahsis Edilen Birim	2018 Yılı Performans	2018 Yılı Bütçesi	Net Bütçe Ödeneği	2018 Yılı Harcama	Gerçekleşme %
Genel Sekreterlik, Özel Kalem	4.900.000,00	4.620.000,00	5.655.000,00	4.683.477,31	% 101,37
Afet ve Acil Durum Müd.	740.000,00	690.260,00	750.260,00	405.188,59	% 58,70
Emniyet Müd. Jandarma	700.000,00	300.000,00	320.000,00	319.543,98	% 106,51
Tarım ve Orman Müd.	2.045.000,00	200.000,00	245.000,00	240.108,30	% 120,05
Sağlık Müd.	900.000,00	50.000,00	217.381,00	209.271,00	% 418,54
Gençlik ve Spor Müd. – Kültür ve Turizm Müd.	3.070.000,00	250.000,00	250.000,00	97.678,72	% 39,07
Milli Eğitim Müd.	15.000.000,00	13.999.930,00	24.171.691,39	12.394.179,49	% 88,53
İnsan Kayn. ve Eğt.Müd.	4.247.676,80	17.626.290,44	22.197.629,74	21.081.789,93	% 119,60
Destek Hizmetleri Müd.	13.550.000,00	21.725.000,00	19.877.500,00	19.842.034,47	% 91,33
İmar ve Kent.İyl.Müd.	705.000,00	750.000,00	597.583,36	361.536,08	% 48,20
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	1.320.000,00	1.310.000,00	339.577,22	333.487,07	% 25,46
Strateji Geliştirme Müd.	6.529.993,00	15.224.994,00	9.019.880,84	8.554.520,79	% 56,19
Su ve Kanal Hizm.Müd.	7.850.000,00	7.790.000,00	7.927.659,56	7.906.627,34	% 101,50
Yatırım ve İnşaat Müd.	4.351.000,00	3.767.000,00	4.316.485,24	3.871.269,09	% 102,77
Yol ve Ulaşım Hizm.Müd.	27.543.770,00	25.580.000,00	30.640.954,82	30.457.527,83	% 119,07
Encümen Müd.	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	% 0,00
Plan Proje Müd.	320.000,00	210.000,00	256.852,61	89.444,03	% 42,59
Ruhsat ve Denetim Müd.	100.000,00	100.000,00	130.000,00	117.320,19	% 117,32
İlçe Özel İdareleri	0,00	5.152.525,56	6.053.439,14	4.887.861,75	% 94,86
<b>TOPLAM</b>	<b>93.172.439,80</b>	<b>119.371.000,00</b>	<b>132.971.894,92</b>	<b>115.852.865,96</b>	<b>% 97,05</b>
<b>Finansman Bütçesi</b>		<b>7.500.000,00</b>			
<b>Gider Bütçesi + Finansman Bütçesi</b>		<b>126.870.000,00</b>	<b>132.971.894,92</b>	<b>115.852.865,96</b>	<b>%91,32</b>

## Bütçe ve Gider Performans Tablosu

### Gelir Performans

Yılı Gelir Bütçesi	Öz Gelir	Gerçekleşme%
<b>126.871.000,00</b>	<b>94.570.745,11</b>	<b>74,54</b>

### Gider Performans

Yılı Gider Bütçesi + Finansman Bütçesi	Toplam	Harcama 05	Gerçekleşme %
<b>119.371.000,00 + 7.500.000,00</b>	<b>126.871.000,00</b>	<b>115.852.865,96</b>	<b>91,32</b>

2018 Yılında 126.871.000,00 TL'lik gelir bütçemizde 94.570.745,11 TL tahsilat ile % 74,54 oranında gerçekleşme sağlanmış,Giderde ise 119.371.000,00 TL gider bütçemiz ile 7.500.000,00 TL'lik finansman bütçesi olmak üzere toplam 126.871.000,00 TL üzerinden 115.852.865,96 TL harcama ile %91,32 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

## 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2018 Mali yılı bütçesi İl Genel Meclisinin 23.11.2017 tarih ve 379 sayılı kararı ile 126.871.000,00 TL gelir, buna karşılık 119.371.000,00 TL gider ile finansman bütçesi olarak da 7.500.000,00 TL öngörülerek kabul edilmiştir.

2018 Mali yılında gelir bütçemiz 126.871.000,00 TL olarak tahmin edilmiş buna karşılık 94.570.745,11 TL tahsilat ile %74,54 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Gider bütçemiz 119.371.000,00 TL, finansman bütçemiz ise 7.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, toplamda 126.871.000,00 TL üzerinden 115.852.865,96 TL harcama ile % 91,32 TL oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2018 Mali yılı toplam geliri 267.633.599,93 TL olup, bu miktarın 94.570.745,11 TL'si öz gelir, 173.062.854,82 TL'si ise Genel ve Katma Bütçeli İdarelerden alınan ödenekler olarak tahsil edilmiştir.

### İlbank'tan Kullanılan Kredi Bilgileri

1- Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, muhtelif köy yollarının asfalt sathi kaplama yapılması için 2013 yılında 10.000.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 2018 yılı içinde borç kapanmıştır. **(2018 yılında ödenen toplam borç miktarı 1.890.664,06 TL'dir.)**

2- Kastamonu grup katı atık bertaraf tesisi ve aktarma istasyonları yapım için 2013 yılında 676.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 422.549,45 TL borç kalmıştır. **(2018 yılında ödenen toplam borç miktarı 99.305,53 TL'dir.)**

3- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Daday ve Pınarbaşı ilçeleri muhtelif köy yolları yapım için 2014 yılında 2.500.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 1.020.207,20 TL borç kalmıştır. **(2018 yılında ödenen toplam borç miktarı 480.075,60 TL'dir.)**

4- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 41 adet muhtelif iş makinesi ve araç alımı için 2015 yılında 12.500.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 3.173.043,49 TL borç kalmıştır. **(2018 yılında ödenen toplam borç miktarı 4.005.064,05 TL'dir.)**

5- Destek Hizmetleri Müdürlüğü, muhtelif iş makinesi ve araç alımı için 2017 yılında 9.000.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 7.149.200,05 TL borç kalmıştır. **(2018 yılında ödenen toplam borç miktarı 2.381.369,69 TL'dir.)**

6- Yol ve Ulaşım Müdürlüğü; asfalt, bitüm ve muhtelif yol yapım malzemeleri alımı için 2017 yılında 3.000.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 2.242.605,54 TL borç kalmıştır. **(2018 yılında ödenen toplam borç miktarı 922.012,50 TL'dir.)**

7- Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, bitüm alımı için 2018 yılında 7.500.000,00 TL kredi kullanılmış olup, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 7.157.762,34 TL borç kalmıştır. **(2018 yılında ödenen toplam borç miktarı 597.054,82 TL'dir.)**

8- Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, bitüm alımı için 2018 yılında 3.500.000,00 TL kredi alınmış olup, ödemesi 01.01.2019 tarihinde başlayacaktır.

**2018 yılında toplam 10.375.546,25 TL kredi geri ödemesi yapılmış olup, 31.12.2018 tarihi itibarıyla toplam borç 21.165.368,07 TL'dir.**

## 3- Mali Denetim Sonuçları

2018 yılı hesaplarımız Sayıştay denetçilerince 2018 yılı Eylül ayı ve 2019 yılı Ocak ayı içinde denetlenmiş olup, henüz rapor gelmemiştir. Raporun idaremize intikali halinde İl Genel Meclisi Bilgisine sunulacaktır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 17. Maddesi gereği İl Genel Meclisince oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından da 2018 yılı İl ve İlçe belgeleri incelenmektedir.



## B- PERFORMANS BİLGİLERİ

### 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

### DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	İşin Adı	F.Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme	İşin Durumu
1.	Akaryakıt Ürünleri ( Motorin ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ) Satın Alınması İşİ	5	19. Madde	Mal	4.704.660,00 TL	0,00	5.053.063,61	100%	Bitti
2.	Muhtelif Cinsten ve Miktarlarda Madeni Yağlar İle Antifriz Alımı	5	19. Madde	Mal	206.739,96 TL	0,00	206.739,96	100%	Bitti
3.	Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapıtırılması ( Poliçelerin yenilenmesi )	5	19. Madde	Hizmet	367.416,60 TL	0,00	191.070,00	52%	Devam Ediyor
4.	Personel Taşıma Servis Aracı Kiralanması İşİ	5	19. Madde	Hizmet	631.388,50 TL	0,00	586.831,70	100%	Bitti
5.	Kar Bıçaklı Kamyon Kiralanması İşİ	5	21/F Madde	Hizmet	221.840,00 TL	0,00	221.840,00	100%	Bitti
6.	Mobil Konkasör Kiralanması İşİ	5	19. Madde	Hizmet	559.320,00 TL	0,00	536.015,00	100%	Bitti
7.	Sabit Konkasör Kiralanması İşİ	5	21/F Madde	Hizmet	236.000,00 TL	0,00	236.000,00	100%	Bitti
8.	Muhtelif Cins ve Ebatlarda Dış Lastik Alımı	5	19. Madde	Mal	256.945,00 TL	0,00	256.945,00	100%	Bitti
9.	Muhtelif Cins ve Miktarlarda Yedek Parça Alımı	5	21/F Madde	Mal	195.319,50 TL	0,00	195.319,50	100%	Bitti
10.	800 Litre Kapasiteli Galvanizli Metal Çöp Konteyneri Alımı	5	19. Madde	Mal	235.764,00 TL	0,00	235.764,00	100%	Bitti
11.	6 Kg Kkt Yangın Söndürme Tüpü Cihazı Mal Alım İşİ	5	19. Madde	Mal	87.320,00 TL	0,00	87.320,00	100%	Bitti
12.	Akaryakıt ( Motorin ) Alımı		19. Madde	Mal	3.200.160,00 TL	0,00	3.489.929,11	100%	Bitti
13.	Hizmet Araçları Kiralanması İşİ	8	19. Madde	Hizmet	170.982,00 TL	0,00	72.952,32	100%	Bitti
14.	Muhtelif Cins ve Ebatlarda Dış Lastik Alımı	8	19. Madde	Mal	225.021,28 TL	0,00	225.021,28	100%	Bitti
15.	Mobil Konkasör Kiralanması İşİ	5	21/F Madde	Mal	238.950,00	0,00	53.100,00	100%	Bitti
16.	6 Adet Dampirli Treyler Kiralanması İşİ	5	21/F Madde	Mal	295.000,00	0,00	93.456,00	100%	Bitti
TOPLAM					11.832.826,84 TL		11.741.367,48		

**Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kapsamında Toplamda 16 proje olup, 15 proje bitmiş, 1 Proje devam etmekte olup, Bu işler için; TOPLAM 11.741.367,48 TL harcama yapılmıştır.**











## İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No.	İşin Adı	Finans Kodu	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Hariç)	Geçmiş Yıllar Harcaması	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu	Açıklamalar
1	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Alantarla Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşİ	5	19. Madde	Hizmet Alımı	39.884,00	0,00	0,00	%80	Devam ediyor	Plan inceleme aşamasında
2	Kastamonu İli Araç İlçesi İğdir Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşİ	5	19. Madde	Hizmet Alımı	64.900,00	0,00	0,00	%80	Devam ediyor	Hazırlanan İmar Planları İdareimize sunuldu. İnceleme sonrası firmadan planda revize yapılması istendi.
3	Kastamonu İli Merkez İlçesi Gölköy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşİ	5			0,00	0,00	22.396,40	%20	Devam ediyor	İdareimizden ve Tarım İl Müdürlüğünden görevlendirilecek ikişer adet teknik personeller tarafından Toprak Koruma Kurulu'na sunulmak üzere İmar Planı Sınırları hakkında rapor hazırlanacak.
4	Kastamonu Merkez ve İlçelerine Bağlı Olan 274 Adet Köyün İmar Mevzuatına Uygun Olarak Köy Yerleşik Alan Tespitlerinin Yapıtılması İşİ	5	19. Madde	Hizmet Alımı	141.290,84	0,00	138.712,54	100,00	Bitti	
5	Kastamonu İli Kırsal Yerleşim Alanlarında Kullanılmak Üzere Tip Projeler Hazırlanması İşİ	5	19. Madde	Hizmet Alımı	52.828,60	0,00	56.368,60	100,00	Bitti	
6	Kastamonu İli Kırsal Yerleşim Alanlarında Köy Yerleşim Planı Yapıtılması İşİ	5	19. Madde	Hizmet Alımı	0,00	0,00	5.817,40	4,85	Devam ediyor	Planların incelemesi tamamlandı. Onay süreci devam ediyor.
							223.294,94			

**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kapsamında Toplamda 6 proje olup, 2 proje bitmiş, 4 proje devam etmekte olup, Bu işler için; TOPLAM 223.294,94 TL harcama yapılmıştır.**

## PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	KASTAMONU KÜZEYKENT POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	8	19. Madde	Yapım	3.033.780,00	1.114.371,17	366.129,44	50,00	Devam Ediyor
2	KASTAMONU BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	8	19. Madde	Yapım	2.967.653,45	1.173.765,69	1.793.887,76	100,00	Bitti
3	DOĞA KÜLTÜR KÖYÜ FUTBOL SAHASI, TRIBÜN VE SOYUNMA ODASI BİNASI YAPIM İŞİ	5-8	19. Madde	Yapım	2.510.320,55	0,00	1.163.836,80	60,00	Devam Ediyor
4	KASTAMONU 100 KİŞİ KAPASİTELİ HUZUREVİ BİNASI PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ	8	19. Madde	Yapım	1.16.820,00	0,00	0,00	100,00	Bitti
5	KASTAMONU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YAPIMI	8	19. Madde	Yapım	8.067.660,00	0,00	7.108.012,44	90,00	Devam Ediyor
6	"KASTAMONU İLİ ILGAZ YURDUNTEPE KAYAK TESİSLERİ GÜNÜBİRLİK TESİS VE KAFETERYA İKİMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ"	5-8	21/B Maddesi	Yapım	6.815.843,78	0,00	0,00	5,00	Devam Ediyor
7	KASTAMONU 100 KİŞİ KAPASİTELİ HUZUREVİ BİNASI YAPIM İŞİ	8	19. Madde	Yapım	0,00	0,00	0,00	0,00	İhale Aşamasında
<b>TOPLAM</b>					<b>23.512.077,78</b>	<b>2.288.136,86</b>	<b>10.431.866,44</b>		

**Plan ve Proje Müdürlüğü kapsamında toplamda 7 Adet proje olup; 2 adet proje bitirilmiş, 4 adet devam etmekte, 1 iş ihale aşamasında olup; Bu işler için; TOPLAM 10.431.866,44 TL harcama yapılmıştır.**



## Dođa Kltr Ky Futbol Sahası, Tribn ve Soyunma Odası Binası Yapımı



## İlgaz Yurduntepe Gnbirlik Tesis ve Kafeterya



# SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## a) İçmesuları Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	Alım Yöntemi	Sözleşme Bedeli	Sözleşme Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	Yılı Harcaması	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Kastamonu İli Merkez İlgaç Grb. İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	5	19 Madde	907.624,46	29.01.2018	0,00	907.072,83	100	Bitti
2	Kastamonu İli Araç İlçesi Çal Köyü Merkez Ve Alibeyli Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	5	19 Madde	204.489,48	30.01.2018	0,00	204.146,79	100	Bitti
3	Kastamonu İli Merkez İlçesi muhtelif Köylerinde İçme Suyu Şebeke Hatlarında Kullanılmak Üzere Yangın Vanası Takılması İşi Montaj Dahil (28 Köy-59 Ünite)	5	19 Madde	255.433,14	5.06.2018	0,00	255.418,08	100	Bitti
4	Kastamonu İli Abana İlçesi Altkulaç Köyü Merkez-Kerim-Kışlacık ve Konuşlu (Orza)Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	429.099,21	27.06.2018	0,00	403.827,35	100	Bitti
5	Kastamonu İli Araç İlçesi Aş.Oba-Haliloba ve Yk. Oba Köyü- Merkez, Duraklar-Doruk Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	191.681,10	21.06.2018	0,00	191.471,74	100	Bitti
6	Kastamonu İli Araç İlçesi Doğanpınar Köyü Merkez Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	51.472,90	21.06.2018	0,00	51.416,68	100	Bitti
7	Kastamonu İli İhsangazi İlçesi Hocahacip Köyü Merkez-Aşağı-Aş. Sökü-Himmatbey-Kırkoğlu ve Müezzinzin Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	52.270,86	21.06.2018	0,00	52.213,77	100	Bitti
8	Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Yavlatepe Köyü Merkez Kuz ve Gülbül Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	334.928,06	8.08.2018	0,00	332.931,39	100	Bitti
9	Kastamonu İli Çatalzeytin İlçesi Yunuslar Köyü Merkez Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	193.426,30	8.08.2018	0,00	192.273,19	100	Bitti
10	Kastamonu İli Cide İlçesi Doğanpınar Köyü Okluca Mahalle	5	19 Madde	79.588,30	29.10.2018	0,00	74.552,19	100	Bitti
11	Kastamonu İli Cide İlçesi Çamdibi Köyü Merkez Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	55.751,76	29.10.2018	0,00	52.223,96	100	Bitti
12	Kastamonu İli Cide İlçesi Öveçler Köyü Merkez-Çerçi ve Taşoluk ( Ipsala ) Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	88.168,70	29.10.2018	0,00	82.589,65	100	Bitti
13	Kastamonu İli Pınarbaşı İlçesi Yamanlar Köyü -Mercan, Fasye , Kahveci, Kalem, Afet Evleri,Sömek,Tamirci Mahalleleri İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	386.351,43	29.10.2018	0,00	361.904,27	100	Bitti
14	Kastamonu İli İnebolu İlçesi Akgüney Köyü Merkez ve Cidimse (Tamışık ) Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	331.485,15	28.06.2018	0,00	319.630,89	100	Bitti
15	Kastamonu İli İnebolu İlçesi Beyler Köyü Merkez ve Selimoğlu Mahalle	5	19 Madde	233.679,14	28.06.2018	0,00	225.322,53	100	Bitti
16	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Sarpaun Köyü Merkez - Süle ve Koçuşağ Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	156.472,60	12.06.2018	0,00	148.881,56	100	Bitti
17	Kastamonu İli Tosya İlçesi Ortalca Köyü Dere-Balikkayası ve Hacıbrahim Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	19 Madde	108.305,74	12.06.2018	0,00	103.051,45	100	Bitti
18	Kastamonu İli ve İlçelerinde kullanılmak üzere İçme Suyu Borusu Alımı İşi	5	19 Madde	395.469,33	15.08.2018	0,00	395.469,33	100	Bitti
19	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ayrıllı Köyü Merkez Mahalle İçmesuyu Tesisi Yapım İşi	5	22D Madde	21.240,00	2018	0,00	21.240,00	100	Bitti
20	Kastamonu İli Merkez İlçesi Halife Köyü İçme Suyu Tesisi Bakım Onarım Yapım İşi	5	22D Madde	12.976,12	2018	0,00	12.976,12	100	Bitti
21	Kastamonu İli Cide İlçesi Kalafat Köyü içmesuyu tesisi bakım onarım işi	5	22D Madde	25.358,20	2018	0,00	25.358,20	100	Bitti
<b>TOPLAM</b>				<b>4.515.271,98</b>		<b>0,00</b>	<b>4.413.971,97</b>	<b>100,00</b>	

**Su ve Kanal Hizmetleri İçmesuları kapsamında toplamda 21 adet proje olup; tamamı bitirilmiş;  
Bu işler için; TOPLAM 4.413.971,97 TL harcama yapılmıştır.**



## Araç - Çal - İçmesuyu Onarım



## Cide - Çamdibi - İçmesuyu





## Ilgaz Grubu İçmesuyu Yapımı



## İnebolu Akgüney İçmesuyu





## Pınarbaşı Yamanlar İçmesuyu



## Taşköprü Sarpun İçmesuyu



## Yunuslar Depo İçmesuyu





## Tosya Ortalıkça İçmesuyu





## b) Kanalizasyon Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	Alım Yöntemi	Sözleşme Bedeli	Sözleşme Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	Yılı Harcaması	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Çide İlçesi Çamaltı Köyü Merkez Mah., Çatalzeytin İlçesi Konaklı Köyü Merk. Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ Kesin Hesap Hakkekiş Raporu	5	19 Madde	8.216,51	2018	0,00	8.216,51	100	Bitti
2	Kastamonu İli Tosya İlçesi Çaykapı Köyü Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	190.778,39	15.03.2018	0,00	188.792,01	100	Bitti
3	Kastamonu İli Merkez İlçesi İbrahimli Köyü Eyerlik Mah Ek Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	23.621,20	20.07.2017	0,00	22.021,20	100	Bitti
4	Kastamonu İli Merkez İlçesi Kızılkeş Köyü Merkez(Tulum) Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	116.717,64	20.07.2017	0,00	115.717,64	100	Bitti
5	Kastamonu İli Merkez İlçesi Evçiler Köyü Merkez Mah Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	95.659,98	20.07.2017	0,00	94.629,79	100	Bitti
6	Kastamonu İli Merkez İlçesi Sipahi Köyü Ahlatcık Mah Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	134.303,70	12.06.2018	0,00	133.416,23	100	Bitti
7	Kastamonu İli Merkez İlçesi Yk. Kuyucak Köyü Yanlız Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	63.928,15	12.06.2018	0,00	63.505,72	100	Bitti
8	Kastamonu İli Tosya İlçesi Sekiler Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	126.663,60	12.06.2018	0,00	125.826,62	100	Bitti
9	Kastamonu İli Tosya İlçesi Çifter Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	118.105,24	12.06.2018	0,00	117.324,81	100	Bitti
10	Kastamonu İli Tosya İlçesi Kösen Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	22.015,48	12.06.2018	0,00	21.870,00	100	Bitti
11	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	209.239,41	12.06.2018	0,00	209.004,69	100	Bitti
12	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ömerli Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	33.051,73	12.06.2018	0,00	33.014,65	100	Bitti
13	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Abdalhasan Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	14.210,85	12.06.2018	0,00	14.194,91	100	Bitti
14	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Çoroğlu Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	103.902,27	12.06.2018	0,00	103.785,71	100	Bitti
15	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Sarıkavak Köyü Rabat Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	44.754,19	12.06.2018	0,00	44.703,99	100	Bitti
16	Kastamonu İli Daday İlçesi Çömlükçiler Köyü Yk. Mahalle Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	52.622,80	29.05.2018	0,00	52.352,38	100	Bitti
17	Kastamonu İli Ağlı İlçesi Adalar Köyü Merkez Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	65.178,16	29.05.2018	0,00	64.843,22	100	Bitti
18	Kastamonu İli Azdavay İlçesi Gültepe Köyü Yeni (inönü) Mah. Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	79.509,25	29.05.2018	0,00	79.100,67	100	Bitti
19	Kastamonu İli ve İlçelerinde kullanılmak üzere Kanalizasyon Borusu Alımı İşİ	5	19 Madde	122.720,00	15.08.2018	0,00	122.720,00	100	Bitti
20	Kastamonu İli Seydiler İlçesi Asfalt Plent Şantiyesine Kanalizasyon Borusu ve Rögarı Döşeme İşİ	5	22D Madde	5.455,86	2018	0,00	5.455,86	100	Bitti
				<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.620.496,61</b>	<b>100,00</b>	

**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kanalizasyon Hizmetleri kapsamında toplamda 20 adet proje olup; tamamı bitirilmiş; Bu işler için; TOPLAM 1.620.496,61 TL harcama yapılmıştır.**



## Ađlı Adalar Kanalizasyon



## Daday mlekiler Kanalizasyon



## Merkez Sipahiler Kanalizasyon









## Taşköprü Çoroğlu Kanalizasyon



**Tosya Çifter Kanalizasyon**



**Tosya Kösen Kanalizasyon**







**Merkez Yukarı Kuyucak Kanalizasyon**



## c) Sulama ve Toprak Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	Alım Yöntemi	Sözleşme Bedeli	Sözleşme Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	Yılı Harcaması	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Kastamonu Merkez Çiğil Köyü Sulama Suyu Tesisi Geliştirme Projesi Yapım İşİ		19 Madde	21.252,06	31.05.2018	0	21.183,14	100	Bitti
2	Kastamonu Merkez Pehlivan Köyü Sulama Suyu Tesisi Geliştirme Projesi Yapım İşİ	5	19 Madde	136.294,90	31.05.2018	0	135.852,88	100	Bitti
3	Kastamonu Merkez Baltacıkuuyucuğı Köyü Sulama Suyu Tesisi Geliştirme Projesi Yapım İşİ		19 Madde	31.703,10	31.05.2018	0	31.600,28	100	Bitti
4	Kastamonu Merkez Taşlık Köyü Sulama Göleti Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	487.485,07	18.05.2018	0	487.274,07	100	Bitti
5	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ortaköy Köyü Elektropompaj Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi İnşaatı	5	19 Madde	410.481,48	24.05.2018	0	410.072,25	100	Bitti
6	Kastamonu İli Tosya İlçesi Kınık Köyü Sulama Suyu Tesisi İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	179.217,89	11.07.2018	0	174.898,77	100	Bitti
7	Kastamonu İli ve İlçelerinde kullanılan Sulama Borusu Alımı İşİ	5	19 Madde	21.240,00	15.08.2018	0	21.240,00	100	Bitti
8	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ortaköy Köyü Elektropompaj Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi Elektromotopomp Grubu ve Y.G. ENH. İnşaatı Yapım İşİ	5	19 Madde	213.023,93	2018	0	187.217,62	100	Bitti
9	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Bekdemirekçi Köyü Sulama Suyu Tesisi İnşaatı	5	19 Madde	0,00		0	0,00	0	İhale Aşamasında
10	Kastamonu İli Merkez Kurtköy Köyü Sulama Suyu Tesisi İnşaatı Yapım İşİ	5	22D Madde	13.571,40	2018	0	13.571,40	100	Bitti
11	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Uzunlavak Köyü Sulama Suyu Tesisi İnşaatı Yapım İşİ	5	22D Madde	25.993,09	2018	0	25.993,09	100	Bitti
12	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Akseki Köyü Sulama Suyu Tesisi İnşaatı Yapım İşİ	5	22D Madde	23.449,67	2018	0	23.449,67	100	Bitti
	<b>TOPLAM</b>			<b>1.563.712,59</b>		<b>0,00</b>	<b>1.532.353,17</b>	<b>91,67</b>	

**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü - Sulama ve Toprak Hizmetleri kapsamında toplamda 12 adet proje olup; 11 tanesi bitirilmiş, 1 tanesi ihale Aşamasında olup; Bu işler için; TOPLAM 1.532.353,17 TL harcama yapılmıştır.**



## Merkez İlçe Pehlivan Köy - Sulama




## Taşköprü İlçe Ortaköy Köyü - Sulama





## Merkez İlçe Taşlık Köyü

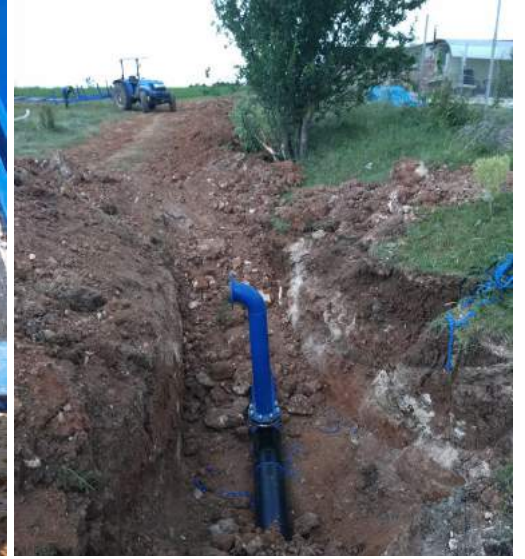

## Tosya - Kınık - Sulama





## d) Sondaj Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	Alım Yöntemi	Sözleşme Bedeli	Sözleşme Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	Yılı Harcaması	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Kastamonu İli Merkez İlçesi Gömeç -Merkez mahallesi İçmesuyu Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
2	Kastamonu İli Merkez İlçesi Nalcıkuyucağı- Merkez mahallesi İçmesuyu Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
3	Kastamonu İli Merkez İlçesi Ortaboğaz Sulama Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
4	Kastamonu İli Devrekani İlçesi Kanlıabat-Güney-Arkutça mahallesi İçmesuyu Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
5	Kastamonu İli Hanönü İlçesi Yenice-Damlaca mahallesi İçmesuyu Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
6	Kastamonu İli Seydiler İlçesi Kepez-Merkez-Aliğa-Yakupoğlu mahallesi İçmesuyu Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
7	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Çördük-Merkez mahallesi İçmesuyu Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
8	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Karapürçek-Yeni mahallesi İçmesuyu Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
9	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Bekdemirekşi- Merkez mahallesi Sulama Sondaj işi			0,00	2018	0,00	0,00	100	Bitti
10	Kastamonu İli ve İlçelerinde kullanılmak üzere Sondaj Borusu Alımı işi		19 Madde	96.972,40	2018	0,00	0,00	100	Bitti
	<b>TOPLAM</b>			<b>96.972,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

**Su ve Kanal Hizmetleri - Sondaj Hizmetleri kapsamında toplamda 10 adet proje olup; tamamı bitirilmiş; Bu işler için; HARCAMA YAPILMAMIŞTIR.**









## e) Laboratuvar Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	Alım Cinsi	Sözleşme Bedeli	Sözleşme Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	Yılı Harcaması	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Müdürlüğümüz Laboratuvar işlerinde kullanılmak üzere T80 CELL Holder (Motorsuz) Filtre Wheel Mal Alım İşi	5	22D Madde	3.068,00	2018	0,00	3.068,00	100	
2	Müdürlüğümüz Laboratuvar işlerinde kullanılmak üzere laboratuvar Malzemesi Mal Alım İşi	5	22D Madde	12.091,59	2018	0,00	12.091,59	100	
3	Müdürlüğümüz Laboratuvar Şefliği AAS Cihazına Yedek Parça Malzeme Alım İşi	5	22D Madde	4.577,03	2018	0,00	4.577,03	100	
<b>TOPLAM</b>				<b>19.736,62</b>		<b>0,00</b>	<b>19.736,62</b>	<b>100,00</b>	

**Su ve Kanal Hizmetleri - Laboratuvar Hizmetleri kapsamında toplamda 3 adet proje olup; tamamı bitirilmiş; Bu işler için; 19.736,62 TL harcama yapılmıştır.**



## KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	Alım Yöntemi	Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması	Yılı Harcaması	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Güvenlik Hizmeti Alımı	5	19 A + KÖYAŞ	1.573.423,09 (KDV Dahil)	1.181.374,97 TL.	148.027,98 TL.	100%	İhalesi 36 Aylık 15 Ay 1 günü bitti. (02.04.2018 tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği)
				2018 yılı harcaması: 148.097,98 TL.(KDV Dahil)				
2	Güvenlik Hizmeti Alımı	5	19 A + KÖYAŞ	1.542.154,63 (KDV Dahil)	447.258,31 TL.	146.549,24 TL.	100%	İhalesi 34 Aylık 13 Ay 1 günü bitti (02.04.2018 tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği)
				2018 yılı harcaması: 146.549,24 TL.(KDV Dahil)				
3	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Bahçe, Süs Bitkisi ve Çiçek Alımı )	5	22/d	10.936,94 TL. (KDV Dahil)	12.154,00 TL.	10.936,94 TL.	100%	Bitti (600 Adet Genel Sekreterlik ve Ek Hizmet Binası Yerleşkelerine Çiçek ve Süs Bitkisi Alımı Yapılmıştır.)
4	Mamül Mal Alımları - Mobilya Alımı	5	22/d	6.799,68 TL. (KDV Dahil)		6.799,68 TL.	100%	Bitti (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mobilya Alımı)
5	Mamül Mal Alımları (Güvenlik noktalarına mefruşat alımı)	5	Avans (DMO)	8.173,23 TL. (KDV Dahil)		8.173,23 TL.	100%	Bitti ( Tüm Güvenlik Noktalarına Dolap, Koltuk ve Sandalye Alımı)
6	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları - B Sosyal Tesisleri Doğalgaz Alımı	5	22/b	5.000,00 (KDV Dahil)		5.000,00 TL.	100%	Bitti
7	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları - A Sosyal Tesisleri Doğalgaz Alımı	5	22/b	8.000,00 (KDV Dahil)		8.000,00 TL.	100%	Bitti
<b>TOPLAM</b>						333.487,07		

**Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kapsamında toplamda 7 adet proje olup; tamamı bitirilmiş; Bu işler için; 333.487,07 TL harcama yapılmıştır.**



## a) Eğitim Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	Merkez Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu Asansör Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	223.704,40	0,00	0,00	0	sözleşme aşamasında
2	İhsangazi 8 Derslik Lise ve Atölye Binası Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	3.150.215,92	2.166.897,42	983.318,50	100	Bitti
3	Ağlı 8 Derslikli Lise ve Atölye Binası Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	3.727.422,59	1.296.082,37	2.431.340,22	100	Bitti
4	Cide 12 Derslikli İlkokul Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	2.817.840,00	0,00	1.015.670,24	45	Devam Ediyor
5	Çatalzeytin 8 Derslikli Lise ve Atölye Binası Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	3.456.220,00	321.992,94	0,00	12	İş durduruldu
6	Merkez Atabey İlkokulu Yeni Derslik Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	4.708.200,00	0,00	2.742.488,22	50	Devam Ediyor
7	Kuzeykent İlkokulu Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	2.865.630,00	0,00	1.913.553,58	80	Devam Ediyor
8	Tosya Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	0,00	0,00	0,00	0	İhale aşamasında olup, Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 17/01/2019 tarih-1241893 sayılı yazısına istinaden iptal edilmiştir.
9	Devrekani Halime Celal Budak Ortaokulu Yemekhane ve Spor Salonu Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	4.630.320,00	0,00	1.706.303,87	45	Devam Ediyor
10	Şenpazar Karaman İlkokulu 12 Derslikli Okul Binası Yapım İşi	5	19. Madde	Yapım	0,00	0,00	0,00	0	İhale aşamasında olup, Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 17/01/2019 tarih-1241893 sayılı yazısına istinaden iptal edilmiştir.
11	Kastamonu Şehit Uğur YILDIZ 12 Derslikli İlkokul Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	3.022.056,93	1.020.873,12	1.850.080,96	99	Devam Ediyor
12	Taşköprü Alataarla İlköğretim Okulu ve Ortaokulu Onarım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	1.037.220,00	0,00	305.107,32	75	Devam Ediyor
13	Kastamonu Darende İlköğretim Okulu Yapımı	5	19. Madde	Yapım	3.791.340,00	0,00	0,00	15	Devam Ediyor
14	İnebolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu İkmal İnşaatı İşi	8	19. Madde	Yapım	1.981.220,00	0,00	0,00	0	Sözleşme Aşamasında
15	Aytaç Erüz Anadolu Lisesi E Sınava Merkezi Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	1.568.220,00	0,00	266.309,04	20	Devam Ediyor
16	Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi Pansiyon Binası Onarım İşi	8	19. Madde	Yapım	0,00	0,00	0,00	0	İhale Aşamasında
17	Kastamonu Mustafa Kaya - Nedime KAYA Spor Salonu Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	6.928.960,00	0,00	367.379,90	10	Devam Ediyor
18	Pınarbaşı 8 Derslik Lise ve Atölye Binası Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	3.467.704,80	1.189.895,72	2.277.736,98	100	Bitti
19	Kastamonu Merkez Çok Programlı Lise Binası Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	3.281.970,83	0,00	2.186.521,23	80	Devam Ediyor
20	Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	9.346.780,00	0,00	0,00	5	devam ediyor

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yıllı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
21	Kastamonu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	8	19. Madde	Yapım	816.107,39	151.654,89	664.452,50	100	Bitti
22	Merkez Ali Fuat Darende İlkokulu Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	10.094.900,00	0,00	9.325.703,77	95	Devam Ediyor
23	Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	8	19. Madde	Yapım	3.381.880,00	0,00	3.139.102,34	95	Devam Ediyor
24	İnebolu Ortaokulu Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	4.410.840,00	0,00	0,00	0	İş durduruldu
25	Merkez Ortaokulu Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	9.929.700,00	0,00	3.425.097,26	50	Devam Ediyor
26	Mustafa Kaya Ortaokulu Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	8.781.560,00	0,00	1.832.943,22	40	Devam Ediyor
27	PERVANEÖĞLÜ ALİ Ortaokulu Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	4.769.560,00	0,00	2.534.945,33	60	Devam Ediyor
28	Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	2.493.340,00	0,00	1.954.165,32	90	Devam Ediyor
29	15 TEMMUZ ŞEHİTLER Anadolu Lisesi Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	8.283.600,00	0,00	2.829.611,07	40	Devam Ediyor
30	Merkez Şehit Şerife Bacı Ortaokulu Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	10.307.300,00	0,00	1.261.549,74	25	Devam Ediyor
31	Cide Şehit Necmi Yıldırım İlkokulu yapımı	8	19. Madde	Yapım	7.540.200,00	0,00	0,00	0	Sözleşme Aşamasında
32	Araç Ahmet Yesevi 16 Derslik Okul yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	6.077.000,00	0,00	0,00	0	Sözleşme Aşamasında
33	Araç İHO 12 Derslik Okul Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	6.651.660,00	0,00	1.113.420,74	15	Devam Ediyor
34	Taşköprü M. sıtkı Erkek Mtal Pan.Binası Deprem Güçlendirme	8	19. Madde	Yapım	1.622.500,00	0,00	771.894,19	75	Devam Ediyor
35	Merkez Bilim ve Sanat Merkezi Yapımı	5-8	19. Madde	Yapım	5.239.200,00	0,00	679.280,96	20	Devam Ediyor
36	Tosya Atatürk İlkokulu Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	3.332.320,00	0,00	0,00	0	Sözleşme Aşamasında
37	Merkez Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Okul Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	0,00	0,00	0,00	0	İhale Aşamasında
38	Araç Yeşilova İlkokulu Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	2.824.920,00	0,00	0,00	0	Sözleşme Aşamasında
39	Kastamonu Ceritoğlu İlkokulu 12 Derslikli Okul Binası Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	0,00	0,00	0,00	0	İhale aşamasında
40	Merkez Behçet Necatigil 8 Derslikli İlkokulu Binası Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	0,00	0,00	0,00	0	İhale aşamasında olup, Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 17/01/2019 tarih-1241893 sayılı yazısına istinaden iptal edilmiştir.
41	Ağlı ÇPL Pansiyon Binası Yangın Merdiveni Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	0,00	0,00	0,00	0	İhale aşamasında
	<b>TOPLAM</b>								
							47.577.976,50		

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kapsamında Eğitim sektöründe 34 ihale yapılmış olup, toplamda 4 adet bitirilmiş, 22 adet devam etmekte, ve bu işler için toplamda 47.577.976,50 TL harcama yapılmıştır.**



## ALİ FUAT DARENDE İLKOKULU



## KUZEYKENT ÇPL





## KUZEYKENT İLKOKULU



### ŞEHİTLER ANITI ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE GİRİŞ ÜNİTESİ YAPIM İŞİ





## Merkez Ortaokulu



## Mimar Vedat Tek Kültü ve Sanat Merkezinin Geliştirilmesi





## Kastamonu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Binası Yapımı



## Küre Dağları Milli Parkı Horma Kanyonu Patika Yol ve Çevre Düzenlemesi





### b) Kültür ve Turizm Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	Küre Dağları Milli Parkı Horma Kanyonu Patika Yol ve Çevre Düzenlemesi	8	19. Madde	Yapım	2.979.174,06	1.156.580,15	740.114,62	80	Devam Ediyor
2	Kastamonu Şehitler Anıtı Çevre Düzenlemesi Ve Giriş Ünitesi Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım	700.206,10	0,00	344.513,13	100	Bitti
3	Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinin Geliştirilmesi	5	Doğrudan Temin	Yapım	50.000,00	0,00	42.781,51	100	Bitti
4	Tosya Kültür Merkezi Onarım İşi	8	19. Madde	Yapım	165.082,00	0,00	0,00	100	Bitti

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kültür ve Turizm sektöründe 4 ihale yapılmış olup, toplamda 3 adet bitirilmiş, 1 adet devam etmekte, ve 1.127.409,26 TL harcama yapılmıştır.**

### c) Sağlık Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	Mehmet Akif Ersoy Mah.. 5- 6 Hekimli ASM + 112 ASHİ Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	2.836.720,00	0,00	0,00	0	Devam Ediyor
2	Saraçlar Mah 5- 6 Hekimli ASM + 112 ASHİ Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	3.165.940,00	0,00	0,00	0	İş durduruldu
3	Tosya İlçeE Sağlık Müdürlüğü(T10) + 7 Hekimlik ASM VE 112 ASHİ Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	5.025.620,00	0,00	0,00	0	Devam Ediyor
4	Devrekani T12 TIP TSM + 5 HEKİMLİ ASM + 112 ASHİ Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	4.570.140,00	0,00	0,00	10	Devam Ediyor
5	Taşköprü İlçeE Sağlık Müdürlüğü(T10) + 7 Hekimlik ASM VE 112 ASHİ Yapım İşi	8	19. Madde	Yapım	3.963.000,00	0,00	0,00	10	Devam Ediyor

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Sağlık Hizmetlerinde 5 ihale yapılmış olup, toplamda 4 adet devam etmekte,1 iş durdurulmuş olup HARCAMA YAPILMAMIŞTIR.**

## d) Yerel Yönetim Kamu Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Kastamonu Özel İdare İş Hanı Yapımı	5	19. Madde	Yapım	7.528.400,00	0,00	1.668.107,50	25	Devam Ediyor
2	Doğa Kültür Köyü Nizamıye Yapımı, Çevre Düzenleme ve Aydınlatma İşİ	5	19. Madde	Yapım	517.217,48	0,00	512.587,02	100	Bitti
3	Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii Tuvalet ve Abdesthane Yapım İşİ	8	19. Madde	Yapım	115.289,46	0,00	0,00	0	Sözleşme Aşamasında
4	Devrekani Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşüm İşİ	8	19. Madde	Yapım	80.004,00	0,00	0,00	95	Devam Ediyor
5	Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı	8	19. Madde	Yapım	6.460.500,00	1.005.806,17	4.725.301,66	100	Bitti
6	Vali Konağı Onarımı	5	19. Madde	Yapım	106.612,66	0,00	129.726,61	100	Bitti
7	Kastamonu İl Özel İdaresi Ek Binası Onarım İşİ	5	19. Madde	Yapım	492.503,27	0,00	437.887,56	100	Bitti
8	Seydiler Asfalt Plenti İdari Bina Onarımı Ve Doğalgaz Tesisatı Yapım İşİ	5	19. Madde	Yapım	180.773,83	0,00	180.773,83	100	Bitti
9	Şantiye Binaları Bakım ve Onarımı	5	Doğrudan Temin	Yapım	94.751,90	0,00	94.751,90	100	Bitti
10	Özel İdare Hizmet Binası ve Lojmanların Bakım ve Onarımı	5	Doğrudan Temin	Yapım	400.000,00	0,00	399.986,84	100	Bitti
TOPLAM							8.149.122,92		

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Yerel Yönetim Kamu Hizmetleri Kapsamında 10 ihale yapılmış olup, toplamda 7 adet bitirilmiş, 2 adet devam etmekte ve 1 adet sözleşme aşamasında olup 8.149.122,92 TL harcama yapılmıştır.**



## d) Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Merkez Kentiçi Yönetim Sistemi Mobese ve CCTV Kurulumu	8	Pazarlık	Yapım	1.806.201,13	402.060,13	1.404.141,00	100	bitti
2	Kastamonu Merkez ve İlçe Polis Merkezlerine Kamera Sistemi Kurulumu	5-8	Pazarlık	Yapım	222.042,47	0,00	222.042,47	100	Bitti
3	Polis Meslek Yüksekokulu Çevre Duvarı Yapımı	8	19. Madde	Yapım	207.901,23	0,00	187.096,18	100	bitti
4	Kastamonu İli Cide İlçesi Çayyaka Köyü Jandarma Karakol Binası Onarım İşİ	8	19. Madde	Yapım	415.345,97	0,00	415.345,97	100	Bitti
5	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları İnebolu Merkez Karakolu Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	23.922,33	0,00	23.922,33	100	Bitti
6	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Doğanyurt Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	115.990,46	0,00	115.990,46	100	bitti
7	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Çatalzeytin Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	49.499,06	0,00	49.499,06	100	bitti
8	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Cide Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	75.932,23	0,00	75.932,23	100	bitti
9	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Bozkurt Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	108.049,86	0,00	99.490,12	100	bitti
10	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Azdavay Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	77.554,19	0,00	71.066,89	100	bitti
11	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Araç-Boyali Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	15.576,00	0,00	15.576,00	100	bitti
12	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Alatarla Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	69.623,92	0,00	69.623,92	100	bitti
13	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Abana Hizmet Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	87.758,44	0,00	80.403,50	100	bitti
14	Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Lojmanları Onarımı	8	19. Madde	Yapım	217.571,58	111.899,47	105.672,11	100	Bitti
15	Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Merkez Kuzyaka Lojman Binası Mantolama İşİ	8	19. Madde	Yapım	40.710,00	0,00	40.710,00	100	bitti
16	Beşinci Jandarma Eğitim ve Alay Komutanlığı Doğalgaz Ana Bağlantı Boru Hatlı Yapımı	8	22 B Maddesi	Yapım	1.029.311,17	2.711,17	1.026.600,00	100	Bitti
17	Beşinci Jandarma Eğitim ve Alay Komutanlığı Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı	8	19. Madde	Yapım	220.660,00	0,00	148.375,63	100	Bitti
18	Beşinci Jandarma Eğitim ve Alay Komutanlığı Lojman Binaları Bakım ve Onarımı	8	19. Madde	Yapım	92.040,00	0,00	68.963,79	100	Bitti
19	Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü 3 Adet Asansör Onarım İşİ	8	19. Madde	Yapım	123.900,00	0,00	0,00	100	bitti
20	Polis Meslek Yüksekokulu Hizmet Binaları Çatı Onarım İşİ	8	Pazarlık	Yapım	277.276,73	0,00	202.120,69	100	bitti

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Kapsamında 20 ihale yapılmış olup, tamamı bitirilmiş ve bu işler için toplam 4.422.572,36 TL harcama yapılmıştır.**

## e) Diğer Kamu Hizmetleri

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Merkez El Sanatları Eğitim Merkezi Binası Onarımı	8	19. Madde	Yapım	1.058.989,89	21.921,36	1.037.068,53	100	Bitti

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Diğer Kamu Hizmetleri Kapsamında 1 adet ihale yapılmış ve bitirilmiş olup, bu iş için toplam 1.037.068,53 TL harcama yapılmıştır.**



## 112 Acil Çaęrı Merkezi Hizmet Binası



## 6 kg 1000 Adet Kkt Yangın Söndürme Tüęü Cihazı Alımı





## Kastamonu Özel İdare İş Hanı Yapımı



## 800 litre kapasiteli 360 adet Galvenizli Metal Çöp Konterner Mal Alım İşi





# YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	İlgaz Dağı Yurduntepe 4. Etap Sanat Yapıları ve Yol Kaplama Yapım İşİ	05/08	21 B Maddesi	Yapım	21.333.736,60	0,00	16.247.867,08	80,00	Devam Ediyor
2	İlgaz Dağı Yurduntepe Ulaşım Yolu ve Sanat Yapıları Yapım İşİ (İKMAL)	05/08	21 B Maddesi	Yapım	8.242.310,08	0,00	4.802.132,92	60,00	Devam Ediyor
3	Bitüm Malzeme Alımı (TUPRAŞ Protokol)	05/08	22/a Protokol	Mal Alımı	19.850.000,00	0,00	15.484.504,15	100,00	Bitti
4	Bitüm Nakli Hizmet Alımı	05	19. Madde	Hizmet Alımı	429.048,00	0,00	427.483,17	100,00	Bitti
5	Bitüm Nakli Hizmet Alımı (21-f)	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	257.004,00	0,00	254.706,15	100,00	Bitti
6	İzmit Tupaş Rafineri- Kırıkkale Tupaş rafineri Bitüm Nakli Hizmet Alımı İşİ	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	249.511,00	0,00	168.951,62	67,71	Bitti
7	BSK Üretimi (2017-2018 yılı sari)	05	19. Madde	Yapım	6.124.200,00	2.939.394,87	3.184.805,13	100,00	Bitti
8	BSK Üretimi (150.000 ton)	05	19. Madde	Yapım	8.788.050,00	0,00	762.867,92	35,00	Devam Ediyor
9	Seydiler Asfalt Plantinde Kullanılmak Üzere Bakım Agregasi Mal Alımı İşİ	05	19. Madde	Mal Alımı	2.749.695,00	0,00	2.749.695,00	100,00	Bitti
10	Merkez Asfalt Plantinde Kullanılmak Üzere Bakım Agregasi Mal Alımı İşİ	05	19. Madde	Mal Alımı	3.171.604,00	0,00	1.763.222,47	78,00	Devam Ediyor
11	Kış Şartlarında Bozulan Yolların tamir edilerek Ulaşımın Güvenle Sağlanması için İdare Mali Roadmix malz. ile Asfalt yaması Yapılması Hizmet Alımı	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	268.660,63	0,00	268.660,63	100,00	Bitti
12	2017 yılı Köydes Programında yer alan 71,35 km 2 kat asfalt sathi kaplama programında yer alan 62,60 km 2.kat 2 kat asfalt sathi kaplama işindeki köy yollarının , İdare mali roadmix malzeme ile asfalt yaması yapılması hizmet alımı işİ	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	273.835,52	0,00	273.835,52	100,00	Bitti
13	İl Özel İdaresi 2018 yılı Öz Bütçe yatırım programında yer alan 49,00 km 2.kat Asfalt kaplama işindeki köy yollarının idare mali roadmix malzeme ile asfalt yaması yapılması hizmet alımı işİ	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	305.122,63	0,00	305.122,63	100,00	Bitti
14	Merkez İlçe ve (Araç,Azdavay,Cide, Çatalzeytin, Daday, İnebolu,Küre,Pınarbaşı, Şenpazar, Taşköprü) İlçeleri muh.ky. idare mali roadmix malzeme ile yama yapılması	08	21 B Maddesi	Hizmet Alımı	3.238.392,00	0,00	3.237.987,69	100,00	Bitti
15	Daday İlçesi Muh.ky. idare Mali Roadmix Malzeme ile Asfalt Yama yapılması Hizmet Alımı	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	284.584,38	0,00	284.584,38	100,00	Bitti
16	Sıcak asfalt kaplama işinde Kullanılmak üzere ( 1 adet Asfalt Finişeri, 1 Adet Lastik Tekerlekli (Wabil) Silindir, 1 Adet Demir Bandajlı Silindir ve 4 Adet Dampirli Kamyon) İş Makinalarının Kiralanması	08	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	251.517,00	0,00	251.517,00	100,00	Bitti
17	PMT (Plentmiks Temel) yapılması işinde kullanılacak (1 Adet Asfalt Finişeri, 3 Adet Damperli Kamyon) iş makinalarının kiralanması hizmet alımı işİ	08	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	233.640,00	0,00	233.640,00	100,00	Bitti
18	Seydiler, Ağlı, Devrekani (Şenlik Berendi Ky. ) ve Daday İlçeleri Muhtelif Köy Yollarında Yapılacak Sıcak Asfalt Kaplama İşinde Kullanılacak İş Makinalarının Kiralanması İşİ	08	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	253.192,60	0,00	253.192,60	100,00	Bitti
19	Sıcak asfalt kaplama işinde kullanılmak üzere finişer kiralanması	08	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	231.569,10	0,00	185.255,28	100,00	Bitti
20	Merkez İlçe Yürekveren Ky (SSB) Yol Yapımında ve Devrekani Laçın Contay Belovacak ky (BSK) Yol yapımı işlerinde kullanılmak üzere iş makinası kiralama hizmet alımı	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	235.410,00	0,00	208.506,00	100,00	Bitti

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
21	Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere kalorifer Yakıtı Mal Alımı	08	19. Madde	Mal Alımı	757.630,80	0,00	889.509,40	100,00	Bitti
22	Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere kalorifer Yakıtı Mal Alımı (21-f)	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	242.726,00	0,00	220.052,54	100,00	Bitti
23	Abana ve Çatalzeytin İlçeleri Muhtelif Köy yollarında Kullanılmak üzere Mıdır ve Temel malzemesi Alım İşi	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	223.809,42	0,00	183.090,80	100,00	Bitti
24	2017 yılı Köydes Programında yer alan 71,35 km 2 kat asfalt sathi kaplama programında yer alan 62,60 km 2.kat asfalt sathi kaplama işindeki köy yollarının roadmiks yapılması işinde kullanılacak Agrega Mal Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	256.260,60	0,00	238.129,22	100,00	Bitti
25	Araç ve Daday İlçeleri Muh.ky. 1. ve 2. kat asfalt kaplama mıdır alımı	08	21 F Maddesi	Mal Alımı	93.679,73	0,00	90.392,72	100,00	Bitti
26	Merkez Kuru-Gömeç ve Ortaboğaz-Oğul ky.PMT Yapılması Malzeme temini	08	21 F Maddesi	Mal Alımı	199.473,10	0,00	175.268,77	88,00	Bitti
27	Taşköprü İlçesi Akdoğan-Masatlar-Donalar Gr ky. PMT Yapımı Malzeme Alımı	08	21 F Maddesi	Mal Alımı	198.983,40	0,00	192.936,22	97,00	Bitti
28	Merkez İlçe Kircalar Ky. Ve Halaçlı Gr ky. PMT Yapımı Malzeme Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	223.218,24	0,00	220.853,90	100,00	Bitti
29	Merkez İlçe Hocaöy ve Ortaköy Ky. PMT Yapımı Malzeme Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	203.243,26	0,00	201.546,19	100,00	Bitti
30	Merkez Gökkökent ky. Beton yol yapılması işi kapsamında beton alınması mal Alım işi	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	227.150,00	0,00	201.542,02	89,00	Bitti
31	Merkez Asfalt Plentinde Kullanılmak üzere 11.000 ton bakım agregası mal alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	236.236,00	0,00	218.682,67	100,00	Bitti
32	2017 Yatırım Programı Dahilinde Yapılacak İşlerde Kullanılmak Üzere PMT Temel Yapılması İçin Malzeme temini Mal Alımı	08	21 F Maddesi	Mal Alımı	222.813,50	0,00	222.813,50	100,00	Bitti
33	Ağlı İlçesi Yusufbaşoğlu-Paşaoğlu-Kelta- Bereketli PMT Malzeme Temini mal Alımı	08	21 F Maddesi	Mal Alımı	178.097,40	0,00	167.860,52	100,00	Bitti
34	Cide ve Şenpazar İlçeleri Muh.Ky.kullanılacak Binder karışım malzemesinin üretimi için 10.000 ton Agrega mal alımı	08	21 F Maddesi	Mal Alımı	185.260,00	0,00	65.000,00	100,00	Bitti
35	Tosya İlçesi Aş.Kayı- Aş.Berçin- Yk. Berçin ve Merkez İlçe Pehlihan Ky. Kullanılmak Üzere (New Jersey Tipi) beton yol korkuluğu ve Son elamanı alım işi	05	Pazarlık	Mal Alımı	163.253,00	0,00	163.253,00	100,00	Bitti
36	Merkez ve İlçe Köy yolları Altyapısında Kullanılmak Üzere HDPE Koruge Boru Mal Alımı	05	19. Madde	Mal Alımı	261.216,60	0,00	261.216,60	100,00	Bitti
37	Taşköprü Kabalar Köy Yolu DSI Gölet Dolu Savaşına Çift Gözlü Köprü Tipi Menfez Yapım İşi	05	19. Madde	Yapım	177.772,78	0,00	171.061,98	100,00	Bitti
38	Taşköprü Akdoğan Grup Ky-Köçekli-Alisaray Grup Ky. Sanat Yapıları Yapım İşi	05	19. Madde	Yapım	240.511,60	0,00	66.015,37	40,00	Devam Ediyor
39	Devrekani ve İnebolu İlçeleri Muh Köy yolları Sanat Yapıları Yapım İşi	05	19. Madde	Yapım	313.012,70	0,00	142.033,08	100,00	Bitti
40	Merkez Kasaba Köyü Sanat Yapıları Yapım İşi	05	19. Madde	Yapım	202.910,64	17.381,87	185.528,35	100,00	Bitti
41	Cide İlçesi Günebakan-Kumköy Köy yollarında yapılacak 9 adet Menfez ve 1 adet istinat Duvarı ve Cide İlçesi Konuklar Ky Filler Mlz Alımı için Protokolle KHGB aktarılan	05	Protokol	Mal Alımı	428.387,56	0,00	428.387,56	100,00	Bitti
42	Doğanyurt İlçesi Çakırlı Köyü Evşen Mah. 1.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi için Protokol- le KHGB aktarılan	05	Protokol	Yapım	9.455,90	0,00	9.455,90	100,00	Bitti
43	Cide Konuklar Doğanyurt Çakırlı-Gözülan ve Pers Çalıştırılması Protokol Bedeli	05	Protokol	Hizmet Alımı	233.200,00	0,00	178.951,28	100,00	Bitti
44	Muh.yollarda Trafik düzen ve güvenliğini sağlamak için yapılacak yatay işaretleme çalış- malarında kullanılmak üzere yol çizgi boyası, cam küreciği ve tiner mal alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	137.883,00	0,00	137.883,00	100,00	Bitti
45	Merkez asfalt plentine agrega temini, Taşköprü İlçesi Akseki köyü,Hanönü İlçesi Hocavakıf- Çaybaşı Gr Ky ve merkez İlçe Akdoğan-Karaş gr ky PMT Yapımı,BSK Serme Sıkıştırma Yapım İşi	05	19. Madde	Yapım	2.448.865,80	0,00	2.332.597,61	100,00	Bitti



Sıra No	İşin Adı	F.Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme	İşin Durumu
46	Dadaş ilçesi Kütlen- Yazımcıydan-Şükür- Kayadağı Gr.Ky.ve Arabacılar-Çayözü Gr.Ky. PMT için Miz.temini ve İhsangazi İlçesi Kızıleliler- Belençalı-Obruk-sarpınar Gr.Ky. PMT Yapımı	05	21 F Maddesi	Yapım	1.179.351,00	0,00	942.866,57	80,00	Devam Ediyor
47	Cide İlçesi Kuşçayası Ky.,Mencekli Köyü Karaca My.,Toygarlı - Kovanören Gr.Ky.ve Şenpazar İlçesi Salman Ky. Sanat Yapıları Yapım İşi	05	19. Madde	Yapım	171.468,93	0,00	159.301,16	100,00	Bitti
48	Azdavay İlçesi Maden-Çömlektepe-Kervansaray Gr.Ky.(8+214 km) Alt Temel Malzeme Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	184.157,88	0,00	183.958,79	100,00	Bitti
49	Kiralık Plentte kullanılmak üzere 60.000 ton BSK Agregası Mal Alımı	05	19. Madde	Mal Alımı	1.597.548,90	0,00	1.597.477,35	100,00	Bitti
50	Pınarbaşı İlçesi İlica-Muratbaşı- Valla Gr Ky. PMT ve BSK Yapım İşi	08	19. Madde	Yapım	6.490.708,00	0,00	2.168.706,60	35,00	Devam Ediyor
51	Taşköprü İlçesi Köçekli Köy yolu (BSK) Yol Yapımında Kullanılmak Üzere İş Makinası Kiralanması İşi	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	217.651,00	0,00	174.120,80	100,00	Bitti
52	Azdavay İlçesi Ali Gr Ky ve Kundura-Çamdibi ky ve Doğanurut İlçesi Başköy-Dört-yol-Köfünambarı Gr Ky. PMT temel yapımı BSK nakli,serme, sıkıştırma yapım işi	08	19. Madde	Yapım	3.344.179,00	0,00	0,00	0,00	Devam Ediyor
53	Merkez İlçe Yk.Elyakut-Yolkonak gr ky.ile Corumlu-Keremli-Köklü ky. PMT ve BSK Yapım İşi	05	21 F Maddesi	Yapım	1.089.022,00	0,00	0,00	0,00	Devam Ediyor
54	Cide İlçesi Beşevler ve Çamdibi ky. Yapılmak üzere Sanat yapıları yapım işi	05	19. Madde	Yapım	369.569,19	0,00	0,00	0,00	Fesih edildi.
55	Merkez Parmaklıtürbe-Çakılı Gr Ky Merkez Karadere Gr.Ky. Ve Devrekani İlçesi Sarıyonca Ky. Hendeklerinin Kaplanması ve Merkez Yolkonak ky. Cami önu Parke Kaplama yapım işi	05	19. Madde	Yapım	723.773,41	0,00	723.268,83	100,00	Bitti
56	Taşköprü İlçesi Köçekli Gr.Ky. PMT temini-Nakli - Serme Sıkıştırma Yapım İşi	05/08	19. Madde	Yapım	1.435.193,72	0,00	1.435.193,70	100,00	Bitti
57	Devrekani İlçesi Contay-Balovacık Gr Ky. BSK Yapılması İşi Kapsamında PMT Nakli-Serme-Sıkıştırma Yapım İşi	08	19. Madde	Yapım	2.052.787,00	0,00	1.037.500,00	55,00	Devam Ediyor
58	Araç İlçesi Fındıklı-Gölcük-Aş-Oba- Yk.Oba Gr ky. PMT ve BSK Yapımı	05	19. Madde	Yapım	1.993.433,00	0,00	0,00	5,00	Devam Ediyor
59	Hanönü ve Taşköprü İlçeleri 1. ve 2. kat Asfalt Sathi Kaplama Programında Yer Alan Yollarda Kullanılmak Üzere Mırcı Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	55.294,80	0,00	55.294,80	100,00	Bitti
60	Merkez İlçe 2.Kat Asfalt Sathi Kaplama Programında Yer Alan Yollarda Kullanılmak Üzere Mırcı Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	233.640,00	0,00	233.639,99	100,00	Bitti
61	Merkez İlçe Yürekeren Ky Silindire Sıkıştırılmış Beton Yol Yapımı için C 30/37 Beton harcı Mal Alımı	08	21 F Maddesi	Mal Alımı	190.770,60	0,00	190.723,85	100,00	Bitti
62	Bozkurt 6 km İnebolu 19,4 km Gr ky Küre 6 km Çatalzeytin 7 km Ky.PMT ve BSK Yapımı, Abana 2,50 km Ky.Beton Yol Yapımı	08	19. Madde	Yapım	13.573.279,52	0,00	1.442.265,35	11,00	Devam Ediyor
63	Taşköprü İlçesi Çöroğlu- Alipaşa Grup Ky PMT Yapımı BSK Nkli Serme Sıkıştırma Yapımı	08	21 B Maddesi	Yapım	966.243,00	0,00	924.992,97	100,00	Bitti
64	Merkez 5,30 km, Cide 13,50 km Gr Ky, Şenpazar 3 km, Küre 4 km Ky, İnebolu 7,50 km PMT Yapımı ve BSK Nakli Serme SıkıştırmaYapılması Kısmi Teklifli Yapım İşi	05	21 B Maddesi	Yapım	4.088.464,00	0,00	1.055.238,43	30,00	Devam Ediyor
65		05	21 B Maddesi	Yapım	853.258,00	0,00	893.943,29	100,00	Bitti
66		05	21 B Maddesi	Yapım	3.209.600,00	0,00	2.505.181,50	80,00	Devam Ediyor
67	Merkez İlçe Muhtelif Köy yollarına Ait Sanat Yapıları	05	19. Madde	Yapım	468.391,77	0,00	339.190,09	100,00	Bitti

Sıra No	İşin Adı	F. Kod	İhale Usulü	İhale Türü	Sözleşme Bedeli (KDV Dahil)	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil)	Fiziki Gerçekleşme	İşin Durumu
68	Merkez ve Azdavay, Hanönü ve Tosya İlçeleri Muhtelif köy yolları ve ortak kullanım alanlarına Beton Parke Kaplama İşleri	05	19. Madde	Yapım	942.626,80	0,00	250.928,55	40,00	Devam Ediyor
69	Doğanyurt İlçesi 1 ve 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Programında Yer Alan Yollarda Kullanılmak Üzere Filler ve Micir Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	229.604,28	0,00	229.604,28	100,00	Bitti
70	Seydiler Asfalt Plantinde Kullanılmak Üzere Bakım Agregası Mal Alımı İşleri-2	05	19. Madde	Mal Alımı	3.075.552,00	0,00	0,00	0,00	Devam Ediyor
71	İdaremiz Merkez Asfalt Plantinde Kullanılmak Üzere Kalorifer yakıtı Alımı İşleri	05	19. Madde	Mal Alımı	264.319,05	0,00	264.069,70	100,00	Bitti
72	Merkez İlçe Kuzuyaka Grubu 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşleri	05	21 F Maddesi	Yapım	253.853,40	0,00	229.185,22	100,00	Bitti
73	Taşköprü İlçesi Boyundurcak Köyü (Müseyit Mah.) Köprüsü Yapım İşleri	05	19. Madde	Yapım	215.814,34	0,00	212.964,15	100,00	Bitti
74	İnebolu İlçesi Ayva Ky-Örtülü Ky-Hacırahmet Gr Ky Çatalzeytin İlçesi Kuzökü Ky ve Tosya İlçesi Aş.Kayı Ky Kullanılmak Üzere (New Jersey Tipi) Beton Yol Korkuluğu ve Beton Yol Korkuluğu Son Elemanı Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	189.174,06	0,00	189.174,06	100,00	Bitti
75	İdaremiz Seydiler Asfalt Plant Tesislerine Bitüm Nakli Hizmet Alım İşleri	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	253.641,00	0,00	253.042,00	100,00	Bitti
76	Merkez İlçe Akkaya Grubu 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşleri	08	21 F Maddesi	Yapım	253.582,00	0,00	209.006,08	100,00	Bitti
77	Asfalt Plantinde Kullanılmak Üzere Kalorifer Yakıtı Mal Alımı	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	253.193,78	0,00	248.956,66	100,00	Bitti
78	Merkez İlçesi Kaşçılar-Karadere, Kuzuyaka-Alpı, Esenli-Damlaçay-Gömmence-Dursunlar, Halaçlı, Devrekani Sarıyonca-Küpcüler, Taşköprü Köçekli Köy Yolu Trafik Bilgi ve İşaret Levhaları Mal Alımı İşleri	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	260.207,70	0,00	260.207,70	100,00	Bitti
79	Merkez ve Seydiler Asfalt Planti Bitüm Nakli	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	254.880,00	0,00	251.737,01	100,00	Bitti
80	Daday İlçesi Arabacılar Ky, İhsangazi İlçesi Belençal-Kızılliler-Obruk-Sarpınar Gr Ky BSK İşinde Kullanılmak Üzere İş Makinası Kiralanması Hiz Alım İşleri	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	169.920,00	0,00	169.920,00	100,00	Bitti
81	Doğanyurt İlçesi Düzağaç-Düz Köyü Ky. PMT ve BSK Yapım İşleri	08	21 B Maddesi	Yapım	983.530,00	0,00	643.369,87	100,00	Bitti
82	Hanönü İlçesi Yukarı Çakırçay Köy Yolu Trafik Bilgi ve İşaret Levhaları İşleri	05	21 F Maddesi	Mal Alımı	18.897,82	0,00	18.897,82	100,00	Bitti
83	Merkez Subaşı, Şeyh, Dere, Kurtgömeç, Ahmetbey, Arız, Şadibey Ky PMT ve BSK İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinası Kiralanması	05	21 F Maddesi	Hizmet Alımı	221.840,00	0,00	0,00	100,00	Bitti
TOPLAM					137.164.554,52	2.956.776,74	78.206.526,71	86,39	

**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Kapsamında 83 ihale yapılmış olup, 66 tanesi bitirilmiş, 16 tanesi devam ediyor, 1 tanesi fesh edilmiş ve bu işler için toplam 78.206.526,71 TL harcama yapılmıştır.**







## Akkaya - BSK Çalışması





## Taşköprü Donalar - BSK Çalışması



## Seydiler Aliğa Kepez- BSK Çalışması





## Daday Arabacılar PMT Çalışması



## Ağlı – Oluközü BSK Çalışması





**Akdoğan – Karaş Grup Köy Yolu**



## Taşköprü Köçekli Grup Köy Yolu - BSK



**Yolkonak Karadere Grup Köy Yolu**

**Kuzyaka Parmaklıtürbe Grup Köy Yolu**





## Merkez Aksinir BSK

80



## Merkez Gökçekent BSK



## Taşköprü Akdoğan





**Gömeç BSK**



**Halaçlı BSK**



**Hocavakıf BSK**



**Kurusaray BSK**



**Ortaboğaz Oğul BSK**



**Devrekani Şenlik Berendi BSK**







Taşköprü Çoroğlu BSK





## Doğanyurt Düzağaç Düzköy Köy Yolu BSK



## İhsangazi Kızıleller Belençal BSK





## Devrekani Contay BSK



**Abana Beton Yol**



## Şenpazar Salman Kızılcasu





**Ilgaz Yurduntepe Geo Duvar Yol Çalışmaları**



## Ilgaz Yurduntepe Geo Duvar Yol Çalışmaları







**Ilgaz Yurduntepe Turizm Yolu - Geo Sentetik Donatılı Duvar - Uzunluk: 110 mt Yükseklik:12 mt.**



**Ilgaz Yurduntepe Turizm Yolu - Geo Sentetik Donatılı Duvar - Uzunluk: 110 mt Yükseklik:13 mt.**





**Ilgaz Yurduntepe Turizm Yolu - Geo Sentetik Donatılı Duvar - Uzunluk: 110 mt Yükseklik:13 mt.**



**Ilgaz Yurduntepe Turizm Yolu - Geo Sentetik Donatılı Duvar - Uzunluk: 200 mt Yükseklik:25 mt.**



## Azdavay Dereyücek Saray Konkasör Çalışması



## Çatalzeytin Paşalı - Konkasör Çalışması





## Taşköprü Donalar Konkasör Çalışması



Tosya Çaybaşı - Konkasör Çalışması





## 2- Performans Sonuçları Tablosu

BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması.	1.2.	1.1.2.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Temizlik işleri ve diğer hizmetlerde çalıştırılmak üzere 182 kişinin istihdam edilmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Belirli süreli personel hizmet alımı yoluyla eksik personel ihtiyacının karşılanması (Köy – Aş.)	Belirli süreli personel hizmet alımı yoluyla eksik personel ihtiyacının karşılanması (Köy – Aş.)	%100,00
<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	
182	182	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
<b>5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)</b>	<b>8 (TAHSİSLE GELEN PARA)</b>	
-	8.055.116,30	
<b>SONUÇ</b>		
Valilik, İdaremiz Hizmet binaları ve kampus alanları temizlik işleri ve diğer hizmetlerde çalıştırılan (Köy – Aş.) Şirketinde yüz seksen iki personel çalıştırılmıştır.		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
3.: Kırsal Kesim Çöp Toplama İşlerinde Çalıştırılmak Üzere Şoför ve Düz İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı	3.1. Kırsal Kesimde oluşan evsel atıkların doğaya zarar vermesini engellemek, çevre kirliliğini azaltmak ve halk sağlığını korumak.	3.1.3.
<b>AÇIKLAMA</b>		
696 sayılı KHK gereği 2 Nisanda iş fesh edilerek 2018 tarihi itibarıyla çalışanlar il özel idaresine ait şirket KÖYAŞ'a devredildi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kırsal kesim çöp Toplama İşlerinde Çalıştırılmak Üzere Şoför ve Düz İşçi Çalıştırılması Hizmet Alımı	Proje devredildiği için tamamlanamadı.	%100
<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	
6 düz işçi, 3 şoför	6 düz işçi, 3 şoför	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
<b>5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)</b>	<b>8 (TAHSİSLE GELEN PARA)</b>	
1.181.836,89	0	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		



BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
3.: 800 Litre Kapasiteli 360 Adet Galvenizli Metal Çöp Konteyner Alımı	3.1.: Merkez İlçe ve Kırsal Kesimlerde Katı Atık ve Çöplerin Toplanması Kolaylaştırmak.	3.1.6.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Tüm merkez ilçeler ve kırsal kesimde çevre temizliğini sağlamak amacıyla ulaşılabilir çöp konteyneri sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
800 Litre Kapasiteli 360 Adet Galvenizli Metal Çöp Konteyner Alımının sağlanması	Çöp konteynerleri temin edilip dağıtımı yapılmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edildi.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
800 Litre Kapasiteli 360 Adet Çöp Konteyneri	800 Litre Kapasiteli 360 Adet Çöp Konteyneri	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
235.764,00	0	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
3.: 6 Kg kkt Yangın Söndürme Tüpü Alımı	3.1: Kırsal Kesimlerde Yangın Tüplerinin Hazırda Bulunması	3.1.7.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Merkeze bağlı tüm ilçe ve köylerde yangın tüpü bulunmasını ve oluşabilecek zararın en aza inmesini sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
6 kg 1000 Adet Yangın Tüpü dağıtımı sağlandı.	Yangın tüplerinin alım işi tamamlanmış olup dağıtımı yapıldı.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
6 kg 1000 Adet Yangın Tüpü	6 kg 1000 Adet Yangın Tüpü	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
87.320,00	0	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		



BİRİM ADI : SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
4	4.1	4.1.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
İlimizin tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
2018 yılında 15 adet köy ve ünitelerin sağlıklı, temiz ve içilebilir suya kavuşmasını sağlamak.	2018 yılında 21 adet köy ve ünitelerin sağlıklı, temiz ve içilebilir suya kavuşması sağlanmıştır.	%140
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
15 ad	21 ad	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
4.413.971,97	0,00	
<b>SONUÇ</b>		
21 adet içmesuyu tamamlandı.		

BİRİM ADI : SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
4	4.2	4.2.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması için altyapı çalışmalarının yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
2018 yılında 8 adet köy ve ünitelerin evsel nitelikli atıkların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak.	2018 yılında 20 adet köy ve ünitelerin evsel nitelikli atıkların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması sağlanmıştır.	%250
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
8 ad	20 ad	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
1.562.655,79	57.840,82	
<b>SONUÇ</b>		
20 adet kanalizasyon inşaatı tamamlandı.		



BİRİM ADI : SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
4	4.3	4.3.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılması, geliştirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
2018 yılında 8 adet köy ve ünitelerin su kaynaklarının en ekonomik şekilde sulama işlerinde kullanılmasını sağlamak.	2018 yılında 11 adet köy ve ünitelerin su kaynaklarının en ekonomik şekilde sulama işlerinde kullanılmasını sağlamıştır.	%138
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
8 ad	11 ad	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
1.532.353,17	0,00	
<b>SONUÇ</b>		
11 adet sulama suyu inşaatı tamamlandı. 1 Adet gerçekleşmedi.		

BİRİM ADI : SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
4	4.4	4.4.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
Suyu yeterli olmayan veya küresel ısınmadan ve yer altı faaliyetlerinden dolayı suları yetersiz konuma düşen köy ve ünitelerde baraj ve göletlerden sulama imkanı olmayan tarla ve araziler için sulama amaçlı su temin edilmesinin sağlanması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
2018 yılında 2 adet köy ve ünitelerin sondaj çalışmalarını yaparak yer altından su temin edilmesini sağlamak.	2018 yılında 10 adet köy ve ünitelerin sondaj çalışmalarını yaparak yer altından su temini sağlamıştır.	% 500
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
2 ad	10 ad	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
96.972,40	0,00	
<b>SONUÇ</b>		
10 adet sondaj tamamlandı		

BİRİM ADI : SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
4	4.5	4.5.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında tahlil ve analiz yapmak, bu konuda çiftçilerimizi bilgilendirerek bölgede ekonomik ve en yüksek verim alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalara önem verilecektir.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında tahlil ve analizlerin yapılmasını sağlamak.	277 Adet İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile 1217 Adet toprak analizleri konularında tahlil ve analizlerin yapılması sağlanmıştır.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1494	1494	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
19.736,62	0,00	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı. (Gösterge birimi bölümünde, yıl içerisinde gelecek talepler öngörülememektedir. Gelen talepler doğrultusunda yapılan işlem baz alınmıştır.)		

BİRİM ADI : İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
STRATEJİK AMAÇ 5: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.	HEDEF 5.1 : Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.	5.1.1 23.01.2008 yılında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan Sınop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Gökçöy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Gökçöy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	İdaremizden ve Tarım İl Müdürlüğünden görevlendirilecek ikişer adet teknik personeller tarafından Toprak Koruma Kurulu'na sunulmak üzere İmar Planı Sınırları hakkında rapor hazırlanacak.	%20
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 ad.	1 ad.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	-	
<b>SONUÇ</b>		
Devam Ediyor		



BİRİM ADI : İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
STRATEJİK AMAÇ 5: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.	HEDEF 5.1 : Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.	5.1.3 Kastamonu Taşköprü Alatarla Köyü'nde düzensiz yapılaşmaların önlenmesi adına alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Alatarla Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması	Plan inceleme aşamasında.	80%
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 Ad.	1 Ad.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	-	
<b>SONUÇ</b>		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
STRATEJİK AMAÇ 5: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.	HEDEF 5.1 : Mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması.	5.1.4 Kastamonu Araç İğdir Köyü'nde düzensiz yapılaşmaların önlenmesi adına alt ölçekli imar planlarının üretilmesi.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kastamonu İli, Araç İlçesi, İğdir Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kastamonu İli, Araç İlçesi, İğdir Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılması.	Hazırlanan İmar Planları İdaremize sunuldu. İnceleme sonrası firmadan revize yapılması istendi.	%80
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 Ad.	1 Ad.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	-	
<b>SONUÇ</b>		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
STRATEJİK AMAÇ 5: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.	HEDEF 5.2 : Kırsal yerleşim alanlarında düzenli yapılaşmalar oluşturulabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili meri mevzuat kapsamında gerekli sınırlandırmaların yapılması, özendirici uygulamaların teşvik edilmesi ve düzensiz yapılaşmaların önüne geçmek adına caydırıcı önlemlerin alınması.	5.2.1 Kastamonu genelinde yer alan 1065 kırsal yerleşim alanından 287'sinin köy yerleşik alan sınırları belirlenmiş olup, geri kalan köylerin de köy yerleşik alan sınırlarının ivedilikle belirlenmesi.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kastamonu Merkez ve İlçelerine bağlı olan 274 adet köyün imar mevzuatına uygun olarak köy yerleşik alan tespitlerinin yaptırılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kastamonu Merkez ve İlçelerine bağlı olan 274 adet köyün imar mevzuatına uygun olarak köy yerleşik alan tespitlerinin yaptırılması.	Onaylandı.	100%
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
274 ad.	274 ad.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
138.712,54	-	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı		

BİRİM ADI : İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
STRATEJİK AMAÇ 5: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.	HEDEF 5.2 : Kırsal yerleşim alanlarında düzenli yapılaşmalar oluşturulabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili meri mevzuat kapsamında gerekli sınırlandırmaların yapılması, özendirici uygulamaların teşvik edilmesi ve düzensiz yapılaşmaların önüne geçmek adına caydırıcı önlemlerin alınması.	5.2.2 Plansız ve projersiz yapılaşmayı engellemek adına tip yapı projeleri oluşturarak kırsal yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların yönlendirilmesi.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kastamonu İli Kırsal Yerleşim Alanlarında Kullanılmak Üzere Tip Projeler Hazırlanması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kastamonu İli Kırsal Yerleşim Alanlarında Kullanılmak Üzere Tip Projeler Hazırlanması.	Onaylandı.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 takım	1 takım	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
56.368,60		
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		



BİRİM ADI : İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
STRATEJİK AMAÇ 5: İl Özel İdaresinin yetkili olduğu alanlarda; sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu olarak mekânsal gelişmeyi yönlendirecek yaşam kalitesini yükseltecek üst ve alt ölçekli imar planlarının yapılması ve uygulanmasının sağlanması, düzenli yerleşmeler oluşturabilmek adına önleyici tedbirlerin alınması ve kaçak yapılaşmalar ile mücadele edilmesi, tarihi kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması aşamasında taşınmaz kültür varlıklarının korunması.	HEDEF 5.2 : Kırsal yerleşim alanlarında düzenli yapılaşmalar oluşturulabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili meri mevzuat kapsamında gerekli sınırlandırmaların yapılması, özendirici uygulamaların teşvik edilmesi ve düzensiz yapılaşmaların önüne geçmek adına caydırıcı önlemlerin alınması.	5.2.3 Plansız ve projersiz yapılaşmayı engellemek adına tip yapı projeleri oluşturularak kırsal yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların yönlendirilmesi.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Tosya İlçesi Kösen Köyü ile ilgili çalışma devam etmektedir.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kastamonu İli Kırsal Yerleşim Alanlarında Köy Yerleşim Planı Yaptırılması.	Yüklenici tarafından hazırlanan planlar incelendi. Onay süreci devam ediyor.	80%
<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	
1 Ad.	1 Ad.	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
<b>5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)</b>	<b>8 (TAHSİSLE GELEN PARA)</b>	
5.817,40	-	
<b>SONUÇ</b>		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
6	6.1	6.1.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Köy yolu ağıımızda asfalt olarak yapımı planlanan toplam 2.833 km. hedefine ulaşmak için, 2018 yılında toplam 50 km. 1.Kat Asfalt sathi kaplamanın yapılması	2018 yılı içerisinde 65,25 km. yolun sathi kaplaması gerçekleştirildi.	%130
<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	
50 km	65,25 km	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
<b>5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)</b>	<b>8 (TAHSİSLE GELEN PARA)</b>	
393.495,00	2.527.040,97	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		

BİRİM ADI : YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
6	6.1	6.1.2
<b>AÇIKLAMA</b>		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için 2018 yılında 300 km. 2.kat asfalt yapılarak asfalt yolların yenilenmesi sağlanması.	2018 yılı içerisinde 145,50 km yolun 2.kat asfalt kaplaması tamamlanmıştır.	%48
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
300 km	145,5 km	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
363.243,00	3.004.186,64	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		

BİRİM ADI : YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
6	6.1	6.1.3
<b>AÇIKLAMA</b>		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Köyollarımızdan stratejik öneme sahip trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği ünite sayısı yüksek olanlardan başlamak üzere 2018 yılında 100 km Sıcak Karışım (BSK) uygulamasının gerçekleştirilmesi	2018 yılı içerisinde 121,15 km. Sıcak Karışım (BSK) uygulaması gerçekleştirilmiştir.	%121
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
100 km.	121,15 km.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
40.788.774,78	9.097.264,51	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		



BİRİM ADI : YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
6	6.1	6.1.4
<b>AÇIKLAMA</b>		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Asfalt kaplamalı köy yollarının 2018 yılında 20.000 ton roadmix malzeme ile bakım ve onarım (Yama-Malzemeli bakım- Greyderli bakım) çalışmalarının gerçekleştirilmesi.	2018 yılı içerisinde 32.500 ton roadmix malzeme ile köy yollarımızın bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.	%163
<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	
20.000 ton	32.500 ton	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
<b>5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)</b>	<b>8 (TAHSİSLE GELEN PARA)</b>	
1.370.330,22	5.991.573,00	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		

BİRİM ADI : YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
6	6.1	6.1.5
<b>AÇIKLAMA</b>		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Tüm köy yollarımızdaki sanat yapıları ihtiyacının karşılanabilmesi için 2018 yılında 5 adet İstinat duvarı (70 mt), 10 adet Kutu menfez (100 mt) yapımı ve 1.500 mt HDPE Koruge boru alımının gerçekleştirilmesi	2018 yılı içerisinde 4 adet Köprü (47 Mt)- 19 adet Kutu Menfez (211,20 mt) - 10 adet İstinat Duvarı (493,64 mt) Yapımı -1.728 mt HDPE Koruge Boru - 832 mt Beton Büz ve 915 mt Beton Yol Korkuluğu alımı gerçekleştirilmiştir.	%200
<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	
5 adet İstinat duvarı (70 mt) 10 adet Kutu menfez (100 mt) ve 1.500 mt HDPE Koruge Boru	4 adet Köprü (47 mt) - 10 adet İstinat Duvarı (498,64 mt) - 19 adet Kutu Menfez (211,20 mt) - 1.728 mt HDPE Koruge Boru - 832 mt beton büz ve 915 mt Beton Yol Korkuluğu	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
<b>5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)</b>	<b>8 (TAHSİSLE GELEN PARA)</b>	
2.214.473,75	0,00	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		

BİRİM ADI : YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
6	6.1	6.1.6
<b>AÇIKLAMA</b>		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Asfalt Sathi kaplamalı yolların 2018 yılında 500 km.yolun trafik uyarı ve işaret levhaları konularak yollarda trafik güvenliğinin sağlanması.	2018 yılı içerisinde BSK yapılan köy yollarının 80,40 km. kısmına Trafik uyarı ve işaret levhaları konulmuştur.	%16
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
500 km.	80,40 km	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
279.105,52	0,00	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		

BİRİM ADI : YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
6	6.1	6.1.7
<b>AÇIKLAMA</b>		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için 2018 yılı için 20 kişi destek personeli hizmet alımının gerçekleştirilmesi	2018 yılında şirket personelleri idareimiz bünyesinde KÖYAŞ şirketine 25 işçi personel devredilmiş olup KÖYAŞ bünyesinde çalıştırılmıştır.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
20 kişi	25 kişi	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
300.000,00	-	
<b>SONUÇ</b>		
Ödenek Aktarıldı. / Tamamlandı.		



BİRİM ADI : YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
6	6.1	6.1.8
<b>AÇIKLAMA</b>		
Hizmet alanımızda yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
2018 yılında hizmet alanımızda yer alan köy meydan ve yollarında 5.263 m2 beton parke kaplama yapılması	2018 yılında hizmet alanımızda yer alan köy meydan ve yollarında 16.220 m2 beton parke kaplama yapılması	%308
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
5.263 m2	16.220 m2	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
250.928,55	-	
<b>SONUÇ</b>		
Devam Ediyor.		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.1.	7.1.1.
<b>AÇIKLAMA</b>		
İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana Doğa Parkı yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi.	%0
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	-	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0	0	
<b>SONUÇ</b>		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.1.	7.1.2.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Doğa Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Doğa Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması	Doğa Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 adet proje	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
517.250,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Tamamlandı		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.1.	7.1.5.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kent Tarihi Müzesi Yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kent Tarihi Müzesi Yapılması	Kent Tarihi Müzesi Yapılması	%0
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 adet proje	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi-projeleri tamamlandı. Yapım ihalesi çalışmalarını devam ediyor.		



BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.1.	7.1.6.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Özelci Konağının restorasyonunun yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	Özelci Konağının restorasyonunun yapılması	%0
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 adet proje	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0	
<b>SONUÇ</b>		
Gerçekleşmedi - (Projeleri tamamlandı. Yapım ihalesi çalışmaları devam ediyor.)		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.1.	7.1.7.
<b>AÇIKLAMA</b>		
İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.	%35
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 adet proje	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
1.758.924,20 ₺	0	
<b>SONUÇ</b>		
Devam ediyor.		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.1.	7.1.8.
<b>AÇIKLAMA</b>		
İstiklal Yolu Kapsamında Projeler Üretilmesi		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İstiklal Yolu Kapsamında Projeler Üretilmesi	İstiklal Yolu Kapsamında Projeler Üretilmesi	%0
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	-	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0	
<b>SONUÇ</b>		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.1.	7.1.9.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Ilgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin hizmete alınmasının sağlanması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Ilgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin hizmete alınmasının sağlanması	Ilgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin hizmete alınmasının sağlamak amacıyla 1 adet Gününbirlik Tesis ve 1 Adet Kafeteryanın Yapım işi	%20
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 adet proje	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
600.000,00 ₺	400.000,00 ₺	
<b>SONUÇ</b>		
Devam Ediyor		



BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.1.	7.1.10
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması	Kuzeykent Hasan Doğan Spor Tesislerinin yanındaki araziye yüzme havuzu, tenis kortu ve kondisyon salonu yapılması	%80
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	0	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	%80
0,00 ₺	0,00 ₺	
<b>SONUÇ</b>		
Devam Ediyor (Söz Konusu Projelerin Yapımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından yürütülmekte olup, proje dahilinde olan Yüzme Havuzu hizmete açılmıştır. )		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.2.	7.2.1.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı	Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 adet proje	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	%100
275.525,73 ₺	0	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.2.	7.2.2.
<b>AÇIKLAMA</b>		
İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	İl Genel Meclisi için yeni bina yapılması	%0
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	-	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0	0	
<b>SONUÇ</b>		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.2.	7.2.3.
<b>AÇIKLAMA</b>		
İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
200.000,00 ₺	0	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		



BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.2.	7.2.4.
<b>AÇIKLAMA</b>		
İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	%100
200.000,00 ₺	0	
SONUÇ		
Tamamlandı.		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.2.	7.2.5.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Vali Konağı Onarım İşi		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Vali Konağı Onarım İşi	Vali Konağı Onarım İşi	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	%100
150.000,00 ₺	0	
SONUÇ		
Tamamlandı.		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.2.	7.2.6.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kastamonu Taşköprü Kaymakam Evi yapım işi		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kastamonu Taşköprü Kaymakam Evi yapım işi	Kastamonu Taşköprü Kaymakam Evi yapım işi	%0
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0	
<b>SONUÇ</b>		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.3.	7.3.1.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Paydaş kuruluşumuz olan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	Paydaş kuruluşumuz olan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	%54
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
26 adet	4 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
19.995.684,48	65.680.731,38	
<b>SONUÇ</b>		
Paydaş kuruluşlarla yapılan işlerde tüm kaynak kullanımı ve proje inisiyatifleri kuruluşlarda olup kurumumuz ihale, kontrol ve kabul işlemlerinde bulunmaktadır. Yapılan işlerin hedefleri ve göstergeleri paydaş kuruluşlara aittir. 4 adet proje 2018 yılında tamamlanmıştır, 22 adeti yıllara sari olup 2019 yılında tamamlanacaktır.		



BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.3.	7.3.2.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Paydaş kuruluşumuz olan Sağlık Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	Paydaş kuruluşumuz olan Sağlık Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	%15
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
5 adet	0 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	8.058.000,00	
<b>SONUÇ</b>		
Paydaş kuruluşlarla yapılan işlerde tüm kaynak kullanımı ve proje inisiyatifleri kuruluşlarda olup kurumumuz ihale, kontrol ve kabul işlemlerinde bulunmaktadır. Yapılan işlerin hedefleri ve göstergeleri paydaş kuruluşlara aittir. 5 adet işe 2018 yılında başlanmış olup, yıllara sari olarak 2019 yılında tamamlanacaktır.		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.3.	7.3.3.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Paydaş kuruluşumuz olan Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	Paydaş kuruluşumuz olan Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	%67
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
3 adet	2 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
584.672,80	1.955.283,76	
<b>SONUÇ</b>		
Paydaş kuruluşlarla yapılan işlerde tüm kaynak kullanımı ve proje inisiyatifleri kuruluşlarda olup kurumumuz ihale, kontrol ve kabul işlemlerinde bulunmaktadır. Yapılan işlerin hedefleri ve göstergeleri paydaş kuruluşlara aittir. 2 adet proje tamamlanmıştır. 1 adet proje yıllara sari olup 2019 yılında tamamlanacaktır.		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.3.	7.3.4.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Paydaş kuruluşumuz olan Emniyet Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	Paydaş kuruluşumuz olan Emniyet Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
5 adet	5 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
150.000,00	3.568.473,23	
<b>SONUÇ</b>		
Paydaş kuruluşlarla yapılan işlerde tüm kaynak kullanımı ve proje inisiyatifleri kuruluşlarda olup kurumumuz ihale, kontrol ve kabul işlemlerinde bulunmaktadır. Yapılan işlerin hedefleri ve göstergeleri paydaş kuruluşlara aittir. 5 adeti 2018 yılında tamamlanmıştır.		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.3.	7.3.5.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Paydaş kuruluşumuz olan Jandarma Komutanlığı'nın projelerinin yapımına destek olmak.	Paydaş kuruluşumuz olan Jandarma Komutanlığı'nın projelerinin yapımına destek olmak.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
15 adet	15 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	2.951.086,20	
<b>SONUÇ</b>		
Paydaş kuruluşlarla yapılan işlerde tüm kaynak kullanımı ve proje inisiyatifleri kuruluşlarda olup kurumumuz ihale, kontrol ve kabul işlemlerinde bulunmaktadır. Yapılan işlerin hedefleri ve göstergeleri paydaş kuruluşlara aittir. 15 adet proje 2018 yılı içinde tamamlanmıştır.		



BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.3.	7.3.6.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Paydaş kuruluşumuz olan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	Paydaş kuruluşumuz olan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	%85
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	5.395.855,00	
<b>SONUÇ</b>		
Paydaş kuruluşlarla yapılan işlerde tüm kaynak kullanımı ve proje inisiyatifleri kuruluşlarda olup kurumumuz ihale, kontrol ve kabul işlemlerinde bulunmaktadır. Yapılan işlerin hedefleri ve göstergeleri paydaş kuruluşlara aittir. 1 Adet iş devam etmekte olup, bitmek üzeredir.		

BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
7.	7.3.	7.3.7.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Paydaş kuruluşlara ait ilimizde yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi, paydaş kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde çalışmaların sürdürülmesi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen projelerinin yapımlarını gerçekleştirmek.	İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen projelerinin yapımlarını gerçekleştirmek.	100%
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
1.758.924,20	4.789.882,75	
<b>SONUÇ</b>		
İçişleri Bakanlığı tarafından ödenekleri gönderilen iş tamamlandı. (112 Acil Çağrı Merkezi)		

BİRİM ADI : PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
8.	8.1.	8.1.1.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Şehirle bitişik Toklutepe ormanlık bölgesi içerisinde gezi alanları, spor tesisleri, kafeterya vb. tesisleri bulunan, ayrıca evcil ve yaban hayvanlarının barınmasına imkan verecek bölümler oluşturarak şehir içinden ve dışarıdan gelenlerin hoşça vakit geçirerek dinlenebilecekleri, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak bir tesisin ilimize kazandırılması. Öncelikle söz konusu alanın genişletilmesi için imkan dahilinde gerekli kamulaştırma işleminin yapılması, halihazır durumda ilgili etüt çalışmaları ve yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Şehirle bitişik Toklutepe ormanlık bölgesi içerisinde gezi alanları, spor tesisleri, kafeterya vb. tesisleri bulunan, ayrıca evcil ve yaban hayvanlarının barınmasına imkan verecek bölümler oluşturarak şehir içinden ve dışarıdan gelenlerin hoşça vakit geçirerek dinlenebilecekleri, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak bir tesisin ilimize kazandırılması. Öncelikle söz konusu alanın genişletilmesi için imkan dahilinde gerekli kamulaştırma işleminin yapılması, halihazır durumda ilgili etüt çalışmaları ve yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması.	Şehirle bitişik Toklutepe ormanlık bölgesi içerisinde gezi alanları, spor tesisleri, kafeterya vb. tesisleri bulunan, ayrıca evcil ve yaban hayvanlarının barınmasına imkan verecek bölümler oluşturarak şehir içinden ve dışarıdan gelenlerin hoşça vakit geçirerek dinlenebilecekleri, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak bir tesisin ilimize kazandırılması. Öncelikle söz konusu alanın genişletilmesi için imkan dahilinde gerekli kamulaştırma işleminin yapılması, halihazır durumda ilgili etüt çalışmaları ve yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması.	%25
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	-	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
250.000,00 TL	0,00	
<b>SONUÇ</b>		
Halihazır çalışması, 2B çalışmaları ve Tescil İşlemleri Yapıldı.		

BİRİM ADI : PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
8.	8.1.	8.1.2.
<b>AÇIKLAMA</b>		
Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesislerin yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesislerin yapılması.	Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesislerin yapılması.	
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 adet proje	%100
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
44.304,66 TL	-	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı.		
(Doğa Kültür Köyü Spor Salonu,Zemin Etüt Raporu, Mimari Proje ve Kapalı Spor Salonu Statik, Mekanik, Elektrik projeleri yapılmıştır.)		



BİRİM ADI : PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
8.	8.3.	8.3.1.
<b>AÇIKLAMA</b>		
İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması.	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 adet proje	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
48.046,00 TL	-	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı(Vedat Tek Yanı Lojmanı Deprem Risk Analizi )		

BİRİM ADI : PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
8.	8.3.	8.3.2.
<b>AÇIKLAMA</b>		
İl Özel İdaresine ait Tescilli Taşınmazların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proj. Hazırlanması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İl Özel İdaresine ait Tescilli Taşınmazların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proj. Hazırlanması.	İl Özel İdaresine ait Tescilli Taşınmazların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proj. Hazırlanması.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet proje	1 Adet Proje	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
70.000,00 TL	-	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı. (Özel İdare Konağı Projelendirme İşi)		

BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
9.	9.1.	9.1.1.
<b>AÇIKLAMA</b>		
3213 Sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre Kamu Kurum ve kuruluşları ile İdaremiz adına yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde gerekli olan Hammadde Üretim İzin Belgelerinin düzenlenmesi, İdaremiz adına olan Hammadde üretim izin sahalarına ait ÇED ve Orman izinlerinin alınması, Belediye mücavir sahası dışında kalan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması denetlenmesi, jeotermal kaynak ruhsat talepleri ile su kullanım hakkı izinleri.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İdaremize ait I(a) ve II(A) Grubu Hammadde üretim izin sahaları, 1(a) grubu maden sahaları, sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsat taleplerinin incelenmesi, denetimlerinin yıl içerisinde en az bir defa gerçekleştirilmesi, Çed ve Orman izinleri alınması,	İdaremize ait I(a) ve II(A) Grubu Hammadde üretim izin sahaları, 1(a) grubu maden sahaları, sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsat taleplerinin incelenmesi, denetimlerinin yıl içerisinde en az bir defa gerçekleştirilmesi, Çed ve Orman izinleri alınması,	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
7	7	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
117.320,19	0	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı		

BİRİM ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
10	10.1	10.1.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin yerine getirilmesi		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
20 Kişisi hizmet alımından karşılanan personel olmak üzere halen 46 personel ile yürütülmekte olan Koruma ve Güvenlik hizmetinin eksiksiz yapılabilmesi için gerekli hizmet alımı çalışmalarının gerçekleştirilmesi.	01.01.2018-01.04-2018 tarihleri arası (3 ay 1 gün) Güvenlik ve Koruma hizmeti için Hizmet alımından 20 kişilik Güvenlik Personeli alınarak güvenlik hizmeti gerçekleştirilmiştir.	100%
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
20 kişi	20 Kişi	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
1.240,00	-	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı		



BİRİM ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
10	10.2	10.2.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
Sosyal Tesislerden konaklama ya da yemek hizmeti için yararlanan personel veya misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması için gerekli tedbirlerin alınması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
"2018 yılında Sosyal Tesislerimizde ömrünü doldurmuş bulunan 5 adet çamaşır makinası,3 adet çamaşır kurutma makinası,4 adet mini buzdolabı,1 adet büyük boy buzdolabı alımına ihtiyaç duyulmaktadır."	İdaremize ait Sosyal Tesislerde (Misafirhanede) hizmetin daha iyi verilmesi için mevcut bulunan ömrünü doldurmuş demirbaş eşyalardan alım işi gerçekleştirilmemiştir.	% 20
<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	
-	-	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
<b>5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)</b>	<b>8 (TAHSİSLE GELEN PARA)</b>	
30.000,00		
<b>SONUÇ</b>		
(Söz konusu Demirbaşlardan 2 Adet Çamaşır Makinesi B Sosyal Tesisi Bütçesinden Alınmıştır. )		

BİRİM ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
10	10.3	10.3.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İdare Binaları ve Eklentilerinde park bahçe işlerinin ve temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi için 2018 yılında 1 adet traktör tipi çim biçme makinası alımı yapılması düşünülmektedir.	İdare Binaları ve Eklentilerinde park bahçe işlerinin ve temizlik hizmetlerinin sürdürülmesi için 2018 yılında 1 adet traktör tipi çim biçme makinası alımı yapılmadı	%0
<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	<b>GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)</b>	
-	-	
<b>FİNANSMAN TİPİ</b>		
<b>5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)</b>	<b>8 (TAHSİSLE GELEN PARA)</b>	
30.000,00	-	
<b>SONUÇ</b>		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
10	10.4	10.4.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
İdare Binaları ve Eklentilerinde çevre düzenlemesi yaptırılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İdare Binaları ve Eklentilerinde çevre düzenlemesi,süs bitkileri ile çiçek alımı ve dikiminin yaptırılması.	İdare Binaları ve Eklentilerinde çevre düzenlemesi, süs bitkileri ile çiçek alımı ve dikimi işi yaptırılmıştır.	%100
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
600 Adet Çiçek ve süs bitkisi	600 Adet Çiçek ve süs bitkisi	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
30.000,00		
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı		

BİRİM ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
10	10.5	10.5.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Makam Odası tefrişatının yaptırılması.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Makam Odası Tefrişatının yaptırılması.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Makam Odası tefrişatı için Makam odası Takımı( Sehpa Dolap Masa ),Makam Koltuğu, Tekli Misafir Koltuğu İkili koltuk alımı işi gerçekleştirilmiştir.	100%
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet sehpa,1 adet dolap,1 adet masa1 adet makam koltuğu, 1 adet tekli misafir koltuğu, 1 adet ikili koltuk	1 adet sehpa,1 adet dolap,1 adet masa1 adet makam koltuğu, 1 adet tekli misafir koltuğu, 1 adet ikili koltuk	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
15.000,00	-	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı		



BİRİM ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
10	10.6	10.6.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
İdaremiz nizamiyelerinde kullanılmak üzere elbise dolabı, koltuk ve sandalye alımı işi		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İdaremiz nizamiyelerinde kullanılmak üzere elbise dolabı, koltuk ve sandalye alımı işinin yapılması.	İdaremiz nizamiyelerinde kullanılmak üzere elbise dolabı, koltuk ve sandalye alımı işi gerçekleştirilmiştir.	100%
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
1 adet 2 li dolap,15 adet çalışma misafir koltuğu,11 adet sandalye	1 adet 2 li dolap,15 adet çalışma misafir koltuğu,11 adet sandalye	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
15.000,00	-	
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı		

BİRİM ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2018
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET NUMARASI
10	10.7	10.7.1
<b>AÇIKLAMA</b>		
İdaremiz A Sosyal Tesislerinde kullanılmak üzere doğalgaz yüklemesi alımı işi.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI	PERFORMANS GÖSTERGESİ	% ..... FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
İdaremiz A Sosyal Tesislerinde kullanılmak üzere doğalgaz yüklemesi alımı işinin yapılması.	Program dışı olarak İdaremiz A Sosyal Tesislerinde kullanılmak üzere doğalgaz yüklemesi alımı işi gerçekleştirilmiştir.	100%
GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	GÖSTERGE BİRİMİ (adet km.vb.)	
13.000,00 TL lik Doğalgaz yüklemesi.	13.000,00 TL lik Doğalgaz yüklemesi	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
30.000,00		
<b>SONUÇ</b>		
Tamamlandı		

### 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

#### PROJE BAZINDA PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Sıra No	Stratejik Amaç	Perf. No	Birim Adı	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma %
1	1	1.1.2.	İnsan Kaynakları Eğitim Md.	182	182	%100
2	3	3.1.3.	Destek Hizmetleri Md.	6 Düz İşçi, 3 Şoför	6 Düz İşçi, 3 Şoför	%100
3	3	3.1.6.	Destek Hizmetleri Md.	800 Litre Kapasiteli 360 Adet Çöp Konteyneri	800 Litre Kapasiteli 360 Adet Çöp Konteyneri	%100
4	3	3.1.7.	Destek Hizmetleri Md.	6 kg 1000 Adet Yangın Tüpü dağıtımını sağlandı.	6 kg 1000 Adet Yangın Tüpü dağıtımını sağlandı.	%100
5	4	4.1.1.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	15	21	% 140
6	4	4.2.1.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	8	20	% 250
7	4	4.3.1.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	8	11	% 138
8	4	4.4.1.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	2	10	% 500
9	4	4.5.1.	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	1494	1494	% 100
10	5	5.2.3.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	1 ad.	1 ad.	%80
11	5	5.2.2.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	1 tk	1 tk	%100
12	5	5.2.1.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	274 ad.	274 ad.	%100
13	5	5.1.1.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	1 ad.	1 ad.	%20
14	5	5.1.4.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	1 ad.	1 ad.	%80
15	5	5.1.3.	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.	1 ad.	1 ad.	%80
16	6	6.1.1.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	50 km.	65,25 km	%130
17	6	6.1.2.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	300 km	145,5 km.	% 48
18	6	6.1.3.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	100 km	121,15	% 121
19	6	6.1.4.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	20.000 ton	32.000 ton	% 163
20	6	6.1.5.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	5 adet İstinat duvarı (70 mt) 10 adet Kutu menfez (100 mt) ve 1.500 mt HDPE Koruge Boru	4 adet Köprü (47 mt) - 10 adet İstinat Duvarı (498,64 mt) - 19 adet Kutu Menfez (211,20 mt) - 1.728 mt HDPE Koruge Boru - 832 mt beton büz ve 915 mt Beton Yol Korkuluğu	%200
21	6	6.1.6.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	500 km.	80,40 km.	%16
22	6	6.1.7.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	20 kişi	25 kişi	%100
23	6	6.1.8.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.	5.263 m2	16.220 m2	%308
24	7	7.1.1.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	-	%0
25	7	7.1.2.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	1 proje	%100
26	7	7.1.5.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	-	% 0
27	7	7.1.6.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	-	% 0



Sıra No	Stratejik Amaç	Perf. No	Birim Adı	Hedef	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedefe Ulaşma %
28	7	7.1.7.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	1 proje	% 35
29	7	7.1.8.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	-	% 0
30	7	7.1.9.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	1 proje	% 20
31	7	7.1.10	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	1 proje	% 80
32	7	7.2.1.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	1 proje	% 100
33	7	7.2.2.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	-	% 0
34	7	7.2.3.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	1 proje	% 100
35	7	7.2.4.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 proje	1 proje	% 100
36	7	7.2.5.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 Adet	1 Adet	% 100
37	7	7.2.6.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 Adet	-	% 0
38	7	7.3.1.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	26 Adet	4 Adet	% 54
39	7	7.3.2.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	5 Adet	-	% 15
40	7	7.3.3.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	3 Adet	2 Adet	% 67
41	7	7.3.4.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	5 Adet	5 Adet	% 100
42	7	7.3.5.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	15 Adet	15 Adet	% 100
43	7	7.3.6.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1 Adet	-	% 85
44	7	7.3.7.	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	2 Adet	2 Adet	% 100
45	8	8.1.1.	Plan - Proje Müdürlüğü	1 Adet Proje	-	% 25
46	8	8.1.2.	Plan - Proje Müdürlüğü	1 Adet Proje	1 Adet Proje	% 100
47	8	8.3.1.	Plan - Proje Müdürlüğü	2 Adet Proje	2 Adet Proje	% 100
48	8	8.3.2.	Plan - Proje Müdürlüğü	1 Adet Proje	-	%100
49	9	9.1.1.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	7	7	% 100
50	10	10.1.1.	Kültür ve Sosyal İşler Md.	20 kişi	20 kişi	% 100
51	10	10.2.1.	Kültür ve Sosyal İşler Md.	4 Adet Proje	1 Adet Proje	%20
52	10	10.3.1.	Kültür ve Sosyal İşler Md.	-	-	% 0
53	10	10.4.1.	Kültür ve Sosyal İşler Md.	600 Adet çiçek ve Süs Bitkisi alımı ve dikimi	600 Adet çiçek ve Süs Bitkisi alımı ve dikimi	% 100
54	10	10.5.1.	Kültür ve Sosyal İşler Md.	1 adet sehpa,1 adet dolap,1 adet masa1 adet makam koltuğu, 1 adet tekli misafir koltuğu, 1 adet ikili koltuk	1 adet sehpa,1 adet dolap,1 adet masa1 adet makam koltuğu, 1 adet tekli misafir koltuğu, 1 adet ikili koltuk	% 100
55	10	10.6.1.	Kültür ve Sosyal İşler Md.	1 adet 2 li dolap,15 adet çalışma misafir koltuğu,11 adet sandalye	1 adet 2 li dolap,15 adet çalışma misafir koltuğu,11 adet sandalye	% 100
56	10	10.7.1.	Kültür ve Sosyal İşler Md.	13.000,00 tl. lik Doğalgaz Yüklemesi	13.000,00 tl. lik Doğalgaz Yüklemesi	% 100
<b>ORTALAMA ULAŞMA DERECEŚİ</b>						<b>%92</b>

## MALİ BAZDA PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Sıra No	Stratejik Amaç	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Finansman Tipi (5)	Finansman Tipi (8)	Toplam
1	1	1.1.2.	Personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması	-	8.055.116,30	8.055.116,30
2	2	2.4.8.	Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım (KASMİB)	69.999,65	0,00	69.999,65
3	2	2.4.9.	İlgaz Turizm Birliği	280.000,00	0,00	280.000,00
4	2	2.4.10.	İller Bankası Payı	1.489.477,71	0,00	1.489.477,71
5	2	2.4.11	Kalkınma Ajansları Payı	699.996,45	0,00	699.996,45
6	2	2.4.14	Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	0,00	0,00	0,00
7	2	2.4.7.	Okul Aile Birlikleri, Amatör Spor Kulüpleri vb. Yapılan Yardımlar	47.496,53	0,00	47.496,53
8	2	2.4.6.	Vilayetler Hizmet Birliği	699.997,00	0,00	699.997,00
9	2	2.4.12.	İdarenin Ortak Olduğu Şirketler	1.263.184,14	0,00	1.263.184,14
10	2	2.4.5.	KHGB'lere Yardım	3.384.239,33	0,00	3.384.239,33
11	3	3.1.3.	Kırsal kesim çöp toplama işlerinde kullanılmak üzere çalıştırılmak üzere şoför ve düz işçi çalıştırılması hizmet alımı	1.181.836,89		1.181.836,89
12	3	3.1.6.	800 Litre Kapasiteli 360 Adet Galvenizli Metal Çöp Konteyner Alımı	235.764,00	0,00	235.764,00
13	3	3.1.7.	6 kg. KKT Yangın Söndürme Tüpü Alımı	87.320,00	0,00	87.320,00
14	4	4.1.1.	İçmesuları Yapım Projeleri	4.413.971,37	0,00	4.413.971,37
15	4	4.2.1.	Kanalizasyon Yapım Projeleri	1.562.655,79	57.840,82	1.620.496,61
16	4	4.3.1.	Sulama Yapım Projeleri	1.532.353,17		1.532.353,17
17	4	4.4.1.	Sondaj Projeleri	96.972,40		96.972,40
18	4	4.5.1.	Laboratuvar Hizmetleri	19.736,62		19.736,62
19	5	5.2.3.	Plansız ve projersiz yapılaşmayı engellemek adına tip yapı projeleri oluşturarak kırsal yerleşim alanlarındaki yapılaşmaların yönlendirilmesi.	5.817,40		5.817,40
20	5	5.2.2.	Kırsal Yerleşim Alanlarında Kullanılmak Üzere Tip Projeler Hazırlanması	56.368,60		56.368,60
21	5	5.2.1.	Kastamonu Merkez ve İlçelerine bağlı olan 274 adet köyün imar mevzuatına uygun olarak köy yerleşik alan tespitlerinin yapılması.	138.712,54		138.712,54
22	6	6.1.1.	Asfalt programına alınan 65,25 km. yolun sathi kaplaması	393.495,00	2.527.040,97	2.920.535,97
23	6	6.1.2.	Asfalt programına alınan 145,50 km. 2.kat asfalt kaplama yapılarak yolların yenilenmesi işi	363.243,00	3.004.186,64	3.367.429,64
24	6	6.1.3.	121,15 Sıcak Karışım (BSK) Yapım İşleri	40.788.774,78	9.097.264,51	49.886.039,29
25	6	6.1.4.	32.500 ton Roadmix malzeme ile köy yollarımızın bakım onarım çalışmaları	1.370.330,22	5.991.573,00	7.361.903,22
26	6	6.1.5.	Köy yolları bakım onarım çalışmaları	2.214.473,75		2.214.473,75
27	6	6.1.6.	BSK yapılan köy yollarının 80,40 km.lik kısmına Trafik Uyarı ve İşaret levhaları konulması	279.105,52		279.105,52
28	6	6.1.7.	Destek Personeli Alımı	300.000,00		300.000,00
29	6	6.1.8.	16.220 m2 Beton Parke Kaplama Yapılması	250.928,55		250.928,55
30	7	7.1.2.	Doğa Kültür Köyü Kompleksi yatırımının tamamlanması	517.250,00		517.250,00
31	7	7.1.7.	İl Özel İdaresine ait Site İş Hanının yıkılarak yerine yenisinin yapılması.	1.758.924,20		1.758.924,20
32	7	7.1.9.	İlgaz Dağı Milli Parkında Yurduntepe Kayak Tesislerinin hizmete alınmasının sağlanması.	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
33	7	7.2.1.	Genel Sekreterlik bünyesindeki tüm şantiye binalarının bakım ve onarımı	275.525,73		275.525,73
34	7	7.2.3.	İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması	200.000,00		200.000,00
35	7	7.2.4.	İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması	200.000,00		200.000,00
36	7	7.2.5.	Vali Konağı Onarım İşleri	150.000,00		150.000,00
37	7	7.3.1.	Paydaş kuruluşumuz olan Millî Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	19.995.684,48	65.680.731,38	85.676.415,86



38	7	7.3.2.	Paydaş kuruluşumuz olan Sağlık Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.		8.058.000,00	8.058.000,00
39	7	7.3.3.	Paydaş kuruluşumuz olan Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	584.672,80	1.955.283,76	2.539.956,56
40	7	7.3.4.	Paydaş kuruluşumuz olan Emniyet Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.	150.000,00	3.568.473,23	3.718.473,23
41	7	7.3.5.	Paydaş kuruluşumuz olan Jandarma Komutanlığı'nın projelerine yapımına destek olmak.		2.951.086,20	2.951.086,20
42	7	7.3.6.	Paydaş kuruluşumuz olan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün projelerinin yapımına destek olmak.		5.395.855,00	5.395.855,00
43	7	7.3.7.	İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen projelerin yapımlarını gerçekleştirmek.	1.758.924,20	4.789.882,75	6.548.806,95
44	8	8.1.1.	Toklutepe ormanlık bölgesi içerisinde yapılması düşünülen bina ve tesislerin proje çalışmalarının yapılması	250.000,00		250.000,00
45	8	8.2.1.	Turizmi desteklemek için turizm amaçlı tesislerin yapılması	44.304,66		44.304,66
46	8	8.3.1.	İl Özel İdaresi hizmet binalarının iyileştirme proje çalışmalarının yapılması.	48.046,00		48.046,00
47	8	8.3.2.	İl Özel İdaresine ait Tescilli Taşınmazların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlanması	70.000,00		70.000,00
48	9	9.1.1.	Ruhsat ve Denetim Hizmetleri İş ve İşlemleri	117.320,19		117.320,19
49	10	10.1.1.	Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin yerine getirilmesi	1.240,00		1.240,00
50	10	10.2.1.	Sosyal Tesislerden konaklama yada yemek hizmeti için yararlanan personel veya misafirlerin uygun şartlarda ağırlanması için gerekli tedbirlerin alınması	30.000,00		30.000,00
51	10	10.3.1.	Park bahçe ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması	30.000,00		30.000,00
52	10	10.4.1.	Program dışı olarak İdare Binaları ve Eklentilerinde çevre düzenlemesi yaptırılması	30.000,00		30.000,00
53	10	10.5.1.	Program dışı olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Makam Odası tefrişatının yaptırılması.	15.000,00		15.000,00
54	10	10.6.1.	Program dışı olarak idaremiz nizamiyelerinde kullanılmak üzere elbise dolabı, koltuk ve sandalye alımı işi	15.000,00		15.000,00
55	10	10.7.1.	Program dışı olarak idaremiz A Sosyal Tesislerinde kullanılmak üzere doğal-gaz yüklemesi alımı işi	30.000,00		30.000,00
<b>TOPLAM</b>				<b>90.098.142,67</b>	<b>121.532.334,56</b>	<b>211.630.477,23</b>



## 5- DİĞER HUSUSLAR

## İL GENEL MECLİSİ İLÇELERE ve SİYASİ PARTİLERE GÖRE DURUM ÇİZELGESİ

T.C.  
KASTAMONU İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI  
SİYASİ PARTİ DAĞILIMI

31.12.2018

Sıra No.	İLÇESİ	ADI ve SOYADI	SİYASİ PARTİSİ
1.	MERKEZ	MEHMET KAYIKCI	BAĞIMSIZ
2.	"	MEHMET ATAŞ	AK PARTİ
3.	"	MEHMET BUTUR	AK PARTİ
4.	"	MEHMET ÇIVGIN	İYİ PARTİ
5.	"	HÜSNÜ DINGİLOĞLU	MHP
6.	ABANA	ZİYA EKER	AK PARTİ
7.	"	HASAN TIĞLI	CHP
8.	AĞLI	MEHMET SAİT YULU	AK PARTİ
9.	"	ÖNCAY ERSOY	AK PARTİ
10.	ARAÇ	HAMDİ BOZ	AK PARTİ
11.	"	SÜLEYMAN BAYIN	AK PARTİ
12.	AZDAVAY	FAHRETTİN CEBECİ	AK PARTİ
13.	"	SATI GÖKYURT	MHP
14.	BOZKURT	CEMALETTİN SARI	AK PARTİ
15.	"	İSMAİL GÖKSEL	MHP
16.	CİDE	MEVLÜT ERSİN	AK PARTİ
17.	"	İMRAN ATA	AK PARTİ
18.	ÇATALZEYTİN	BİROL BOZKURT	BAĞIMSIZ
19.	"	MEVLÜT KAPLAN	AK PARTİ
20.	DADAY	MEHMET APAYDIN	AK PARTİ
21.	"	ZİYA KABAKCI	AK PARTİ
22.	DEVREKANİ	HÜSEYİN TERYAKİ	AK PARTİ
23.	"	UĞUR AYDIN	MHP
24.	DOĞANYURT	HÜSEYİN YAVUZ	BAĞIMSIZ
25.	"	HAMDİ CESUR	AK PARTİ
26.	HANÖNÜ	DOĞAN AKKAYA	AK PARTİ
27.	"	METİN YAMALI	MHP
28.	İHSANGAZİ	NECMİ ALADAĞ	AK PARTİ
29.	"	İLHAN BOZAHMETOĞLU	MHP
30.	İNEBOLU	MEHMET KÖSEM	AK PARTİ
31.	"	ÖZDAL TAŞCI	AK PARTİ
32.	KÜRE	MUZAFFER GÜLSOY	AK PARTİ
33.	"	MUSTAFA CANBAZ	MHP
34.	PINARBAŞI	KAZIM GÜL	AK PARTİ
35.	"	YAVUZ GÖK	MHP
36.	SEYDİLER	SABRİ BAYRAMOĞLU	AK PARTİ
37.	"	CEVAT DEMİRCİ	MHP
38.	ŞENPAZAR	YAVUZ ÖZDEN	AK PARTİ
39.	"	ARİF KILIÇ	MHP
40.	TAŞKÖPRÜ	OSMAN İNCE	BAĞIMSIZ
41.	"	OSMAN BAYRAK	AK PARTİ
42.	"	SALİM DEĞİRMENCİ	MHP
43.	TOSYA	CAHİT ÇALIŞKAN	AK PARTİ
44.	"	İLYAS ÇAKIR	AK PARTİ
45.	"	YUSUF ARPACI	AK PARTİ

AK PARTİ : 29, MHP:10, CHP:1, İYİ PARTİ: 1, BAĞIMSIZ:4, TOPLAM:45



## İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

### MECLİS BAŞKANI

Mehmet KAYIKCI (Merkez)

### 1.BAŞKAN VEKİLİ

Mehmet ATAŞ ( Merkez)

### 2.BAŞKAN VEKİLİ

Sabri BAYRAMOĞLU ( Seydiler )

### ASIL DİVAN KATIPLERİ

1- Hamdi BOZ ( ARAÇ)

2- Cemalettin SARI (BOZKURT)

### YEDEK DİVAN KATIPLERİ

1-Mehmet APAYDIN (DADAY)

2-Öncay ERSOY (AĞLI)

### İL ENCÜMEN ÜYELERİ

1- Doğan AKKAYA (HANÖNÜ)

2- Muzaffer GÜLSOY (KÜRE)

3- Ziya EKER (ABANA)

### AK PARTİ GRUP BAŞKANI

Sabri BAYRAMOĞLU

### AK PARTİ GRUP BŞK.V

Hamdi BOZ

### GRUP SÖZCÜSÜ

Mehmet BUTUR

### MHP GRUP BAŞKANI

İlhan BOZAHMETOĞLU

### MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ

Hüsnü DINGİLOĞLU

### GRUP SÖZCÜSÜ

Salim DEĞİRMENCİ

**İL GENEL MECLİSİ**  
**( 04.04.2018 3.BRL.)**  
**İHTİSAS KOMİSYONLARI LİSTESİ**

**5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU'NUN**  
**16.MADDESİ GEREĞİ ZORUNLU KURULMASI**  
**GEREKEN KOMİSYONLAR (4 ADET)**

**PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU (1)**

- 1- MEHMET ATAŞ (BAŞKAN)
- 2- ZİYA KABAKÇI (BAŞKAN YRD.)
- 3- ÖZDAL TAÇCI
- 4- FAHRETTİN CEBECİ
- 5- MUSTAFA CANBAZ
- 6- SATI GÖKYURT
- 7- MEHMET SAİT YULU

**İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU (2)**

- 1-SABRİ BAYRAMOĞLU (BAŞKAN)
- 2- MEVLÜT ERSİN (BAŞKAN YRD.)
- 3- İLYAS ÇAKIR
- 4- KAZIM GÜL
- 5- CEVAT DEMİRCİ
- 6- HÜSNÜ DINGİLOĞLU
- 7- OSMAN İNCE

**EĞİTİM, KÜLTÜR VE**  
**SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU (3)**

- 1- HAMDİ BOZ (BAŞKAN)
- 2 MEVLÜT KAPLAN (BAŞKAN YRD.)
- 3- İLHAN BOZAHMETOĞLU

**ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU(4)**

- 1- MEHMET BUTUR (BAŞKAN)
- 2- CAHİT ÇALIŞKAN (BAŞKAN YRD.)
- 3- YAVUZ GÖK

**İLAVE KURULAN KOMİSYONLAR (6 ADET)**

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU (5)**

- 1- MEHMET KÖSEM (BAŞKAN)
- 2- YAVUZ ÖZDEN (BAŞKAN YRD.)
- 3- İSMAİL GÖKSEL

**HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU (6)**

- 1- HÜSEYİN TERYAKİ (BAŞKAN)
- 2- MEHMET APAYDIN (BAŞKAN YRD.)
- 3- YAVUZ GÖK

**GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU(7)**

- 1- NECMİ ALADAĞ (BAŞKAN)
- 2- SÜLEYMAN BAYIN (BAŞKAN YRD.)
- 3- SALİM DEĞİRMENCİ

**ORMANI KORUMA VE KÖYLERE YÖNELİK**  
**HİZMET KOMİSYONU(8)**

- 1- YUSUF ARPACI (BAŞKAN)
- 2- ÖNCAY ERSOY (BAŞKAN YRD.)
- 3- METİN YAMALI

**AR-GE (ARAŞT. VE GELİŞ. KOM.)(9)**

- 1- HAMDİ CESUR (BAŞKAN)
- 2- CEMALETTİN SARI (BAŞKAN YRD.)
- 3- ARİF KILIÇ

**ESNAF SAN.TİC. DOĞAL KAY.KOM.(10)**

- 1- İMRAN ATA (BAŞKAN)
- 2- OSMAN BAYRAK (BAŞKAN YRD.)
- 3- ARİF KILIÇ

**İL ENCÜMENİ ÜYELERİ**

- 1- Muzaffer GÜLSOY
- 2 Doğan AKKAYA
- 3 Ziya EKER



## İL GENEL MECLİSİ ve ENCÜMENİ İL ENCÜMENİ



Yaşar KARADENİZ  
Kastamonu Valisi  
İl Encümeni Başkanı



Tahir Zafer KARAHASAN  
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri



Mehmet BEKAR  
Strateji Geliştirme Md. V.



S.Seda HORUZOĞLU  
İmar ve Kentsel İyileştirme Md. V.



Doğan AKKAYA  
Hanönü - Ak Parti  
0 535 694 65 58



Muzaffer GÜLSOY  
Küre - Ak Parti  
0 543 495 37 37



Ziya EKER  
Abana - Ak Parti  
0 532 355 57 73

## 2018 YILI MECLİS ÇALIŞMALARI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Performans planı, Bütçe, Faaliyet raporu, Kesin hesap, Stratejik plan, Taşınmaz tahsisi, Aktarma, Devirler, İptaller ve Çeşitli işler	44	401
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	Hammadde üretim izni, süre uzatımı	5	
İMAR VE KENTSEL İYİLİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	"İmar hizmetleri, Köy Yerleşik Alanları Mevzi İmar planları"	194	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Makine kiralama bedelleri, Hizmet aracı alımı, kredi kullanımı, çeşitli işler	3	
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Sözleşmeli avukat çalıştırılması, Norm kadro, Derece değişikliği, İşçi pozisyonları	2	
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	Seçimler, İlgili komisyon seçimleri, Mütevelli heyeti, Köy ve mahalle isim değişiklikleri, Çeşitli işler.	14	
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Toprak Su analizleri, İhtilaflı memba suları	7	GENEL TOPLAM
MECLİSCE KOMİSYONA HAVALE EDİLEN TEKLİFLER VE ÖNERGELER	Meclisce; çeşitli konularda komisyona havale edilen teklif ve önergeler	90	
KURUMLARA HAV.EDİLEN KOM.RAPORLARI	Meclisce; Önerge ve teklifler hakkında yapılan komisyon çalışmaları	35	
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Ödenek aktarma	7	

NOT:01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA

## 2018 YILI ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	Birliklere yardım, Taşınmaz satışı ve kiralamaları, Süre uzatımı, ihale kararları, Aktarmalar ve Çeşitli işler	129	681
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	Hammadde üretim izni, Süre uzatımı, 1 (a) Grubu (Kum - ariyet - çakıl) ruhsatları, Ruhsat para cezaları ve Çeşitli işler	27	
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	"İmar hizmetleri, Tevhit, İfraz, Yola terk, Cezalar ve Çeşitli işler"	506	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Taşıt ve iş makinesi satışı, ihaleleri, servis dışı-hurdaya ayırma, bakım ve onarım hizmetleri, aktarma ve ihale kararları dahil, çeşitli işler	10	
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	Toplantı saatinin belirlenmesi ve Çeşitli işler	1	
YOL ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Aktarmalar, Yetki verilmesi ve Çeşitli işler	4	
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Çeşitli işler	1	GENEL TOPLAM
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Ödenek Aaktarma, kavak ağaçları, okul lojman yıkımı ve çeşitli işler	3	

NOT:01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHİ İTİBARIYLA

## 2017 YILI KOMİSYON ÇALIŞMALARI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU	12	95
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU	24	
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU	13	
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU	8	
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU	10	GENEL TOPLAM
HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU	3	
GENÇLİK SPOR VE TURİZM KOMİSYONU	7	
ORMANI KORUMA VE KÖYLERE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU	10	
AR-GE(ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU	7	
ESNAF, SANAYİİ, TİCARET VE DOĞAL KAYNAKLAR KOMİSYONU	1	

NOT:01.01.2018-31.12.2018  
TARİHİ İTİBARIYLA



## İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

### 2018 yılında (Ocak-Aralık):

- Planlama çalışmaları kapsamında; 9 adet nazım imar planı ve 9 adet uygulama imar planı çalışmaları devam etmekte olup 4 adet nazım imar planı ve 5 adet uygulama imar planı çalışmaları tamamlanmıştır. Yine bu kapsamda 6 adet halihazır harita onaylanmıştır.

### Devam eden İmar Planı Çalışmaları:

- 1- Daday, Bayır Köyü, Turizm Amaçlı İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 2- Taşköprü, Obrucak Barajı ve HES (1/5000-1/1000)
- 3- Araç, İğdir Kur'an Kursu ve Camii Amaçlı İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 4- Merkez, Kırcalar TKDK Destekli "Otel ve Restoran" Amaçlı İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 5- Merkez, Şeyh Köyü Akaryakıt ve LPG İstasyonu Amaçlı İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 6- Merkez, Gölköy Genel İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 7- Bozkurt, Ortasökü Akaryakıt ve LPG İstasyonu Amaçlı İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 8- Tosya, Akbük Köyü, Geneline İlişkin Revizyon İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 9- Küre, Başören Köyü Regülatörü ve HES (1/5000-1/1000)

### Onaylanan İmar Planı Çalışmaları:

- 1- Araç, Yenice Akaryakıt ve LPG İstasyonu Amaçlı İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 2- Tosya, Ortalık S.S Koop. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (1/1000)
- 3- Araç, Başköy Regülatörü ve HES (1/5000-1/1000)
- 4- Tosya, Ortalık Akaryakıt ve LPG İstasyonu Amaçlı İmar Planı (1/5000-1/1000)
- 5- Devrekani Köprülü Kavşağı İmar Planı (1/5000-1/1000)

### Onaylanan Halihazır Harita Çalışmaları:

- 1- Gölköy Köyü İmar Planına Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita
- 2- Araç, Yenice Köyü, Yusufoglu Petrol, Plana Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita
- 3- Küre, Topçu-Beşören Köyü, Kaya HES, Plana Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita
- 4- Obrucak HES, Plana Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita
- 5- Tosya, Suluca Köyü, Köy Yerleşim Planına Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita
- 6- Şenpazar Saboğlu HES, Plana Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita

### Devam Eden Halihazır Harita Çalışmaları:

- 1- Küre, Uzunöz Köyü İmar Planına Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita
- 2- Tosya, Akbük Köyü İmar Planına Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita
- 3- Taşköprü, Obrucak HES, Plana Esas 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Halihazır Harita

- Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında 712 işlem yapılmıştır.

- 33 adet yapı ruhsatı ve 12 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- Köy yerleşik alan sınırları içerisinde 667 adet yapıya da yapı izni verilmiştir.

- Kurumlara verilen görüşler kapsamında 102 adet görüş talebi değerlendirilmiştir.

- Talebe bağlı işlemler kapsamında (ifraz, tevhid, irtifak hakkı vb.) toplam 257 adet dosya işlem görmüştür.

- Kaçak yapılaşmalarla mücadele çalışmaları kapsamında 235 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiş, 8 yapıya yıkım cezası verilmiş ve toplam 477.550,79TL para cezası kesilmiştir.

- Köy yerleşik alan sayısallaştırma çalışmaları kapsamında 49 köyün sayısallaştırma işlemi yapılmaktadır.

- 135 adet imar durum talebi değerlendirilmiş ve düzenlenmiştir.

- Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) çalışmaları kapsamında toplam 105 adet dosya işlem görmüştür.

- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı payına Dair Yönetmelik kapsamında; Daday İlçesi Bolatlar Köyü Ömür Bey Camii'nin restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.

FAALİYET ÖZETİ RAPORU		T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
YILI	: 2018			
DÖNEMİ	: OCAK-ARALIK			
<b>FAALİYETLER</b>	<b>Adet</b>			
<b>EVRAK SAYISI</b>	Gelen Evrak	Giden Evrak	Toplam	
	7267	4521	11788	
<b>SONUÇLANAN İMAR PLANI ÇALIŞMALARI</b>	Nazım İmar Planı/Değişikliği	Uygulama İmar Planı/Değişikliği	Mevzii İmar Planı/Değişikliği	
	4	5	-	
<b>SONUÇLANAN HALİHAZIR HARİTA ÇALIŞMALARI</b>	6			
<b>DEVAM EDEN İMAR PLANI ÇALIŞMALARI</b>	9	9		
<b>DEVAM EDEN HALİHAZIR HARİTA ÇALIŞMALARI</b>	3			
<b>RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI</b>	Yapı Ruhsatı	Yapı Kullanma İzni	Yapı İzni	Toplam
	33	12	667	712
<b>GÖRÜŞ TALEPLERİ</b>	Satış/Hisseli Satış/Tahsis		İrtifak Hakkı	Toplam
	99		3	102
<b>TALEBE BAĞLI İŞLEMLER</b>	Vaziyet Planı-Bağımsız Bölüm	Tevhid	İfraz	Toplam
	22	67	158	257
	Cins Değişikliği	İrtifak Hakkı		
	7	3		
<b>KAÇAK YAPILAŞMALARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI</b>	Yapı Tatil Zaptı	Yıkım Cezası	Para Cezası	
	235	8	477,550.79 TL	
<b>KÖY YERLEŞİK ALAN SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI</b>	49			
<b>İMAR DURUMU TALEBİ</b>	135			
<b>KUDEB ÇALIŞMALARI</b>	Basit Onarım Ön İzin Belgesi Verilen Yapı	8	Toplam	
	Onarım Uygunluk Belgesi Verilen Yapı Sayısı	3	105	
	Esaslı Onarım Gereği Tespit Edilen Yapı Sayısı	12		
	Koruma Kuruluna Bildirilen Mevzuata Aykırı	5		
	Yıkım Görüş Raporları	20		
	Grup Kararları	5		
	Yeni Yapılanma Görüş Raporları	5		
	İskân Görüş Raporları	3		
	Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı	1		
	Tescil Görüşü	9		
	Proje Onayı	15		
	İfraz/Tevhid/Yola Terk	2		
	İnceleme Raporları	17		



## TİP PROJELERDEN GÖRSELLER

### 160 m<sup>2</sup> İKİ KAT



### KÖY KONAĞI



### BESİ AHIRI



### SÜT AHIRI





## KUDEB Çalışmalarından Örnekler

KASTAMONU İLİ İNEBOLU İLÇESİ, AŞAĞIDATIŞPRAĞI MAHALLESİ,  
80 ADA 25 PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ TAŞINMAZA AİT  
20.11.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



KASTAMONU İLİ İNEBOLU İLÇESİ, AVARA MAHALLESİ,  
109 ADA 4 PARSELDE BULUNAN TESCİLSİZ TAŞINMAZA AİT  
13.10.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



KASTAMONU İLİ, ARAC İLÇESİ, YUKARI ARAC MAHALLESİ,  
106 ADA 4 PARSELDE BULUNAN TESCİLSİZ TAŞINMAZA AİT  
26.09.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



KASTAMONU İLİ, ARANA İLÇESİ, HACİVELİ MAHALLESİ,  
245 ADA 2 PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ TAŞINMAZA AİT  
06.09.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR





## KUDEB Çalışmalarından Örnekler

KASTAMONU İLİ, ARANA İLÇESİ, HACİVELİ MAHALLESİ  
245 ADA 2 PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ TAŞINMAZA AIT  
06.09.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



KASTAMONU İLİ, İNEBOLU İLÇESİ, AŞAĞIHAÇIPIBAĞI MAHALLESİ  
64 ADA 17 VE 19 PARSELLERDE BULUNAN TESCİLSİZ TAŞINMAZLARA AIT  
10.08.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



KASTAMONU İLİ, İNEBOLU İLÇESİ, BOYRAN MAHALLESİ  
108 ADA 71 PARSELDE BULUNAN TESCİLSİZ TAŞINMAZA AIT  
01.08.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



108 ADA 67 PARSELDEKİ  
TESCİLLİ TAŞINMAZ  
(282 ENVANTER)

108 ADA 69 PARSELDEKİ  
TESCİLLİ TAŞINMAZ  
(280 ENVANTER)




KASTAMONU İLİ, İNEBOLU İLÇESİ, KARADENİZ MAHALLESİ,  
147 ADA 2 PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ TAŞINMAZA AIT  
15.10.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR







## KUDEB Çalışmalarından Örnekler

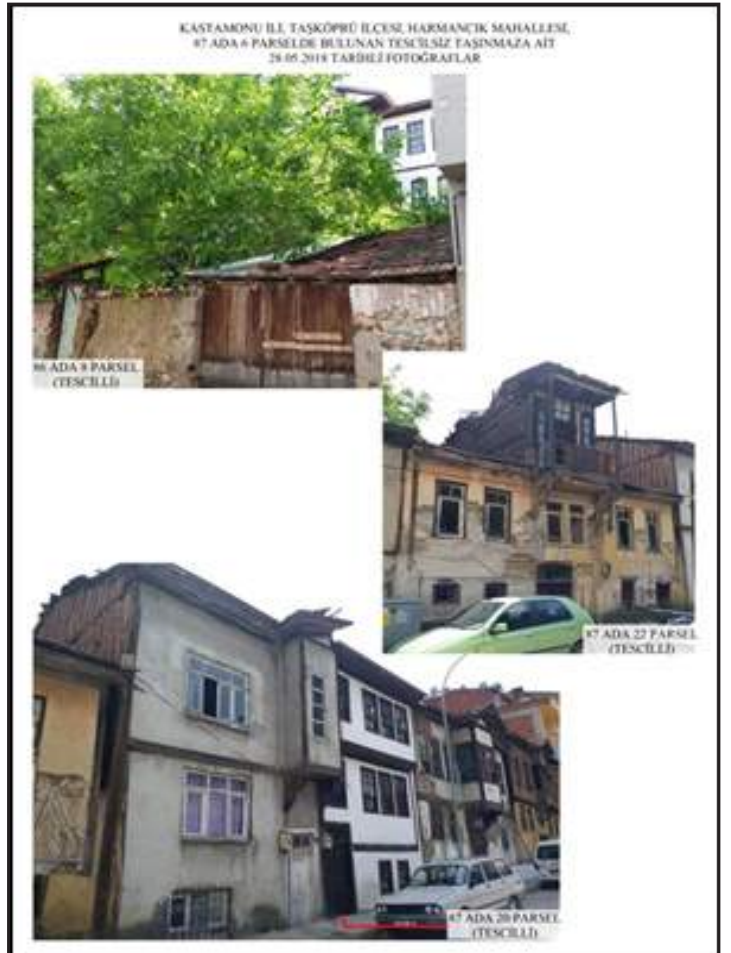



## KUDEB Çalışmalarından Örnekler

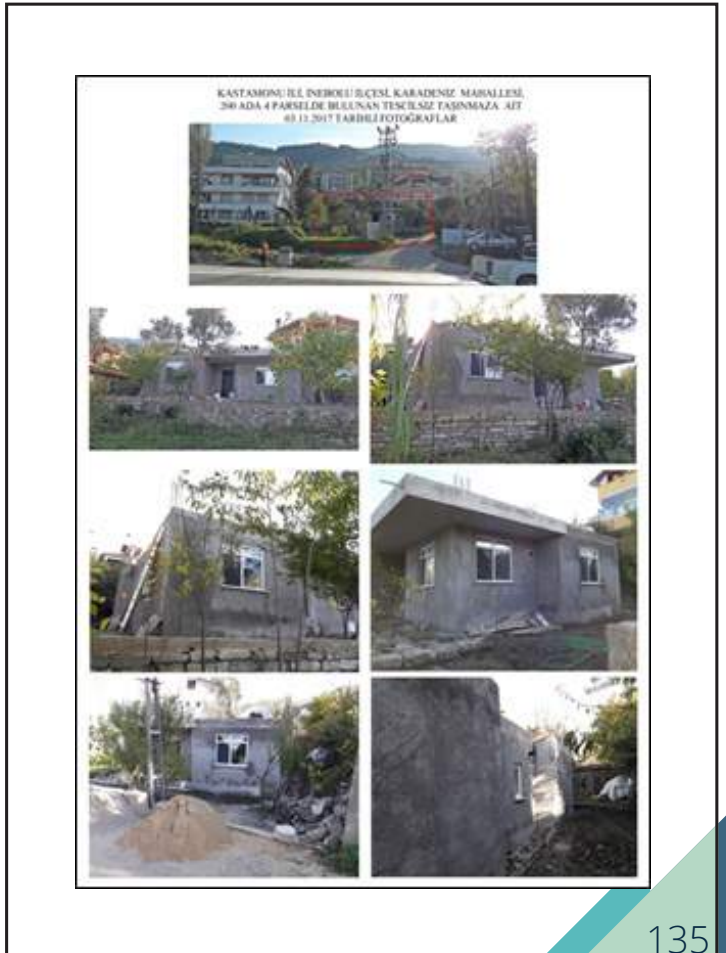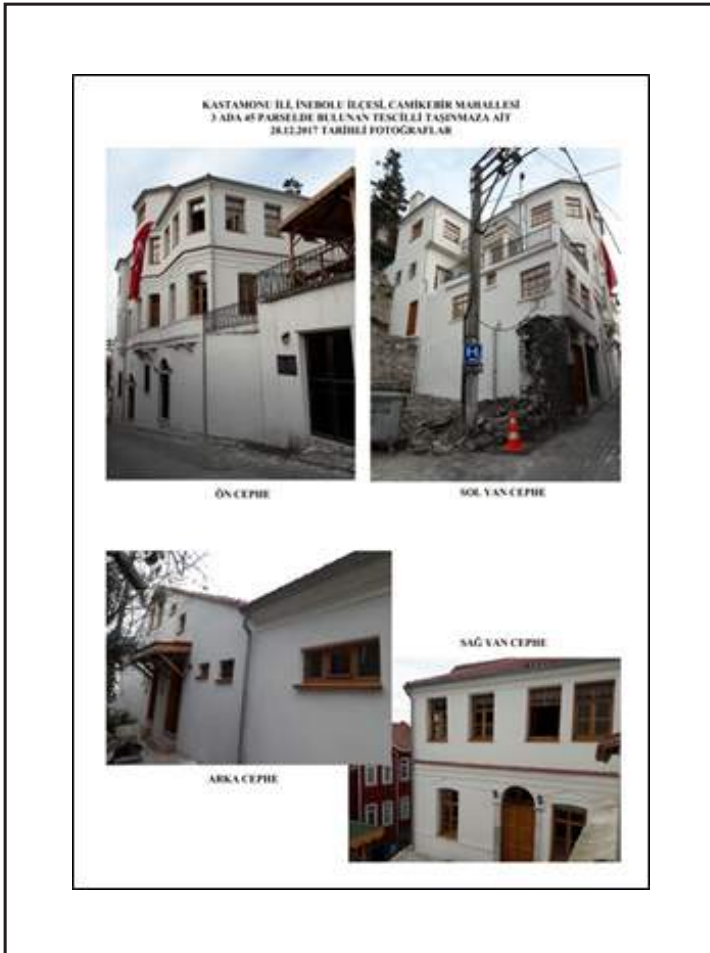

## KUDEB Çalışmalarından Örnekler

KASTAMONU İLİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, HARMANCIK MAHALLESİ  
87 ADA 25 PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ YAŞINMAZA  
VE  
87 ADA 25 PARSELDE BULUNAN TESCİLSİZ YAŞINMAZA  
AĞT 19.03.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



KASTAMONU İLİ, İNEBOLU İLÇESİ, CAMKEBİR MAHALLESİ  
47 ADA 6 PARSELDE YER ALAN TESCİLLİ YAŞINMAZA AĞT  
13.03.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



KASTAMONU İLİ, MERKEZ, TOPÇUOĞLU MAHALLESİ  
341 ADA 9 PARSELDE BULUNAN TESCİLSİZ YAŞINMAZA AĞT  
29.01.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR



ZEMİN KAT  
KUZAYDEKİ YERİK ODA, 1



KASTAMONU İLİ, MERKEZ, TOPÇUOĞLU MAHALLESİ  
341 ADA 9 PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ YAŞINMAZA AĞT  
29.01.2018 TARİHLİ FOTOĞRAFLAR








## KUDEB Çalışmalarından Örnekler









## Planlama Çalışmalarından Örnekler

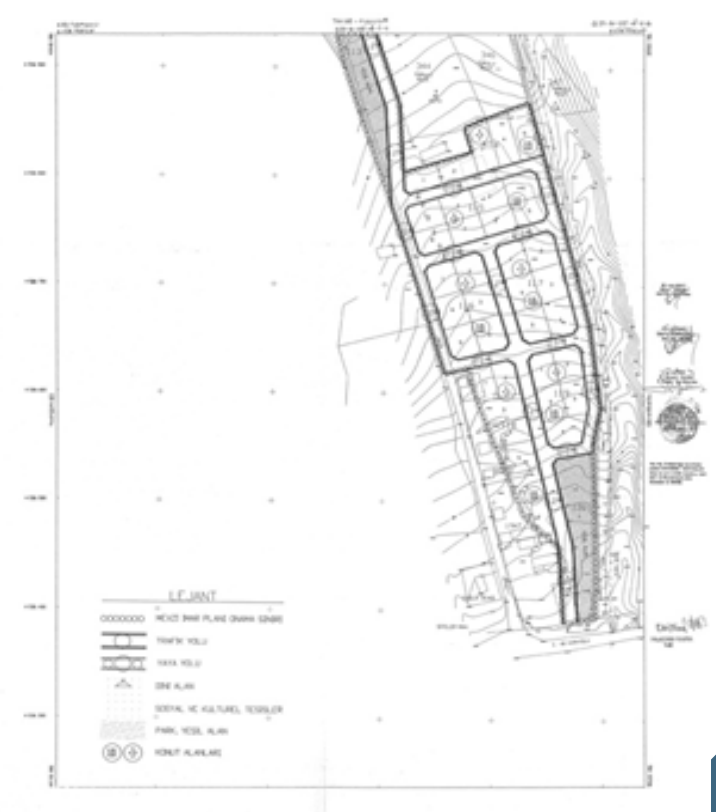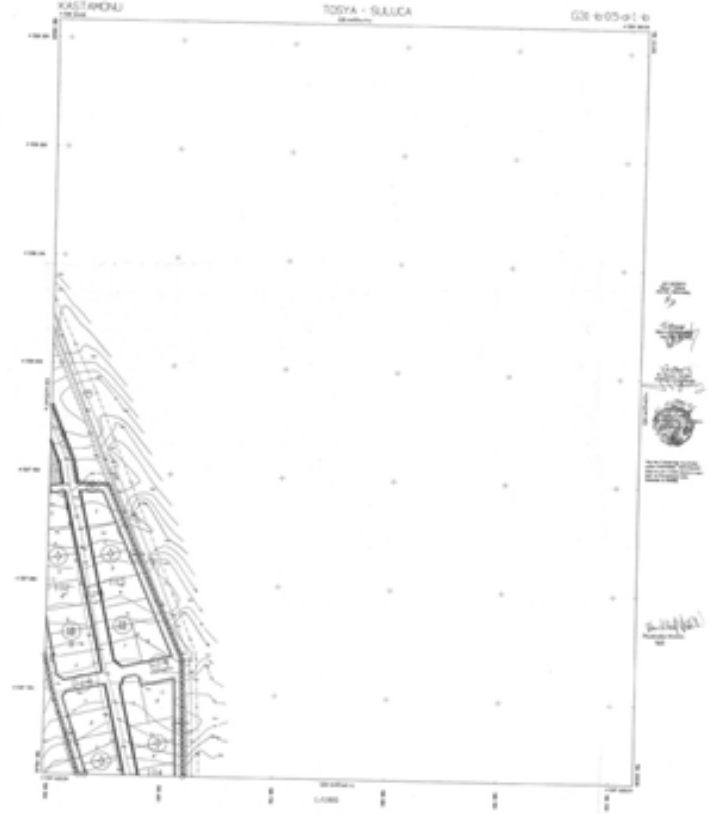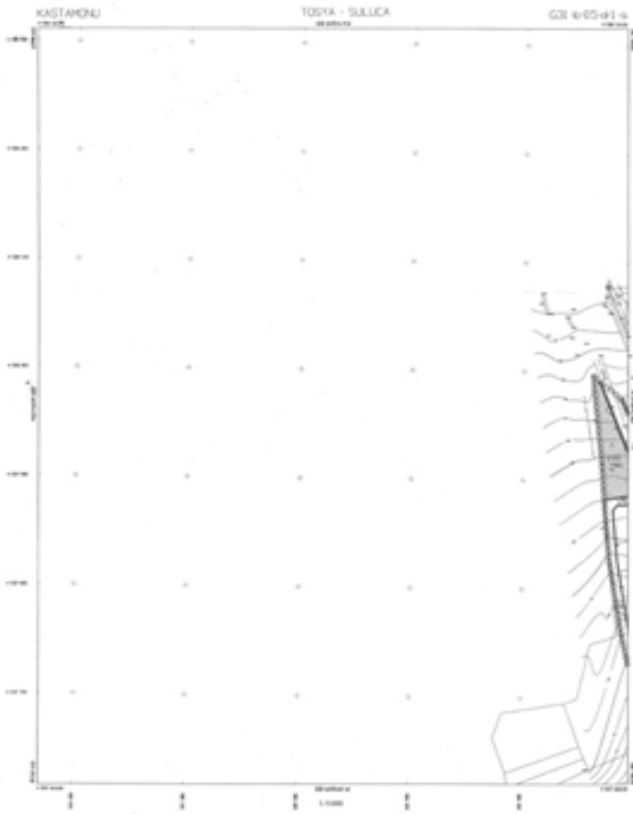

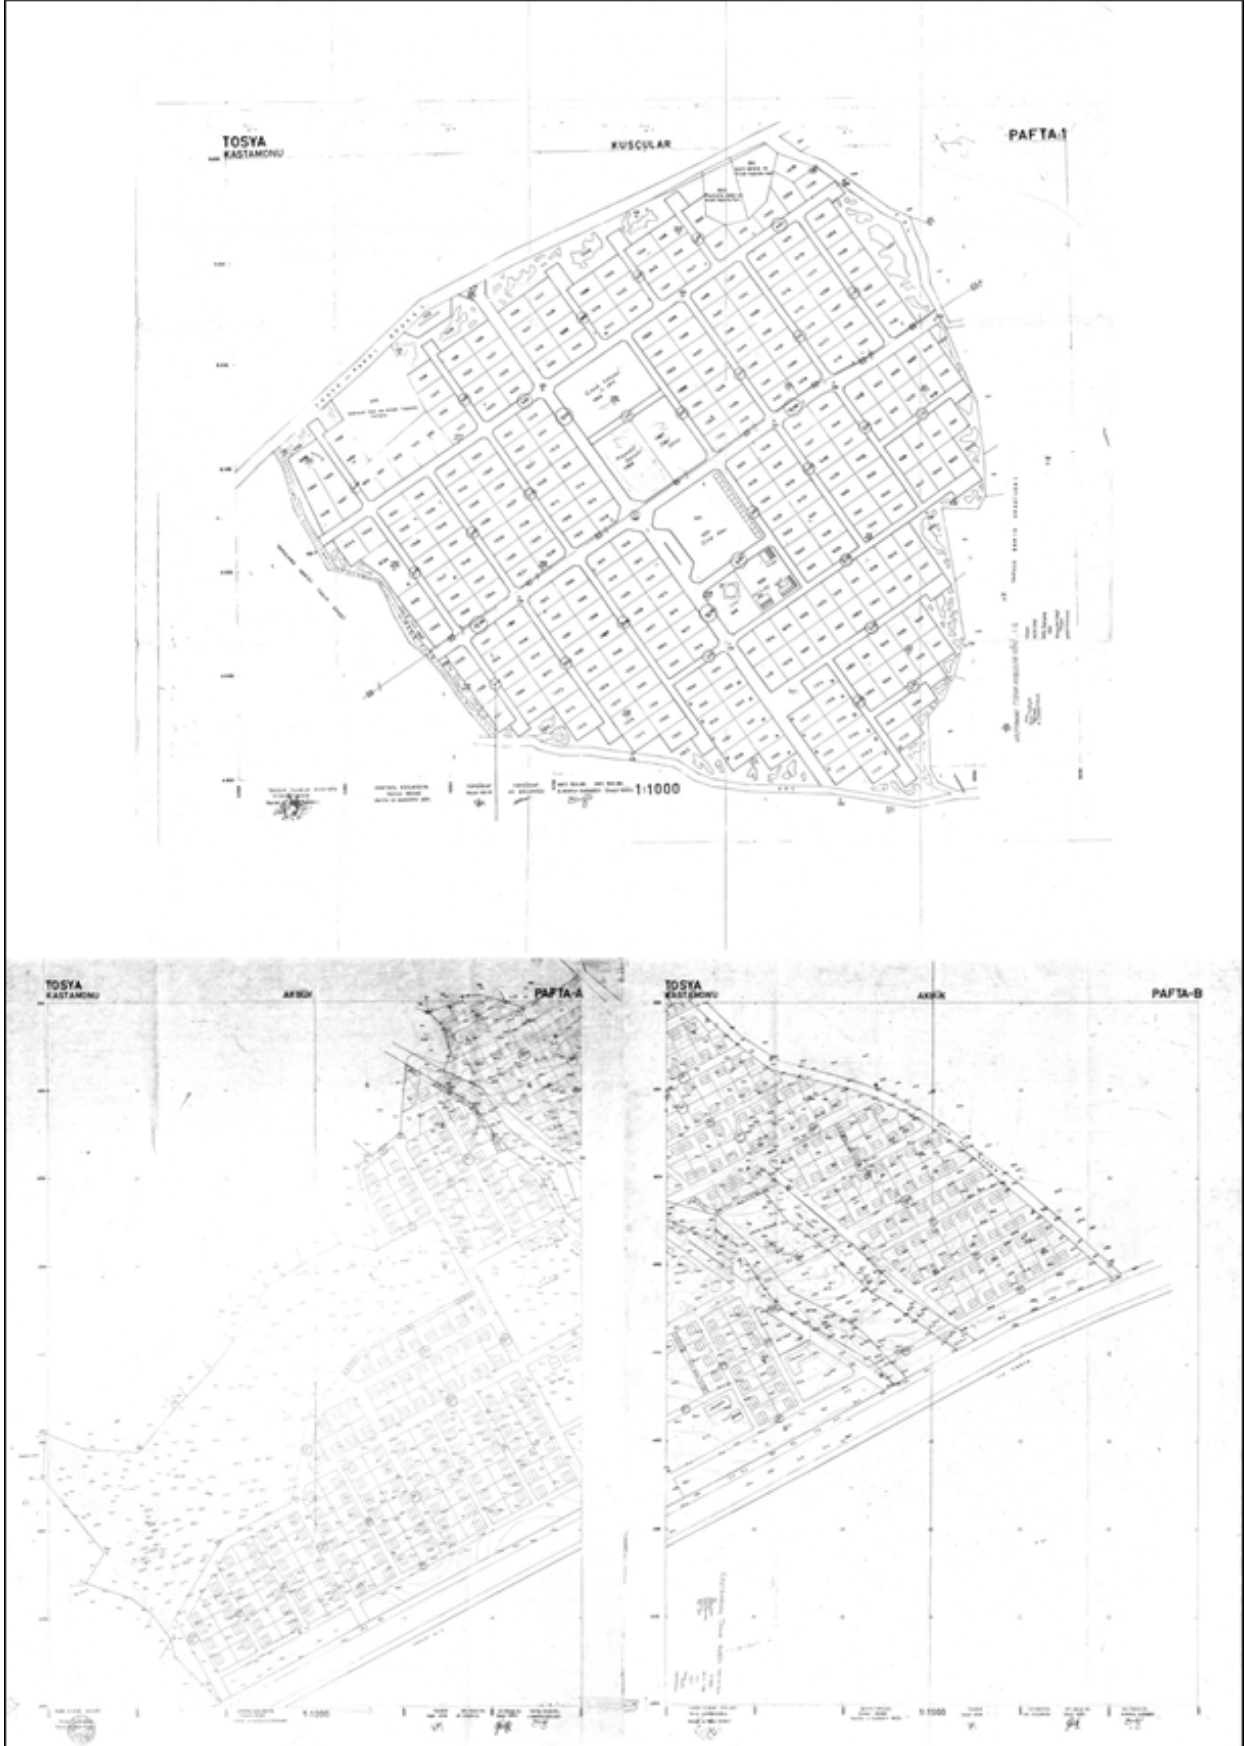



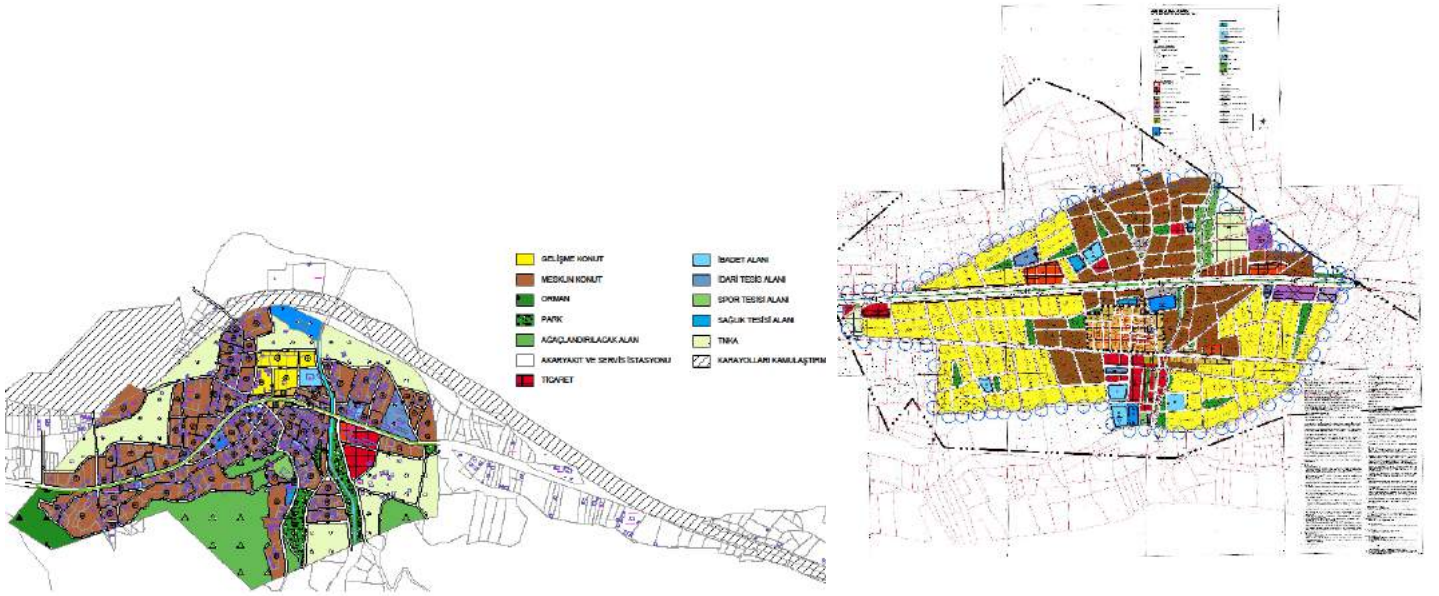

## Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü

İlimizde, Maden Kanununun 1(a) grubu madenler ile ilgili uygulama yönetmeliği çerçevesinde, halihazırda 7 adet özel sektöre ait Kum-çakıl ocağı ruhsatı, 58 adet kamu kurumlarına ait hammadde Üretim izni bulunmaktadır. Denetim Komisyonlarımızca yıl içerisinde özel teşebbüse ait maden sahalarına 1 kez, kamu kurumlarına ait hammadde üretim sahalarına 1 kez denetim yapılmaktadır.

### 2018 Yılı Şahıslara Ait 1 A Grubu Maden (Kum – Çakıl - Ariyet) Ocakları

S. No	Ocak Sahibi	Ocağın Bulunduğu			Ruhsat			
		İlçe	Köy - Mevkii	Cinsi	No	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Alanı (m2)
1	HANÖNÜ Bel. Bşk.	Hanönü	Bağdere	Kum	2013/13	22.08.2013	22.08.2018	12.000
2	Mehmet KUMAŞ	Taşköprü	Alamabatak	Kum	2014/10	20.03.2014	20.03.2019	10.000
3	HAKGÜL İnş. Ltd. Şti	Bozkurt	Bayramgazi	Kum	2017/02	26.04.2017	126.04.2022	13.941
4	Sarioğlu Ltd. Şti.	Cide	Gökçeler	Kum	2011/20	19.06.2017	19.06.2022	10.348,00
5	Makaracılar Ltd. Şti	Cide	Mencekli	Kum	2012/26	28.03.2017	28.03.2022	10.947,24
6	Suluca K. S. S. Koop.	Tosya	Suluca	Kum	2009/07	15.07.2014	15.07.2019	10.000,00
7	Hasan YAZGAÇ	Araç	Karacalar	Kum	2013 / 5	22.08.2012	22.08.2018	12.000,00

**Denetim:** 2018 yılı içerisinde özel teşebbüse ait güncel olan 7 adet ocak denetlenmiş, tamamının ÇED belgesi olduğu görülmüştür. Madencilik faaliyetleri gözlenen maden sahalarında Teknik nezaretçi ataması ve defterleri incelenmiştir. 1 adet kum ocağında henüz GSM izni ve faaliyetlerinin olmadığı tespit edilmiştir. Madencilik faaliyetleri gözlenen maden sahalarında, çay yatağı içerisinde kalan ve su debisi yüksek olan kesimlerde, köşe noktalarını gösteren kazıkların kısmen bulunduğu, İdaremizden alınan sevk fişlerini kullanıldığı görülmüştür. Çay yatağında su debisi fazla olduğunda malzeme alımı yapılmadığı, talveg kotu altına inme ya da ruhsat alanı dışından malzeme alma gibi durumlara rastlanmamıştır. Hanönü Belediye Başkanlığı ve Hasan YAZGAÇ uhdesinde bulunan 1(a) grubu maden işletme ruhsatlarının süresi bitmiş olup, süre uzatım talepleri ilgili Kamu kurumlarınca değerlendirilmektedir.

İlimiz genelinde bulunan ruhsat hukuku devam eden, iptal edilen ve terk edilerek pasa bildiren yaklaşık 64 adet mermer ocağında komisyonlarımızca inceleme yapılmış, iptal edilmiş ve terk edilmiş 36 adet mermer ocağında yapılan ayrıntılı incelemelerde artık mermer bloklarının değerlendirilebileceği, terk sahalarında rehabilite çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğümüzce yapıldığı, Hazine arazilerinde yer alanlarda ise rehabilite çalışmalarının İdaremizce başlatılması gerektiği tespit edilmiştir.

1(a) grubu Kum-çakıl ocakları ve diğer grup maden ocakları içerisinde Maden Kanununa muhalefet eden 6 kişiye toplam 84.676,67 TL para cezası uygulanmıştır.





5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3213 sayılı maden kanununun 7.maddesi gereğince 2018 yılı içerisinde 34 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Mevcut ruhsatlı işyerlerinin denetimleri yapılmış, tespit edilen eksiklikler ilgili işyerleri sahiplerine bildirilerek mevzuata uygunlukları sağlanmıştır. 2018 yılı içerisinde mevzuatlara uygun hareket etmeyen umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine toplam 8000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin "Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi" başvuruları hakkında 2018 yılı içerisinde herhangi bir başvuru yapılmamış olup, 02.10.2013 tarih 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve aynı tarih sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğdeki istenilen kriterler sağlanamadığından başvurusu onaylanmış talep bulunmamaktadır.

<b>KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
<b>VERİLEN RUHSATLAR İCMALİ</b>		
<b>(31.12.2018 Tarihi itibariyle)</b>		
<b>RUHSAT SINIFI</b>	<b>2018 - VERİLEN RUHSATLAR (ADET)</b>	
<b>GAYRİ SİHHİ MÜESSESE</b>	1. SINIF	1
	2. SINIF	25
	3. SINIF	2
<b>TOPLAM</b>		<b>28</b>
<b>SİHHİ MÜESSESE</b>	1. SINIF	-
	2. SINIF	4
	3. SINIF	-
<b>TOPLAM</b>		<b>4</b>
<b>UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ</b>	1. SINIF	-
	2. SINIF	-
	3. SINIF	2
<b>TOPLAM</b>		<b>2</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>34</b>

**Umuma açık işyeri açma ve çalışma ruhsat sahiplerine uygulanan idari Para cezaları**

S.NO	FİRMA ADI	ADRESİ	CEZA TARİHİ	KARAR SAYISI	MİKTARI (TL)
1.	Hasan UYAR	Şalgam Köyü/SEYDİLER	16.01.2018	33	4.000,00
2.	Ahmet ÇALIK	Kuzyaka Köyü/KASTAMONU	20.02.2018	85	2.000,00
3.	Orhan TOPAL	İğdir Köyü/ARAÇ	13.06.2018	309	2.000,00

## İL ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01 OCAK -31 ARALIK 2018 AYLARINA AİT BİR YILLIK FAALİYET RAPORU

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün (01 Ocak -31 Aralık 2018) aylarına ait bir yıllık faaliyetleri aşağıya çıkartılmıştır.

Kültür ve turizm amaçlı İlimize gelen misafirlerin İdaremize ait misafirhanemizde konaklamaları sağlanmıştır. İdaremize ait A Sosyal Tesislerimizde 200 kişilik yemekhane ve Protokol Salonu bulunmaktadır.

B Sosyal Tesislerinde 80 kişilik yemekhane, Lokal, Protokol Salonu ve 25 kişilik misafirhane bulunmaktadır. Misafirhanemizde (01 Ocak -31 Aralık 2018) aylarında bir yıl içerisinde toplam 1423 kişi misafir kalmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Makam odasında kullanılmak üzere 1 adet makam odası takımı (sehpa,dolap,masa) 1 adet makam koltuğu, 2 adet tekli misafir koltuğu, 1 adet 2 li koltuk alımı 4734 Sayılı İhale Kanununun 22/d Doğrudan Temin ile piyasaya araştırması yapılarak alınmış olup; ilgili firmaya Mamul Mal Alımları Giderleri olarak toplam 6.799,68 TL. Müdürlüğümüz bütçesinden ödeme yapılmıştır. İdaremiz nizamiyelerinde kullanılmak üzere 2 adet 2 li elbise dolabı, 15 adet çalışma-misafir koltuğu, 11 adet sandalye Devlet Malzeme Ofisinden alınmış olup; Mamul Mal Alımları Giderleri olarak toplam 8.173,23 TL. Müdürlüğümüz bütçesinden ödeme yapılmıştır. İdaremiz B Sosyal Tesislerinin doğalgaz ihtiyacının karşılanması için Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri olarak 13.000,00 TL Müdürlüğümüz bütçesinden Kargaz Doğalgaz Dağıtım San.ve Tic. ödemeye yapılmıştır.

Vali Konağı, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterlik Ek Bina çevre düzenlemesi işi için mal-malzeme ve işçilik bedeli olarak 4734 Sayılı İhale Kanununun 22/d Doğrudan Temin ile piyasaya araştırması yapılarak alınmış olup; ilgili firmaya Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Giderleri olarak 10.936,94 TL. Müdürlüğümüz bütçesinden ödeme yapılmıştır.

Hizmet Alımından görev yapan 20 Koruma ve Güvenlik personeli için ilgili firmaya (01 Ocak – 01 Nisan 2018) aylarında (Üç ay bir gün) için Hizmet Alımları Gideri olarak Toplam

294.577,22 TL Müdürlüğümüz bütçesinden ödeme yapılmıştır.

2018 yılında Müdürlüğümüz bütçesinden toplam 333.487,07 TL ödeme yapılmıştır.

İstanbul İlinde 25–28 Ocak 2018 tarihleri arasında“EMİTT” Fuarında, Ankara İlinde 24-25 Şubat tarihleri arasında Ankamal AVM Sergisi, Ankara İlinde 14-18 Mart 2018 tarihleri arasında “ Kastamonu Günleri” Fuarında, Bursa İlinde 10-15 Nisan 2018 tarihleri arasında “ Kastamonu Günleri” Fuarında, 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında Batı Karadeniz Tanıtım Fuarında, İstanbul İlinde18-21 Ekim 2018 tarihleri arasında “Kastamonu Günleri” Fuarında, Antalya İlinde 24-28 Ekim 2018 tarihleri arasında“9. Yöresel Ürünler “Fuarında, Ankara İlinde 25-26 Ekim 2018 tarihleri arasında “Türk Dünyası Kültür Başkenti Tanıtım” Fuarında, İzmir İlinde 04-10 Aralık 2018 tarihleri arasında“ Travel Turkey Turizm “Fuarında, Ankara İlinde13-22 Aralık 2018 tarihleri arasında “Hacıbayram Üniversitesi Kastamonu Kitre Bebek Sergisi”nde İlimizin tarihi, turistik folklorik değerlerinin tanıtılması amacıyla belirtilen tarihlerde ilgili fuarlara İdaremiz Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi personellerinden görevlendirilerek katılım sağlanmıştır.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimizde Şapka Müzesi, Cumhuriyet Evi Dantel Evi, Bebek Evi mevcut olup; Merkezimizi (01 Ocak -31 Aralık 2018) aylarında bir yıl içerisinde 92187 kişi turizm amaçlı ziyaret etmiştir.

İdaremize ait İdare Binaları, Atölyeler, Sosyal Tesisler, Botanik Park, Doğa Kültür Köyü, Çevreyolu Asfalt Plent Şantiyesi ve Seydiler İlçesi Asfalt Plent Şantiyesinin Koruma ve Güvenlikleri 2 Memur (bekçi) hizmet alımından karşılanan 20 Koruma ve Güvenlik personeli, 23 Bina ve Mal Bakıcısı olmak üzere toplam 45 personel tarafından sağlanmıştır.

İlimiz merkez İlçe ve 19 İlçe ye bağlı 48 köyde İdaremize ait 3 adet araç ve 9 personel ile Eysel Katı Atık Toplama iş ve işlemleri yapılmakta olup; toplanan atıklar katı atık bertaraf tesislerine boşaltılmıştır.





# IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## A- Üstünlükler

- İl yönetiminin (Vali) desteği
- Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu
- Karar alma ve icra yetkisi
- Bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisinin onaylaması
- Yeraltı zenginlikleri
- Sivil toplum örgütlerinin katılımcı oluşu
- Engellilere yönelik eğitim kurumlarının varlığı (görme, işitme, zihinsel, spastik)
- Taşımali eğitimin başarısı
- KÖYDES çalışmaları
- Yılın her mevsiminde turizm hizmet kapasitesinin varlığı
- Ürün çeşitliliği
- Toprak, su ve gıda analiz laboratuvar varlığı
- AB destekli fonlar
- Gerek duyulması halinde danışmanlık hizmeti satın alınabilmesi

## B- Zayıflıklar

- Bürokratik bir takım zorluklar
- Dağınık ve imarsız yerleşim
- Eğitim ve sağlıkta kalitenin düşüklüğü
- Kanalizasyon, evsel ve çevresel atıklar
- İlçeler ve merkez arası hizmet düzeyi farkı
- Ücret dengesizliği, aynı işi yapan kişilerin farklı maaş veya ücret alması
- Yeterli bir şekilde envanter çalışmasının yapılmamış olması
- Tarım arazileri envanteri eksikliği
- Turizm çeşitlerinin yeterince tanıtılmaması
- Hayvansal üretimin yeterince desteklenmemesi
- Orman içi köylüsünün gelir düzeyinin düşük oluşu
- Çevre bilincinin yetersiz oluşu
- Meslek içi eğitim yetersizliği
- İÖİ gelir kaynakların yetersiz oluşu
- Kurumlar arası koordinasyon zayıflığı

## C-Değerlendirme

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu İdaremizin mali faaliyetlerinin yasal dayanak noktasını oluşturmaktadır. 5018 sayılı kanunla kamu maliyesinde “Stratejik Yönetim Anlayışı” kurumlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bahse konu kanun kapsamındaki ikincil mevzuata göre hazırlanan faaliyet raporunda belirtilen kurumsal yapı ve bu yapı içerisinde yapılan faaliyetlerde üstünlüklerimizin bizi desteklediği,

zayıflıkların ise iş başarımında güçlükler meydana getirdiği düşünülmektedir.

Üstün ve zayıf yanlarımızın bilincinde olmak, özellikle zayıflıklara yönelik önlem almak ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

# V. ILGAZ DAĞI YURDUNTEPE

## MEKANİK TESİS

Kastamonu Ilgaz Dağı Yurduntepe Telesiyej Mekanik Tesisleri (Ilgaz 2) yapım işi ihalesi 15.02.2012 tarihinde Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılarak 23.07.2012 tarihinde 11.484.000,00 TL bedelli sözleşme imzalanmış ve 07.08.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Daha sonra teknik ve ekonomik sebepler nedeniyle yapılan iş artışı ile sözleşme bedeli 14.074.000,00 TL, iş bitiş tarihi ise 18.08.2014 olarak belirlenmiştir. İşin yapı denetim hizmetleri için oluşturulan heyette Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanları ile Kastamonu İl Özel İdaresi teknik personeli yer almıştır. İş, yüklenici sözleşme şartlarını yerine getirmediğinden Birlik Encümenininin 22.10.2015 tarihi ve 28 sayılı kararı ile fesih edilmiştir.

Gerçekleştirilen fesih işlemi sonrasında firma ile Merkez İlçe KHGB arasında karşılıklı olarak başlatılan mahkeme süreçleri 04.12.2017 tarihinde imzalanan "Sulh ve Mutabakat Protokolü" ile sona erdirilmiş ve iş bu protokol hükümlerine istinaden firma mekanik tesis bakım, onarım ve devreye alma çalışmalarını devam ettirmektedir.

Firmanın yükümlülüklerini yerine getirmesinin akabinde "Teknik Servis ve Bakım Sözleşmesi" imzalanacak ve fesih edilen sözleşmeden doğan son mevzuat hükümleri yerine getirilecektir.

## GÜNÜBİRLİK TESİS ve KAFETERYA BİNALARI

Fesih nedeniyle yapımına başlanmasına rağmen tamamlanamayan günübirlik tesis ve kafeterya binaları ile bunlara bağlı içme suyu, kanalizasyon tesisleri için ikmal ihalesine çıkılmış olup sözleşme imzalanmış, yer teslimi

yapılmıştır. Bu tesislerin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

## ULAŞIM YOLU

Ilgaz 1 olarak adlandırılan mevcut oteller bölgesi ile Ilgaz 2 olarak adlandırılan Yurduntepe telesiyej mekanik tesisleri arasındaki ulaşımı sağlayacak olan 6,00 km uzunluğundaki yol Kastamonu İl Özel İdaresi makine ve iş gücü ile 2013 yılında stabilize kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.

Ayrıca, 2013 yılında ihaleli olarak gerçekleştirilen 1. grup sanat yapılarının yanı sıra 2014 yılında ihale edilerek sözleşmeye bağlanan 2. grup sanat yapıları yapımı da tamamlanmıştır.

Söz konusu ulaşım yolunun nihai olarak tamamlanabilmesi için gerekli projeler tamamlanmış olup ödeneği kısmen Kültür ve Turizm Bakanlığınca İdaremize aktarılmıştır. 2018 yılında ihale edilen ve 2019 yılında tamamlanacak olan iş kapsamında yolun alt ve üst şevinde oluşan heyelanların kontrol altına alınması için gerekli geoduvar, taşduvar ve sanat yapıları süratle tamamlanarak heyelanlar temizlenmiştir. Kilit parke yol kaplamaları ve hendek kanallarının da 2019 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

## KAYAK PİSTİ

Pist düzenlemelerine Kastamonu İl Özel İdaresi makine parkı ile 2013 yılında başlanılmış, idaremiz makina parkı vasıtasıyla olup; nihai olarak yapılması gereken çalışmalar devam etmektedir.





Tesisin 2. etap üst istasyon kotu 2.328 m, 2. etap alt istasyon kotu 2.171 m, 1. etap üst istasyon kotu 2.187 m, 1. etap alt istasyon kotu 1.835 m'dir.

493 m kot farkına sahip olan pistin, yaklaşık 4,00 km'lik mesafesi kesintisiz olmak üzere toplam uzunluğu 6,00 km civarındadır.

### YAMAÇ GÜVENLİĞİ

Yine Merkez KHGB tarafından pistin yamaç güvenliği ve yönlendirme malzemeleri alımı ve montajı tamamlanmıştır.

#### 1- Birinci etap mekanik tesis (Detachable)

Uzunluk : 2.038,70 m.  
Sandalye tipi : 6 kişilik (Porsche Design)  
Taşıma kapasitesi : 1500 kişi/saat

#### 2- İkinci etap mekanik tesis (Fix Grip)

Uzunluk : 1.182,65 m.  
Sandalye tipi : 4 kişilik  
Taşıma kapasitesi : 500 kişi/saat

#### 3- Kar üstü pist hazırlama vasıtası (Snow Track)

#### 4- Kar motosikleti

#### 5- Biletleme ünitesi

#### 6- Jeneratör

7- Enerji nakil hattı yapımı  
(Dış hat - 6.200 m yer altı kablosu ile)

8- Enerji nakil hattı yapımı  
(İç hat - 2.200 m yer altı kablosu ile)

9- Günübirlik tesis (Toplam kapalı alanı 1.454 m<sup>2</sup>, toplam açık alanı 328 m<sup>2</sup>'dir.)

10- Günübirlik tesis çevre düzenlemesi  
(En az 7 adet otobüs ve 37 adet otomobil için 2000 m<sup>2</sup> genişliğinde otopark alanı ve çevre aydınlatma işleri gerçekleştirilecektir.)

#### 11- Günübirlik tesis içme suyu inşaatı

12- Günübirlik tesis kanalizasyon inşaatı  
(Biyolojik arıtmalı)

13- Kafeterya  
(Tek katlı olup; 290 m<sup>2</sup> kapalı, 120 m<sup>2</sup> açık alana sahiptir.)

#### 14- Kafeterya içme suyu inşaatı

#### 15- Kafeterya kanalizasyon inşaatı

**2018 yılı KÖYDES ödeneği  
73.176.260 TL** olup,  
program çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir.

## 2018 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

(31.12.2018 tarihi itibarıyla)

İŞİN KONUSU	PROJE SAYISI	BİTEN	DEVAM EDEN	İHALE AŞAMASI	BAŞLANMADI	İPTAL	ÖDENEK	NEMA GELİRİ	HARCAMA
KÖY YOLLARI	375	352	6	6	11	0	46.141.619,09	457.631,85	45.266.323,00
İÇME SULARI	217	205	7	0	5	0	13.764.059,99	263.956,51	13.528.160,37
<b>TOPLAM</b>	<b>592</b>	<b>557</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>59.905.679,08</b>	<b>721.588,36</b>	<b>58.794.483,37</b>
<b>YÖNETİM GİDERİ</b>							848.689,57	-	665.301,26
<b>ORTAK KULLANIM ÖDENEĞİ</b>							12.421.891,35	-	12.350.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>							<b>73.176.260,00</b>	<b>721.588,36</b>	<b>71.809.784,63</b>

## KÖY YOLLARI ÇALIŞMALARI

(31.12.2018 tarihi itibarıyla)

İŞİN CİNSİ	MİKTARI	2018 PROGRAM	2018 BİTEN	GERÇEKLEŞME %
BSK	(km)	52,54	42,04	80
BETON YOL	(km)	42,07	42,07	100
STABİLİZE (Filler)	(km)	154,99	142,99	92
STABİLİZE (Malzemeli Bakım)	(km)	633,50	611,50	96
STABİLİZE (Greyderli Bakım)	(km)	1.475,00	1.245,00	84
TRAFİK İŞARET LEVHALARI	(km)	9,30	9,30	100
YOL ONARIM	(km)	12,45	12,45	100
PARKE	(m <sup>2</sup> )	48.030	48.030	100
ASFALT YAMA	(ton)	9.590	6.820	70
İSTİNAT DUVARI	(m)	278	243	87
KORİGE BORU-BÜZ	(m)	3.462	3.462	100
TRAPEZ KANAL	(m)	250	250	100
MENFEZ	(adet)	45	38	84

## İÇME SULARI ÇALIŞMALARI

(31.12.2018 Tarihi İtibarıyla)

İŞLERİN CİNSİ	2018 PROGRAM	2018 BİTEN	GERÇEKLEŞME %
YENİ TESİS	1	1	100
TESİS GELİŞTİRME	9	8	90
BAKIM ONARIM	207	196	94





# İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI

## EKLER

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasalılık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Kastamonu - ....../.../2019

  
Yaşar KARADENİZ  
Vali

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
(Kastamonu - ...../.../2019)

  
Tahir Zafar KARAHASAN  
Genel Sekreter



**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
(Kastamonu - 07/02/2019)

  
Nida SİNSİ  
Genel Sekreter Yardımcısı

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
(Kastamonu - 07/02/2019)

  
Hâşim İbrahim SANIK  
Genel Sekreter Yardımcısı

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
(Kastamonu - ...../...../2019)

01.01.2018 - 27.08.2018 tarihleri  
arasında İnsan Kay. ve Eđit.  
Msd. olarak pöresi yaptım.

  
Osman YILDIZ  
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

(Kastamonu - .../.../2019)

31.08.2018 tarihinde görev  
başladım.

Yasemin KETHÜDA  
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

(Kastamonu - 25/02/2019)

01.01.2018 - 15.08.2018  
tarihleri arasında görevde bulundum.

Erdiç ÖZDEMİR  
Destek Hizmetleri Müdürü V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI<sup>1(6)</sup>

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.<sup>2(7)</sup>

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.<sup>3(8)</sup> (Yer-Tarih)

27.08.2018 tarihinde göreve başladım.

Osman YILDIZ  
Destek Hizmetleri Müdürü  
Ad-Soyad  
Unvan



**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
(Kastamonu 01/01/2018 – 15/08/2018)

  
M. Siman ULAŞAN  
İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.V.

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
(Kastamonu -07.02/2019)

15.08.2018 tarihinde göreve başladım.

  
Seda MORUZOĞLU  
İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.V:

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Kastamonu - 08./02/2019)

  
Ferhat CAN  
Encümen Müdürü

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI<sup>[6]</sup>**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.<sup>[7]</sup>

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.<sup>[8]</sup> (Yer-Tarih)

İmza  
Tuğrul Alp AKDEMİR  
Yol ve Ulaşım Hiz.Müd.V.

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
03.02.2019

İmza  
Yılmaz Erdal HEBİPOĞLU  
Ruhsat ve Denetim Müd. V.

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  
(Kastamonu - 07/02/2019)

İmza  
Tuncay SÖNMEZİŞİK  
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü



**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler ve harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Kastamonu-24.01.2019



Ogün YUCEBIYIK  
Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürü V.

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;


Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

(Kastamonu - 07/02/2019)



İbrahim SAĞLIK  
Plan ve Proje Müdürü

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;


Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

(Kastamonu - 07/02/2019)



Serkan MAZIOĞLU  
Yatırım ve İnşaat Müdürü

**MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;


Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Kastamonu 23.02/2019



Mehmet BEKAR  
Strateji Geliştirme Müdürü



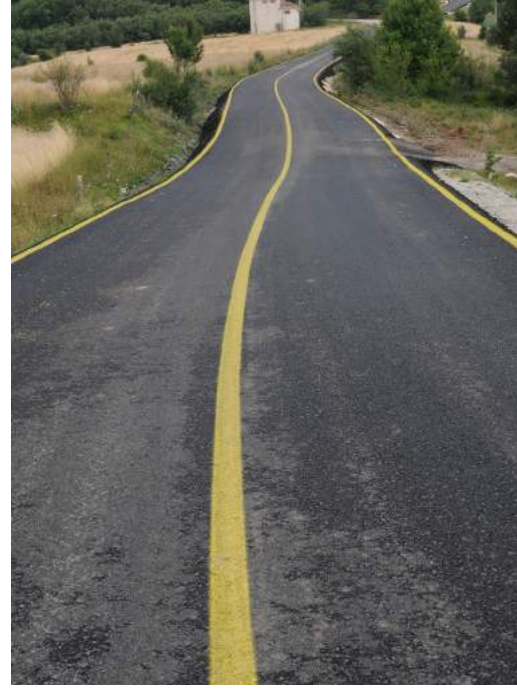

## İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ



# 2018 YILI FAALİYET RAPORU

